


Bauzeitenplan Skagenweg 9-23

1. Abschnitt 9-17 West + Giebel 9 Süd

			153,1	x
Gewerk	Firma	Beginn [Datum]	Dauer [Tage]	Ende

Sperrung Baustelleneinrichtung	Schneider	14.03.23	0,1	14.03.23
Baustelleneinrichtung	Schneider	17.03.23	0,5	17.03.23
Gerüstbau	May	20.03.23	5	24.03.23
Baustelleneinrichtung	Schneider	25.03.23	0,5	25.03.23
Fassade reinigen	Schneider	27.03.23	3	29.03.23
Rollladenschienen Demontage	Blunk	29.03.23		30.03.23
Fassade desinfizieren	Schneider	29.03.23	2	30.03.23
Abbruch Dämmung	Schumann/Vielwerk	29.03.23	4	03.04.23
Fensterbänke, 2. Dichtebene und FB neu	Schneider	29.03.23	16	21.04.23
Balkonböden vorarbeiten	Schumann/Vielwerk	31.03.23	9	14.04.23
Alte Fallrohre entfernen Notentwässerung	Repenning	31.03.23	5	06.04.23
Kernbohrungen + neue Einläufe einsetzen	Repenning	05.04.23	6	14.04.23
Betonsanierung Decken + Brüstungen	Schneider	31.03.23	12	19.04.23
Abdichtung hinter dem WDVS	Schneider	13.04.23	7	21.04.23
WDVS ergänzen, armieren, putzen	Schneider	20.04.23	12	05.05.23
Balkone Decken/Wände/Brüstungen streichen	Schneider	27.04.23	15	10.05.23
Boden Detail und Beschichtung	Schneider	03.05.23	15	19.05.23
Demontage Notentwässerung, Montage neue Fallrohre	Repenning	22.05.23	5	26.05.23
Fassade nach den Fensterbänken parallel zu den anderen Arbeiten	Schneider	01.05.23	20	26.05.23
Restarbeiten Brüstungen, Attika usw.	Schneider	22.05.23	9	02.06.23
Rollladenschienen Montage	Blunk	30.05.23	2	31.05.23
Gerüstbau	May	05.06.23	5	11.06.23

Mrz 23		Mrz 23		Mrz 23		Apr 23		Apr 23		Apr 23		Apr 23		Mai 23		Mai 23		Mai 23		Mai 23		Jun 23		Jun 23		
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09
13.03. - 19.03.23		20.03. - 26.03.23		27.03. - 02.04.23		03.04. - 09.04.23		10.04. - 16.04.23		17.04. - 23.04.23		24.04. - 30.04.23		01.05. - 07.05.23		08.05. - 14.05.23		15.05. - 21.05.23		22.05. - 28.05.23		29.05. - 04.06.23		05.06. - 11.06.23		
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		

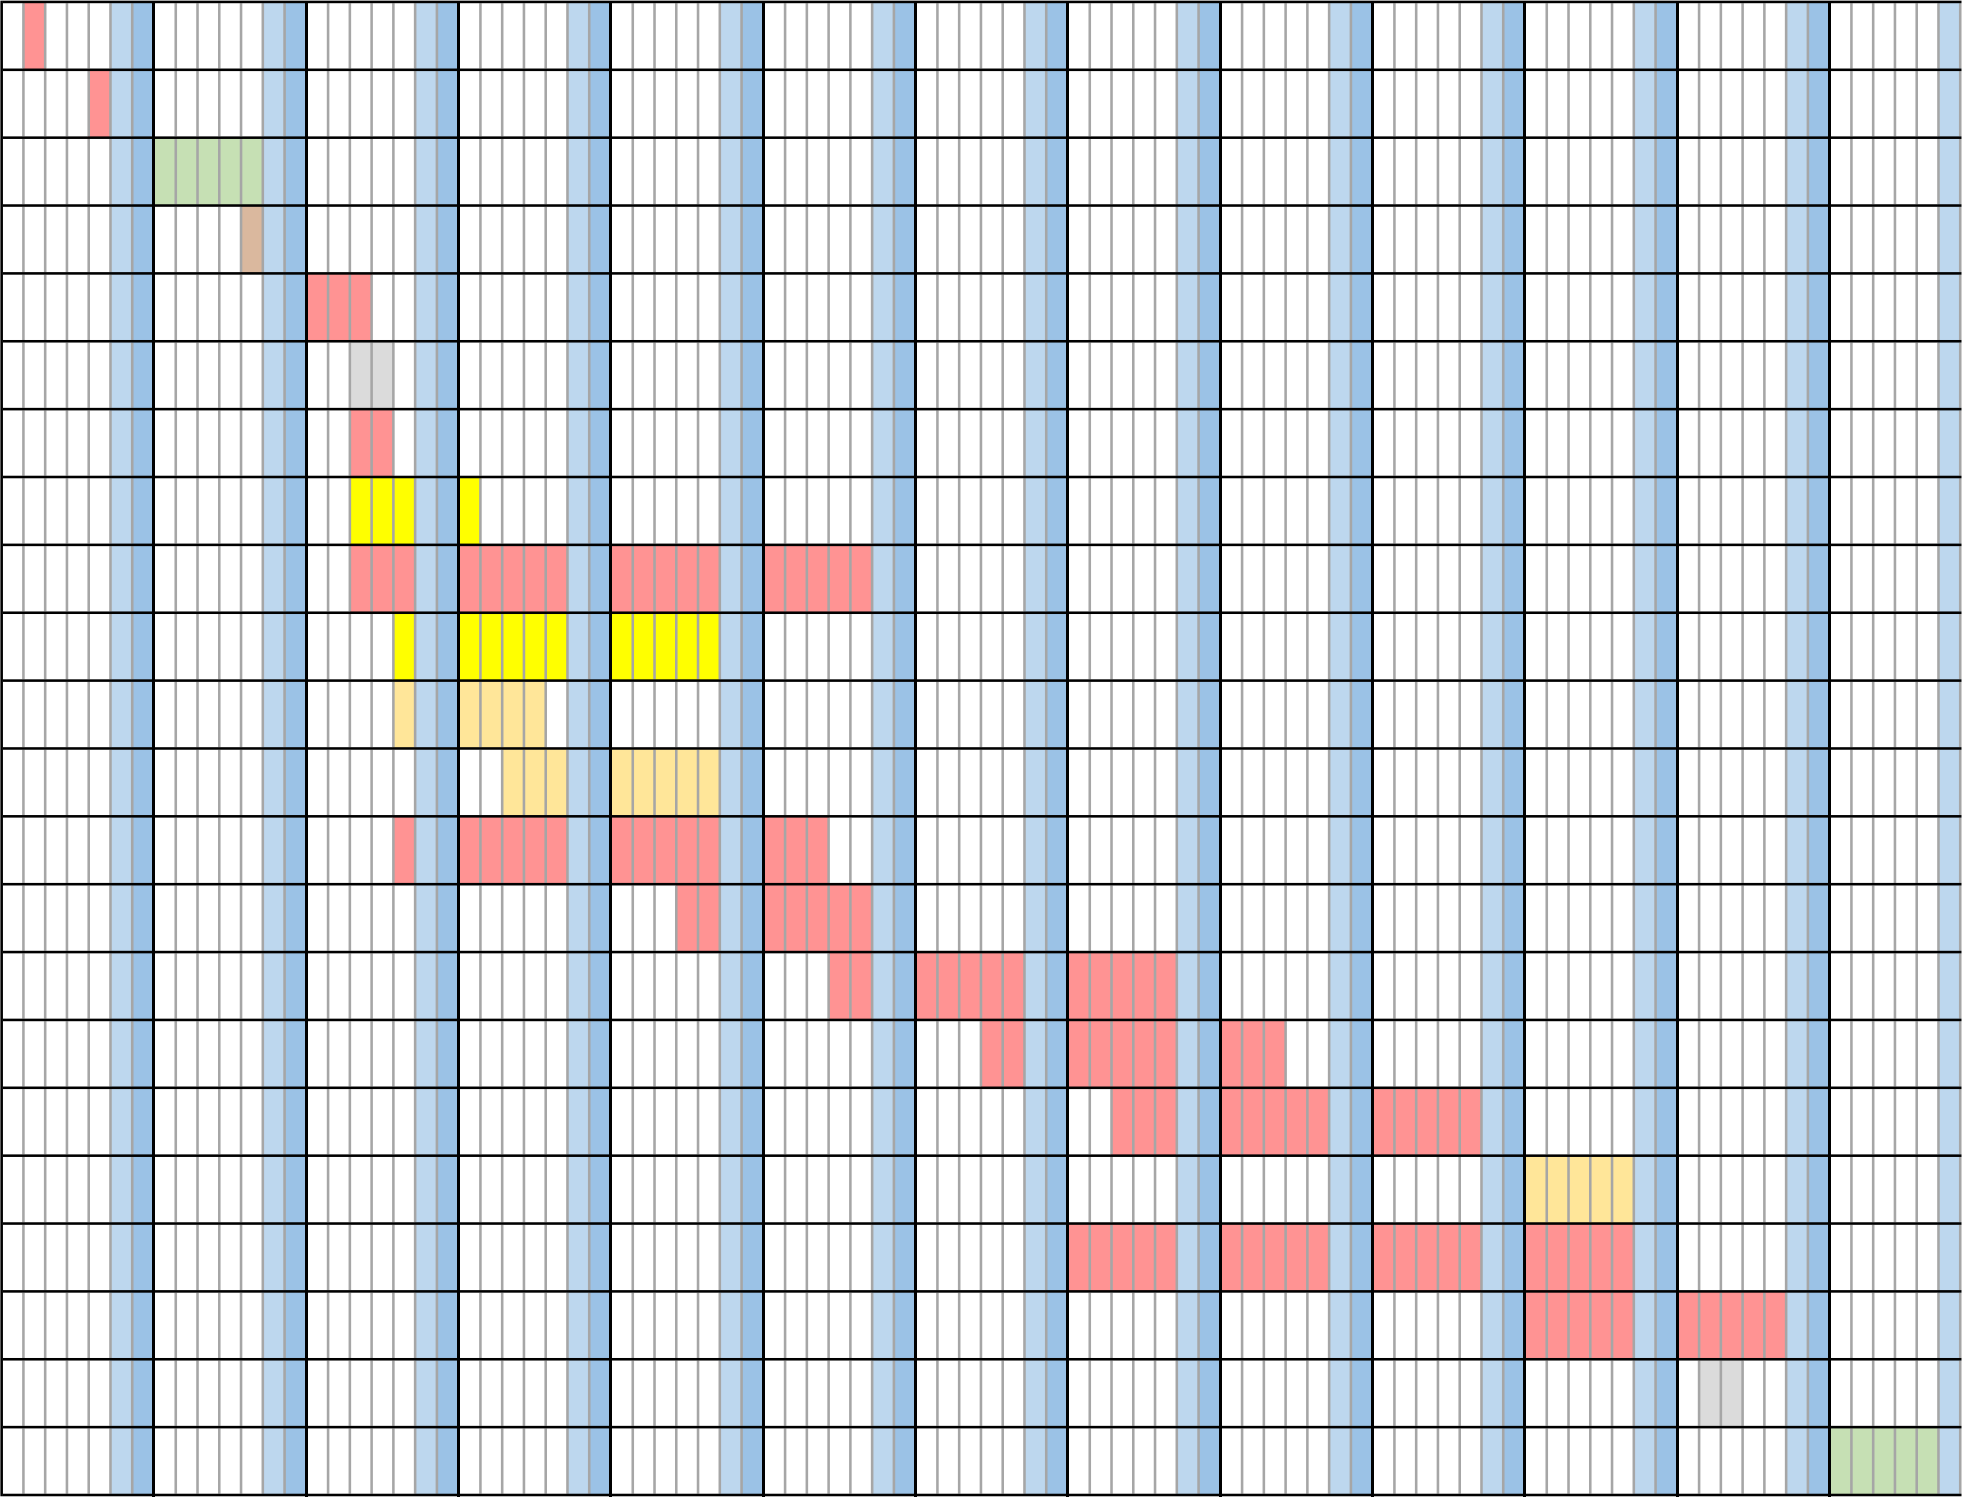

Bauzeitenplan Skagenweg 9-23

1. Abschnitt 9-17 West + Giebel 9 Süd

			153,1	x
Gewerk	Firma	Beginn [Datum]	Dauer [Tage]	Ende
Sperrung Baustelleneinrichtung	Schneider	14.03.23	0,1	14.03.23
Baustelleneinrichtung	Schneider	17.03.23	0,5	17.03.23
Gerüstbau	May	20.03.23	5	24.03.23
Baustelleneinrichtung	Schneider	25.03.23	0,5	25.03.23
Fassade reinigen	Schneider	27.03.23	3	29.03.23
Rollladenschienen Demontage	Blunk	29.03.23		30.03.23
Fassade desinfizieren	Schneider	29.03.23	2	30.03.23
Abbruch Dämmung	Schümann/Viel werk	29.03.23	4	03.04.23
Fensterbänke, 2. Dichtebene und FB neu	Schneider	29.03.23	16	21.04.23
Balkonböden vorarbeiten	Schümann/Viel werk	31.03.23	9	14.04.23
Alte Fallrohre entfernen Notentwässerung	Repenning	31.03.23	5	06.04.23
Kernbohrungen + neue Einläufe einsetzen	Repenning	05.04.23	6	14.04.23
Betonsanierung Decken + Brüstungen	Schneider	31.03.23	12	19.04.23
Abdichtung hinter dem WDVS	Schneider	13.04.23	7	21.04.23
WDVS ergänzen, armieren, putzen	Schneider	20.04.23	12	05.05.23
Balkone Decken/Wände/Brüstungen streichen	Schneider	27.04.23	15	10.05.23
Boden Detail und Beschichtung	Schneider	03.05.23	15	19.05.23
Demontage Notentwässerung, Montage neue Fallrohre	Repenning	22.05.23	5	26.05.23
Fassade nach den Fensterbänken parallel zu den anderen Arbeiten	Schneider	01.05.23	20	26.05.23
Restarbeiten Brüstungen, Attika usw.	Schneider	22.05.23	9	02.06.23
Rollladenschienen Montage	Blunk	30.05.23	2	31.05.23
Gerüstbau	May	05.06.23	5	11.06.23

11

So
