

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

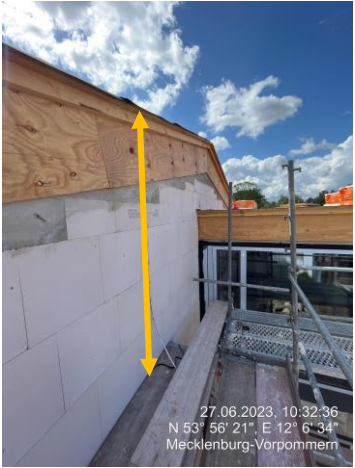
Safety and Health Coordination

Nach BaustellV, RAB 30


Baustellenbegehung / site inspection report

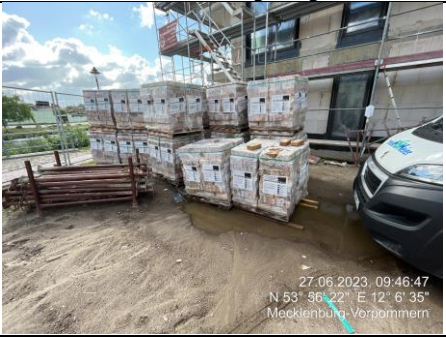
Auftraggeber:	Dr. Antje Rambow, Blücherstr. 21, 18055 Rostock	Auftragnehmer/Bauleitung:	IBUS Architekten, Herr Christian Blumenthal; M / +49 160 475 93 67
Projekt:	Neubau Ärztehaus Schwaan	Baustelle:	18258 Schwaan, August-Bebel- Straße 20
Ort:	Schwaan	Datum:	12.06.2023
Arbeitsstätte:	= Baustelle	SiGe-Koordinator:	Hauke Sievertsen Dipl.-Ing., SiGeKo Mobile: +49 (0)172 37 99 265
Teilnehmer:	Christian Blumenthal (Bauleitung, IBUS Architekten), Mitarbeiter Baubetrieb Maag Teterow, Hauke Sievertsen, Benjamin Bresemann (Geogroup, SiGeKo)		

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
Generell	Baustellenbegehung in Absprache mit BL im Rahmen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination auf Baustellen. Aktuell Arbeiten zur Fertigstellung des Rohbaus. verputzen, Elektro. Derzeit vier AN aktiv. Mitarbeiter vor Ort sehr aufgeschlossen und auskunftsbereit gegenüber Sicherheitskoordinator. Abschlussbesprechung hat stattgefunden mit Fokus auf Vorsicht vor den Baustellengefahren und Verweis auf die festgestellten Mängel. Die Abstellung der Mängel obliegt jedoch nur teilweise den eingesetzten Fachkräften vor Ort.		
Baustellenabsicherung	Baustelle ist gesichert durch Bauzaun mit Verklammerung. Zufahrt wird zur Arbeitszeit geöffnet.		

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
Pausen / Sanitäreinrichtungen	Bauwagen ist vor Ort und soll nach Aussage MA weiter dort zur Verfügung stehen. Mobile Toilette ist vor Ort.	 27.06.2023, 09:45:53 N 53° 56' 22", E 12° 6' 34" Mecklenburg-Vorpommern	ok
Baugerüst / Seitenschutz	Bei dem Gerüst ist aufgefallen das das Fangerüst nicht in ausreichender höhe Montiert wurde da dort die Maximale Absturzkante zum Gerüstbelag von 2m Überschritten wurde es liegt bei ca. 2,5m (gelber Pfeil siehe Foto)	Eine Nachbesserung ist erforderlich Empfehlung Einbau eines Fangnetzes in vorgeschriebener Höhe/ zwischenebene einarbeiten/ Anbringung eines Seitenschutzes Arbeiten an diesen Abschnitt bis zur Nachbesserung eingestellt ist vor Ort mit der Dachdeckerfirma besprochen wurden	AN nicht vor Ort Gerüstbau Firma
	 27.06.2023, 10:38:27 N 53° 56' 22", E 12° 6' 34" Mecklenburg-Vorpommern	 27.06.2023, 10:32:36 N 53° 56' 21", E 12° 6' 34" Mecklenburg-Vorpommern	

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
		Grubenklappen müssen verschlossen sein, um Abstürze zu verhindern. Oder gegen Hereinfallen gesichert sein Erneutes vorfinden der Offenen Grube	
	 27.06.2023, 10:21:05 N 53° 56' 22", E 12° 6' 35" Mecklenburg-Vorpommern	Teilweise große Lücken im Bereich Gerüst zur Hauswand	
	 27.06.2023, 09:51:32 N 53° 56' 22", E 12° 6' 34" Mecklenburg-Vorpommern	Nacharbeitung der Absturzsicherung im Handlauf schauen Schrauben ohne Funktion raus es besteht Verletzungsgefahr	
PSA der Beteiligten	PSA wird getragen.		ok

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
Arbeitsmittel	Die Putzmaschine vor Ort wurde überprüft und gekennzeichnet mit Prüfsiegel 01/2024. Silo keine Gültige Prüfung 06/21 Abgelaufen Stromkabel zeigt Verschleißerscheinungen	eine Leiter ist so verschlissen das sie Auszusortieren ist da sie mehrfach mechanische beschädigenden hat sie ist aktuell keinen der AN auf der Baustelle zuzuordnen.	
			
			
	Keine Elektropfung vorhanden an den genutzten E-Geräten! Keine Nachbesserung erfolgt!	Die Arbeitsmittel müssen regelmäßig durch sachkundige Person überprüft werden. Kennzeichnung durch Label am Arbeitsmittel ist sinnvoll, um den Nutzern die erfolgte Überprüfung zu signalisieren.	AN Bau, jeweiliger Eigentümer der Arbeitsmittel / sofort
			

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
			
Materiallagerung	Ordentliche und sichere Lagerung.		ok
			
Silo	Keine Fachgerecht Standfestigkeit (Abstützung) vorhanden keine Nachbesserung erfolgt!	Geeignete Bodendruckplatten verwenden	Nutzer / Lieferant des Baustromverteilers / ab sofort
			

Thema	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich/ Termin
Protokoll:	B.Bresemann, SiGeKo nach RAB 30 <i>Bresemann</i> Das Protokoll gilt als angenommen und akzeptiert, wenn Einwände nicht innerhalb 7 Tagen oder rechtzeitig vor Terminablauf schriftlich erhoben werden. Da nicht immer klar ist wem welche Geräte gehören bitte um Entsprechende Weiterleitung zur Abarbeitung der Mängel.		
