



| Nr. | Vorgangsname                                     | Dauer    | Anfang       | Ende         | Gantt-Diagramm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   | Ausschreibungen                                  | 20 Tage  | Don 02.03.23 | Don 30.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Vergaben                                         | 149 Tage | Mon 06.02.23 | Mon 11.09.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Angebotsphase Dacharbeiten                       | 20 Tage  | Mon 06.02.23 | Fre 03.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Angebotsprüfung Dacharbeiten                     | 5 Tage   | Mon 06.03.23 | Mon 13.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Beauftragung Dacharbeiten                        | 5 Tage   | Die 14.03.23 | Mon 20.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Angebotsphase Metallbau- und Schlosserarbeiten   | 20 Tage  | Fre 10.02.23 | Mon 13.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | Angebotsprüfung Metallbau- und Schlosserarbeiten | 5 Tage   | Mon 13.03.23 | Mon 20.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Beauftragung Metallbau- und Schlosserarbeiten    | 5 Tage   | Mon 20.03.23 | Fre 24.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | Angebotsphase Fassadenarbeiten                   | 20 Tage  | Don 16.03.23 | Fre 14.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | Angebotsprüfung Fassadenarbeiten                 | 5 Tage   | Mon 17.04.23 | Fre 21.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | Beauftragung Fassadenarbeiten                    | 5 Tage   | Die 25.04.23 | Die 02.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | Angebotsphase Garagentor                         | 20 Tage  | Mit 01.03.23 | Don 30.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | Angebotsprüfung Garagentor                       | 5 Tage   | Don 30.03.23 | Don 06.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  | Beauftragung Garagentor                          | 5 Tage   | Don 06.04.23 | Fre 14.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | Angebotsphase Vordach                            | 20 Tage  | Don 13.04.23 | Fre 12.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19  | Angebotsprüfung Vordach                          | 5 Tage   | Fre 12.05.23 | Mon 22.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | Beauftragung Vordach                             | 20 Tage  | Fre 19.05.23 | Fre 16.06.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  | Angebotsphase Haus- & Praxiseingangstür          | 20 Tage  | Don 13.04.23 | Fre 12.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | Angebotsprüfung Haus- & Praxiseingangstür        | 5 Tage   | Fre 12.05.23 | Mon 22.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23  | Beauftragung Haus- & Praxiseingangstür           | 5 Tage   | Mon 22.05.23 | Fre 26.05.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24  | Angebotsphase Innenputzarbeiten                  | 20 Tage  | Mit 01.03.23 | Don 30.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25  | Angebotsprüfung Innenputzarbeiten                | 5 Tage   | Don 30.03.23 | Don 06.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  | Beauftragung Innenputzarbeiten                   | 5 Tage   | Don 06.04.23 | Fre 14.04.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | Angebotsphase Trockenbauarbeiten                 | 20 Tage  | Fre 17.02.23 | Mon 20.03.23 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seite 1



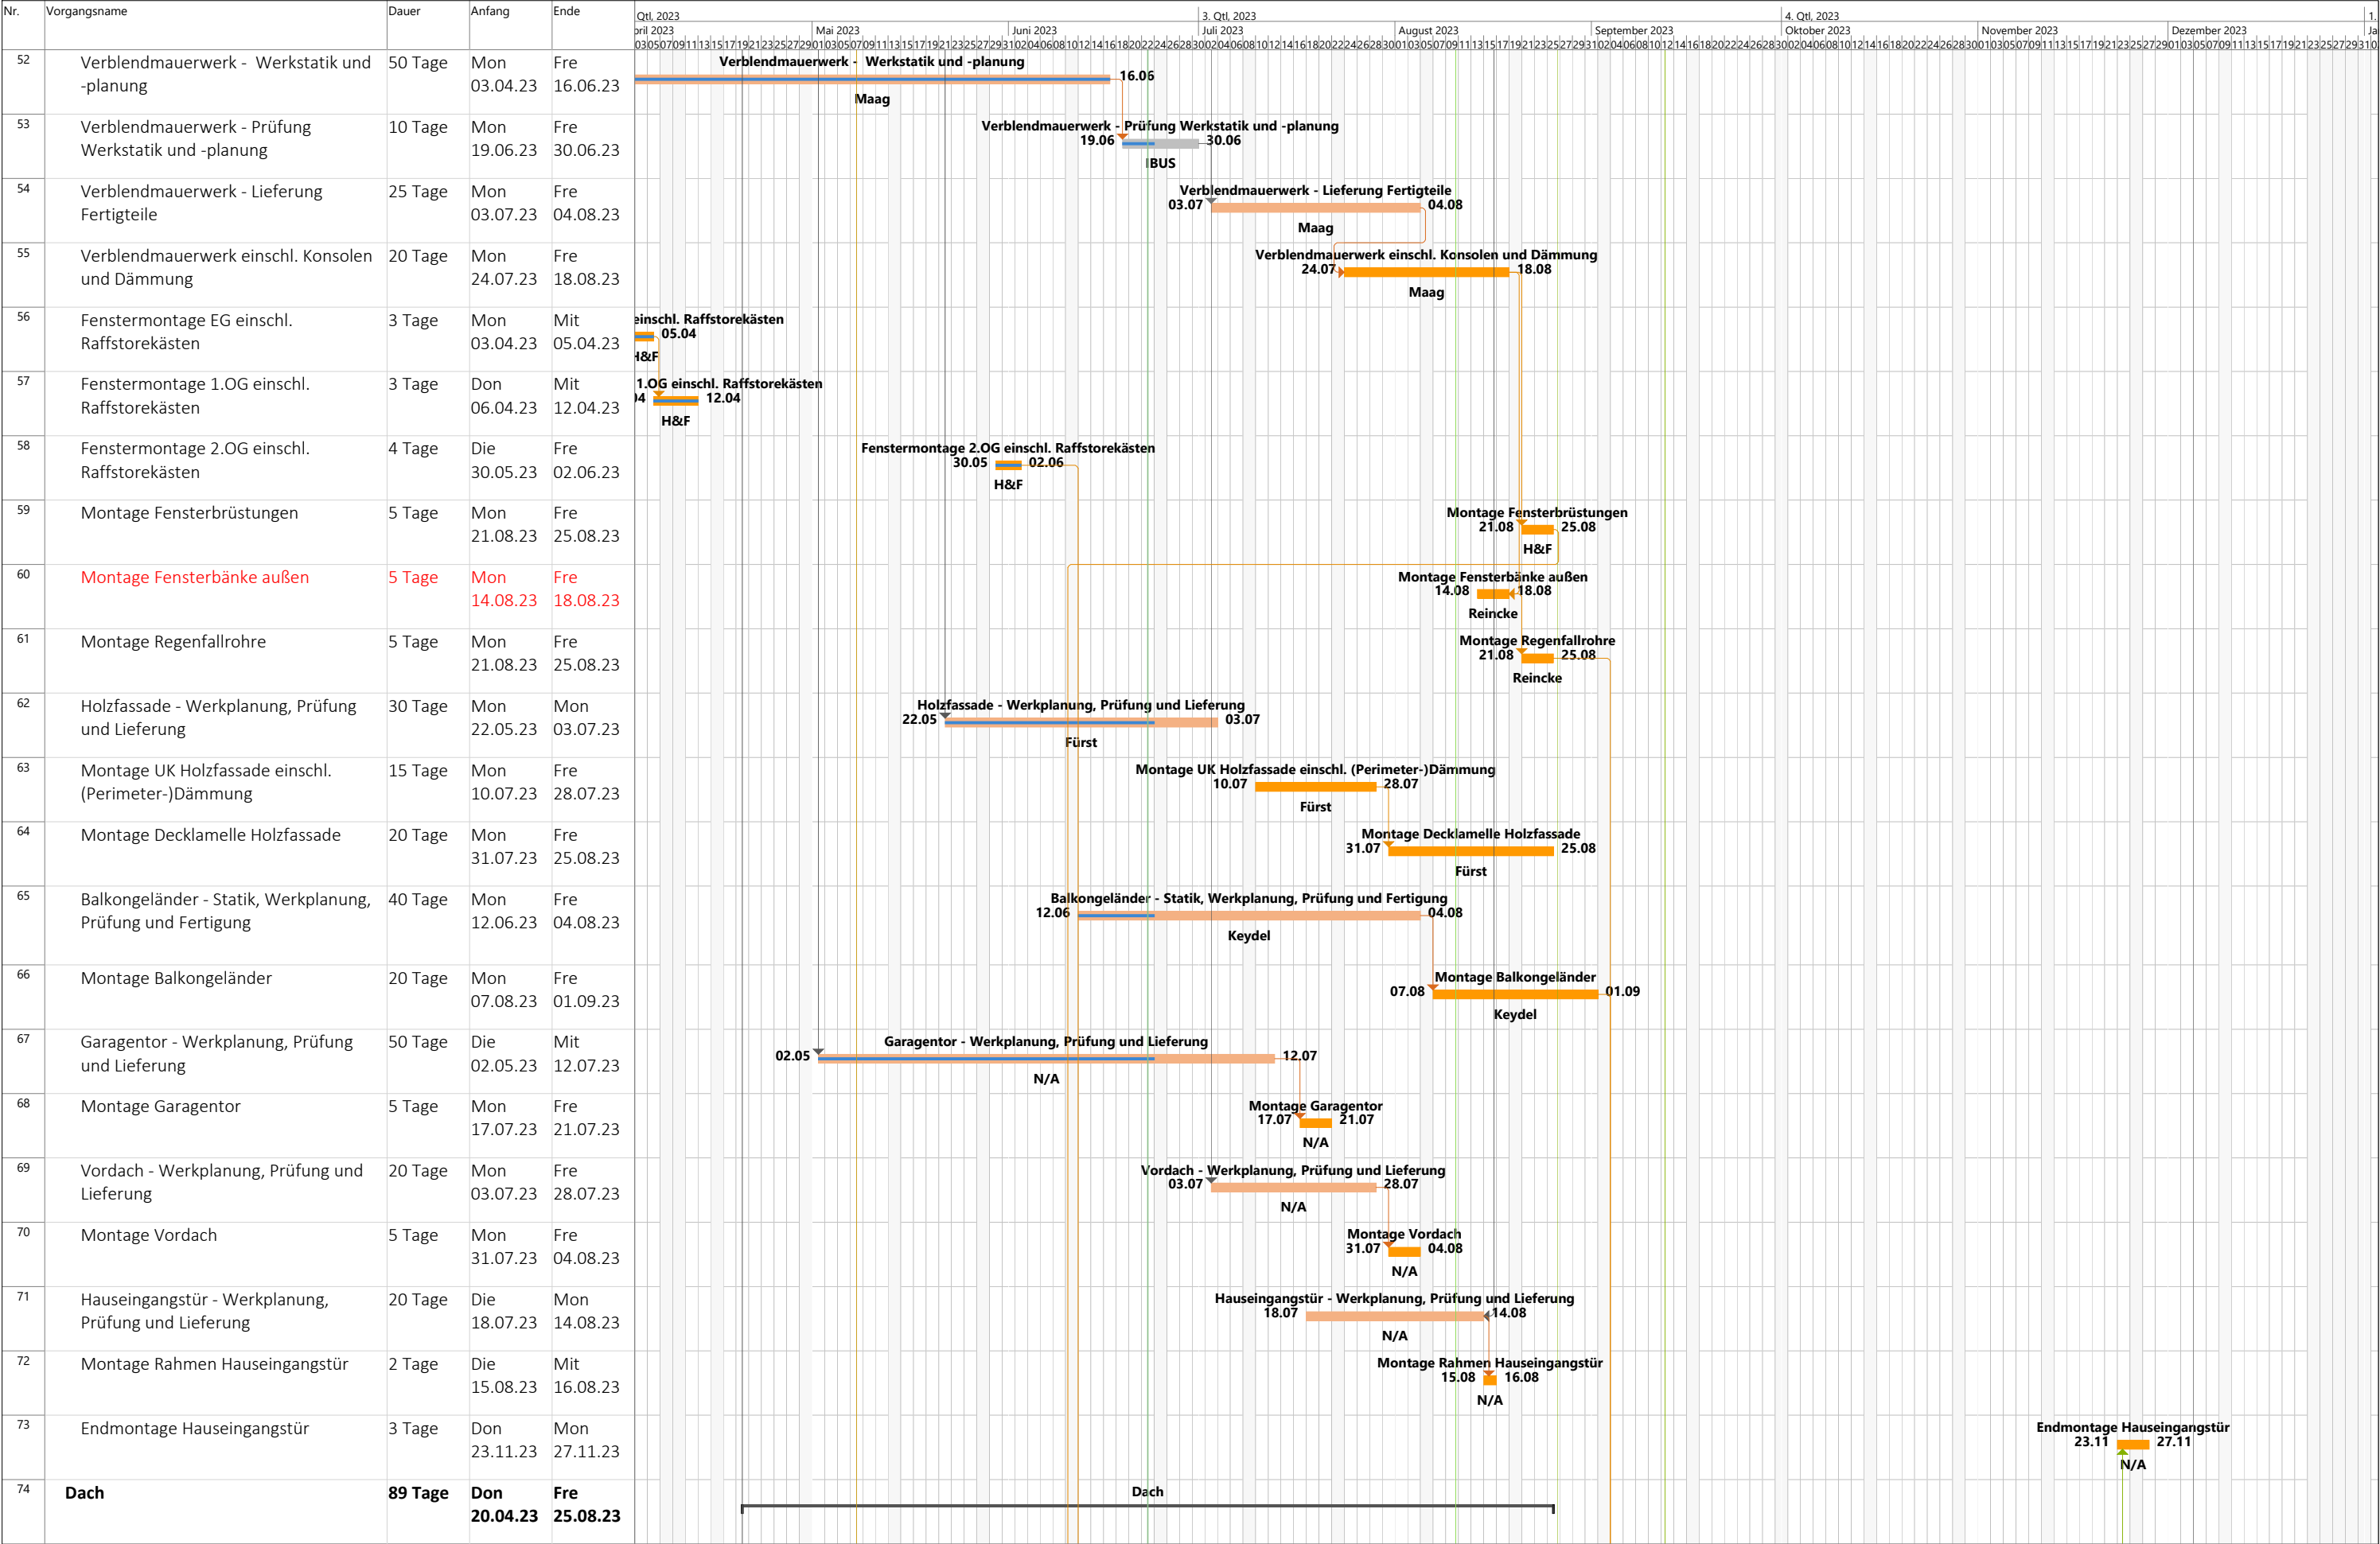

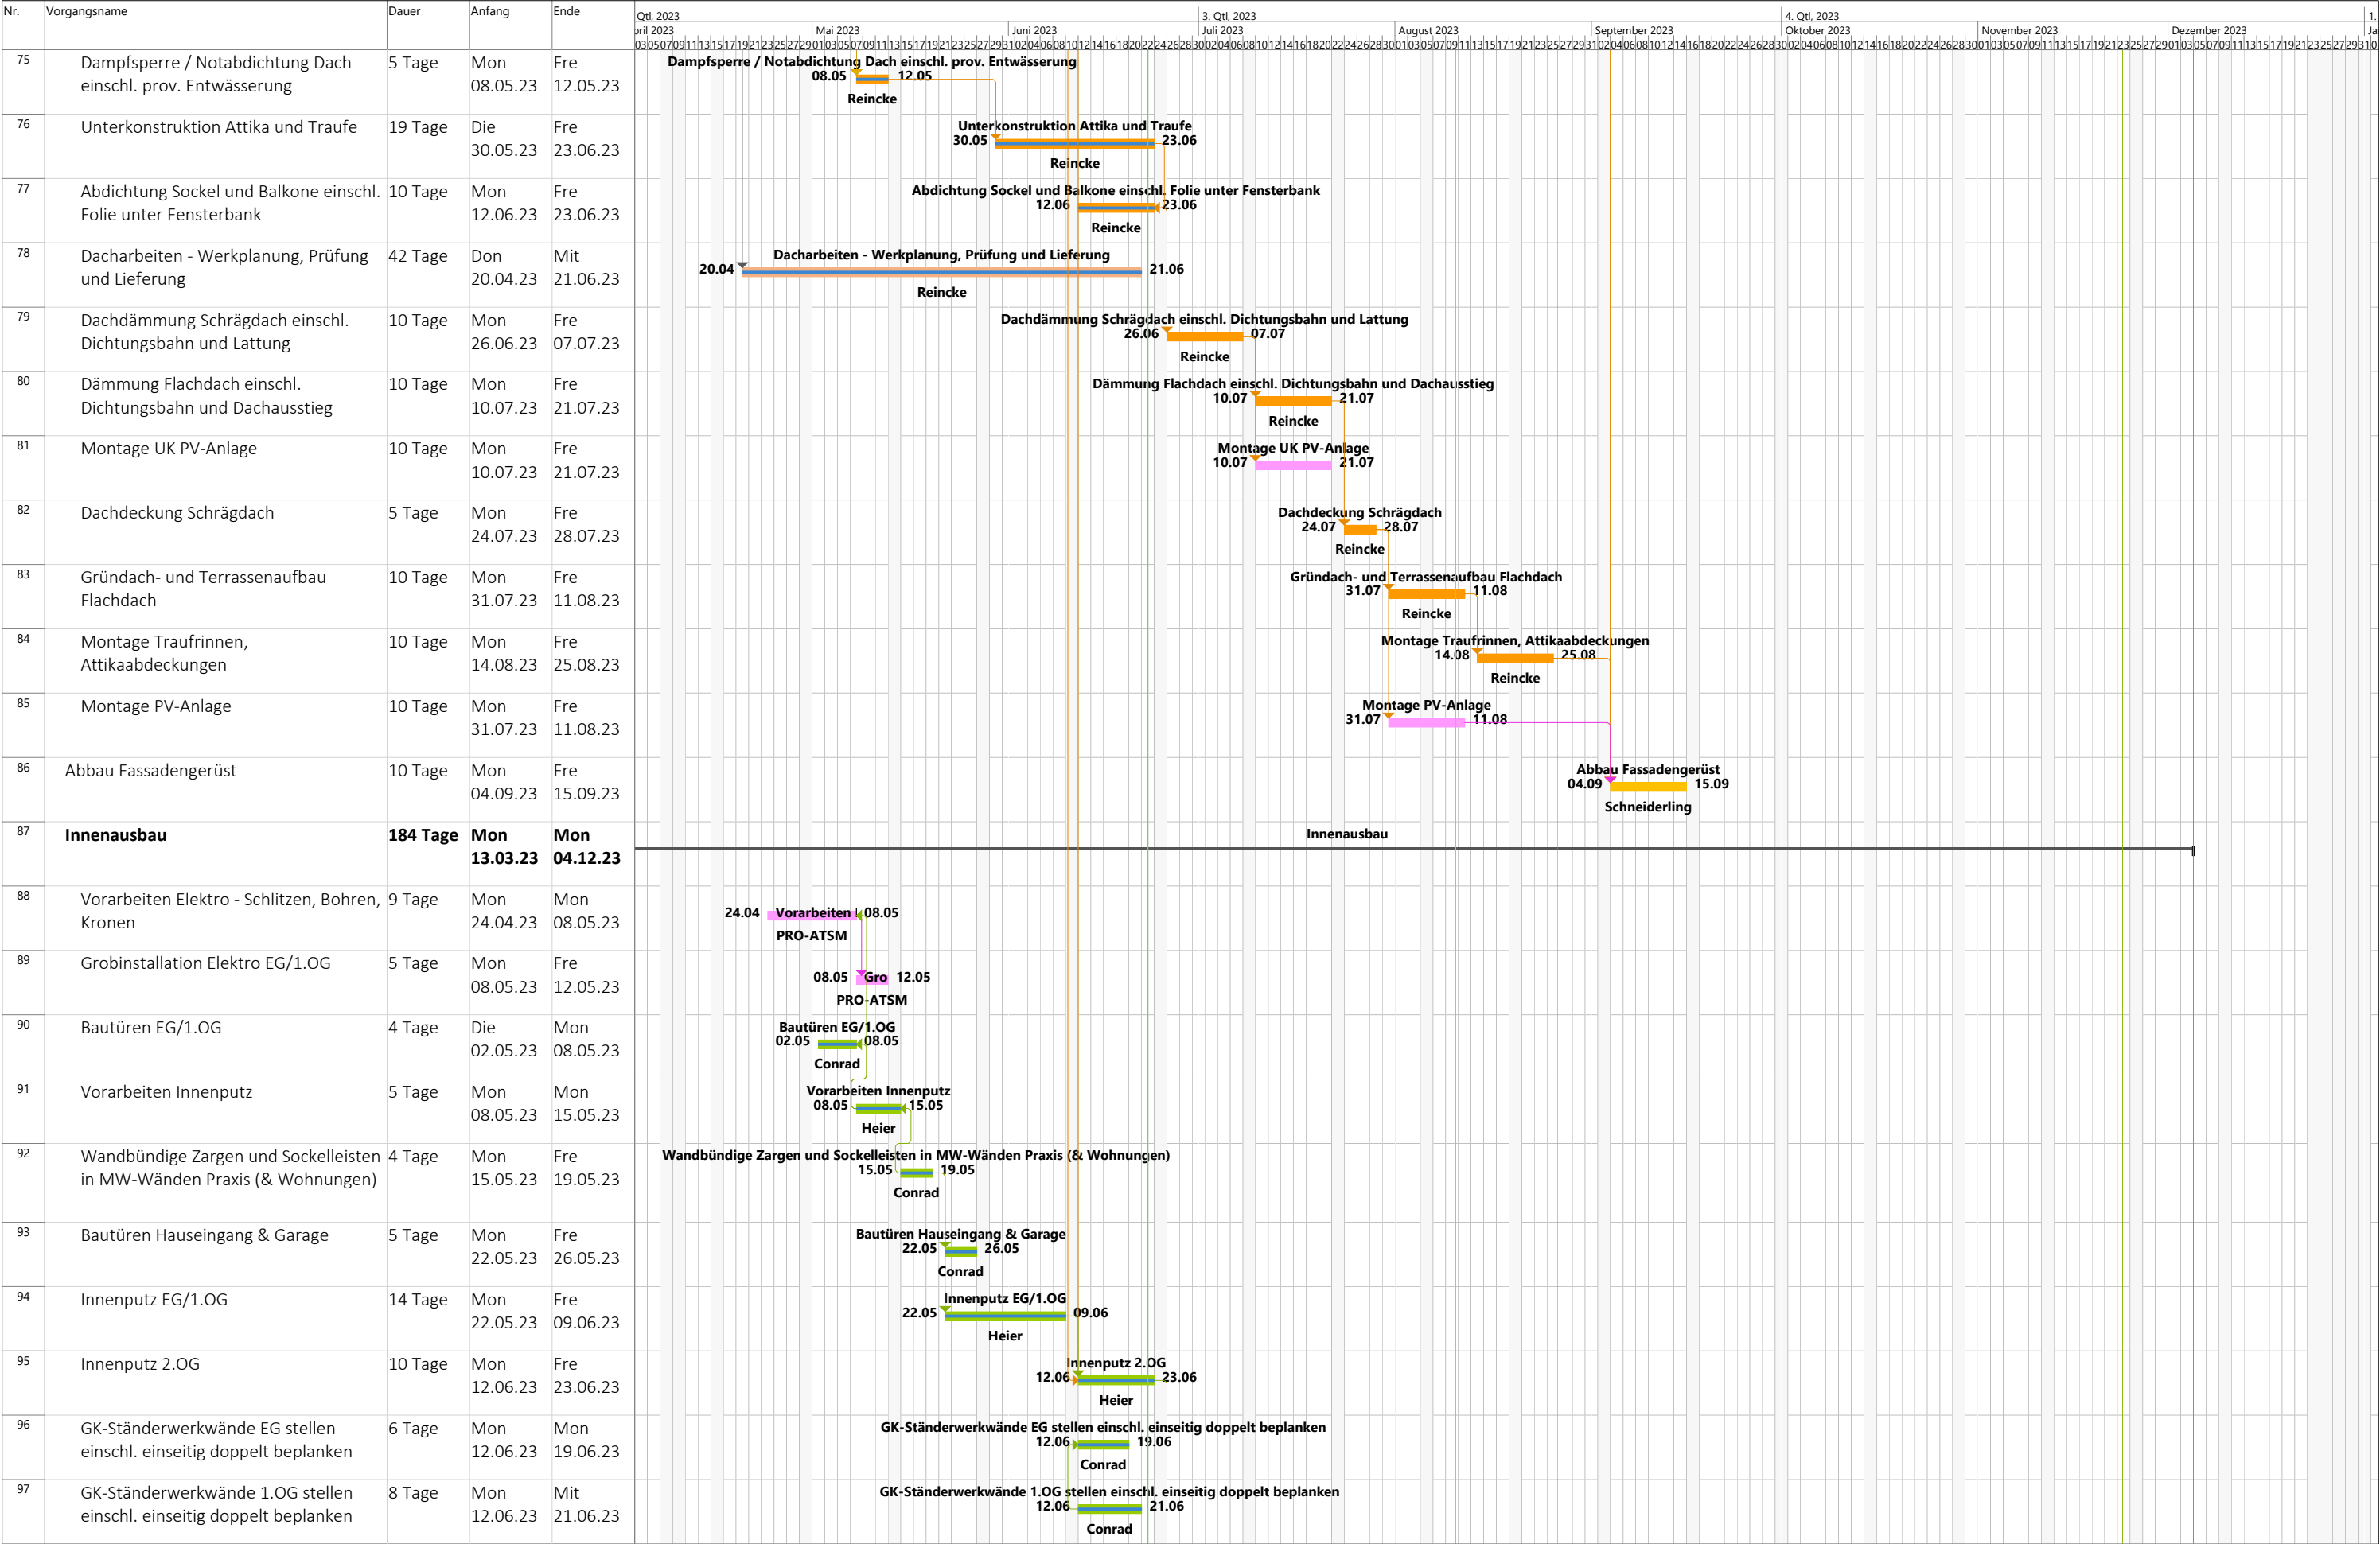

| Nr. | Vorgangsname                                                          | Dauer    | Anfang       | Ende         | 1. Qtl. 2023<br>April 2023 | 2. Qtl. 2023<br>Mai 2023 | 3. Qtl. 2023<br>Juni 2023 | 4. Qtl. 2023<br>Juli 2023 | 5. Qtl. 2023<br>August 2023 | 6. Qtl. 2023<br>September 2023 | 7. Qtl. 2023<br>Oktober 2023 | 8. Qtl. 2023<br>November 2023 | 9. Qtl. 2023<br>Dezember 2023 | 10. Qtl. 2023<br>Januar 2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 98  | GK-Ständerwerkwände 2.OG stellen einschl. einseitig doppelt beplanken | 2 Tage   | Mon 26.06.23 | Die 27.06.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 99  | Montage Estrichwinkel / Konsolen für Treppengeländer                  | 5 Tage   | Mon 19.06.23 | Fre 23.06.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 100 | Grobinstallation Schächte, Wände und FB-Aufbau HLS                    | 28 Tage  | Mon 19.06.23 | Mit 26.07.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 101 | GK-Ständerwerkwände EG schließen                                      | 3 Tage   | Don 13.07.23 | Mon 17.07.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 102 | GK-Ständerwerkwände 2.OG schließen                                    | 3 Tage   | Die 18.07.23 | Don 20.07.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 103 | GK-Ständerwerkwände 1.OG schließen                                    | 4 Tage   | Fre 21.07.23 | Mit 26.07.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 104 | Verlegen Fußbodendämmung 2.OG (Installationsebene)                    | 5 Tage   | Fre 21.07.23 | Don 27.07.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 105 | Verlegen Fußbodendämmung 1.OG (Installationsebene)                    | 5 Tage   | Fre 28.07.23 | Don 03.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 106 | Verlegen Fußbodendämmung EG (Installationsebene)                      | 5 Tage   | Fre 04.08.23 | Don 10.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 107 | Fußbodenheizung 2.OG einschl. Dämmung                                 | 5 Tage   | Fre 28.07.23 | Don 03.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 108 | Fußbodenheizung 1.OG einschl. Dämmung                                 | 5 Tage   | Fre 04.08.23 | Don 10.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 109 | Fußbodenheizung EG einschl. Dämmung                                   | 5 Tage   | Fre 11.08.23 | Don 17.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 110 | Estrich 2.OG einschl. Treppenhaus                                     | 5 Tage   | Fre 11.08.23 | Don 17.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 111 | Estrich 1.OG einschl. Treppenhaus                                     | 5 Tage   | Fre 18.08.23 | Don 24.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 112 | Estrich EG einschl. Treppenhaus                                       | 5 Tage   | Fre 25.08.23 | Don 31.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 113 | UK GK-Abhangdecken 2.OG herstellen und beplanken                      | 3 Tage   | Fre 01.09.23 | Die 05.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 114 | UK GK-Abhangdecken 1.OG herstellen und beplanken                      | 4 Tage   | Mit 06.09.23 | Mon 11.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 115 | UK GK-Abhangdecken EG herstellen und beplanken                        | 3 Tage   | Die 12.09.23 | Don 14.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 116 | Installationsarbeiten HLSE in Abhangdecken (?)                        | 10 Tage  | Mit 06.09.23 | Die 19.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 117 | GK-Abhangdecken 2.OG Oberflächen spachteln und schleifen              | 3 Tage   | Fre 15.09.23 | Die 19.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 118 | GK-Abhangdecken 1.OG Oberflächen spachteln und schleifen              | 4 Tage   | Mit 20.09.23 | Mon 25.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 119 | GK-Abhangdecken EG Oberflächen spachteln und schleifen                | 3 Tage   | Die 26.09.23 | Don 28.09.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 120 | Fertigung und Lieferung Aufzug                                        | 100 Tage | Mon 13.03.23 | Fre 04.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |
| 121 | Montage Aufzug                                                        | 15 Tage  | Mon 07.08.23 | Fre 25.08.23 |                            |                          |                           |                           |                             |                                |                              |                               |                               |                              |

