


Dachlattung

Dach

DA 01



Wandtyp: Dach
Gewicht: 806,356 kg

Reihenfolge: 47
Wandtyp: Dach

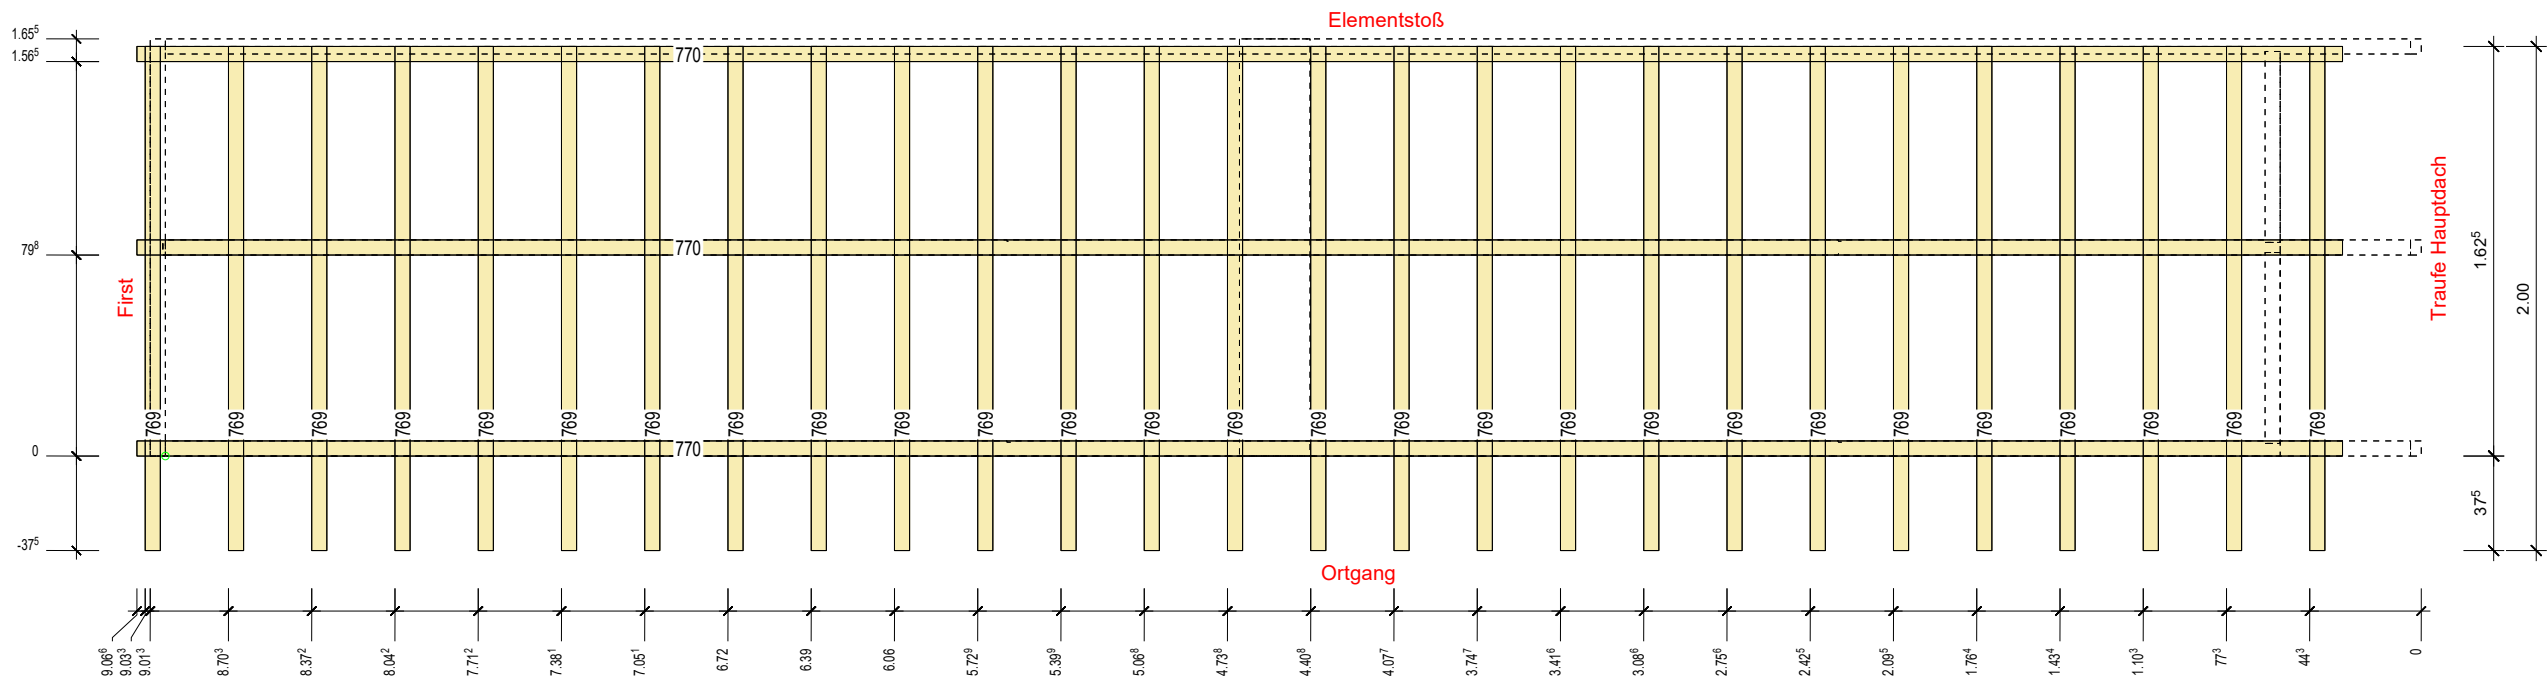

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
444	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.655	
445	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.655	
447	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
448	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
446	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.963	
449	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.758	
769	NH C24	Dachlatte	27	4.0	6.0	2.000	
770	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.754	
			37				

Grundriss Dach

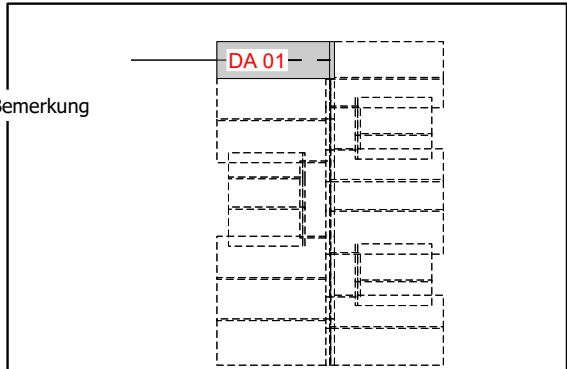

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 01

13.03.2023

Bauvorhaben:
BV Geniner Dorfstr.

Proj.-Nr.: 2021039
Bearbeiter: L.Greiser

Kunde:
Fam. Paustian
Geniner Dorfstraße 48
Lübeck

STAMER


Dachlattung

Dach

DA 02

Wandtyp: Dach
Gewicht: 1109,277 kg

Reihenfolge: 48
Wandtyp: Dach

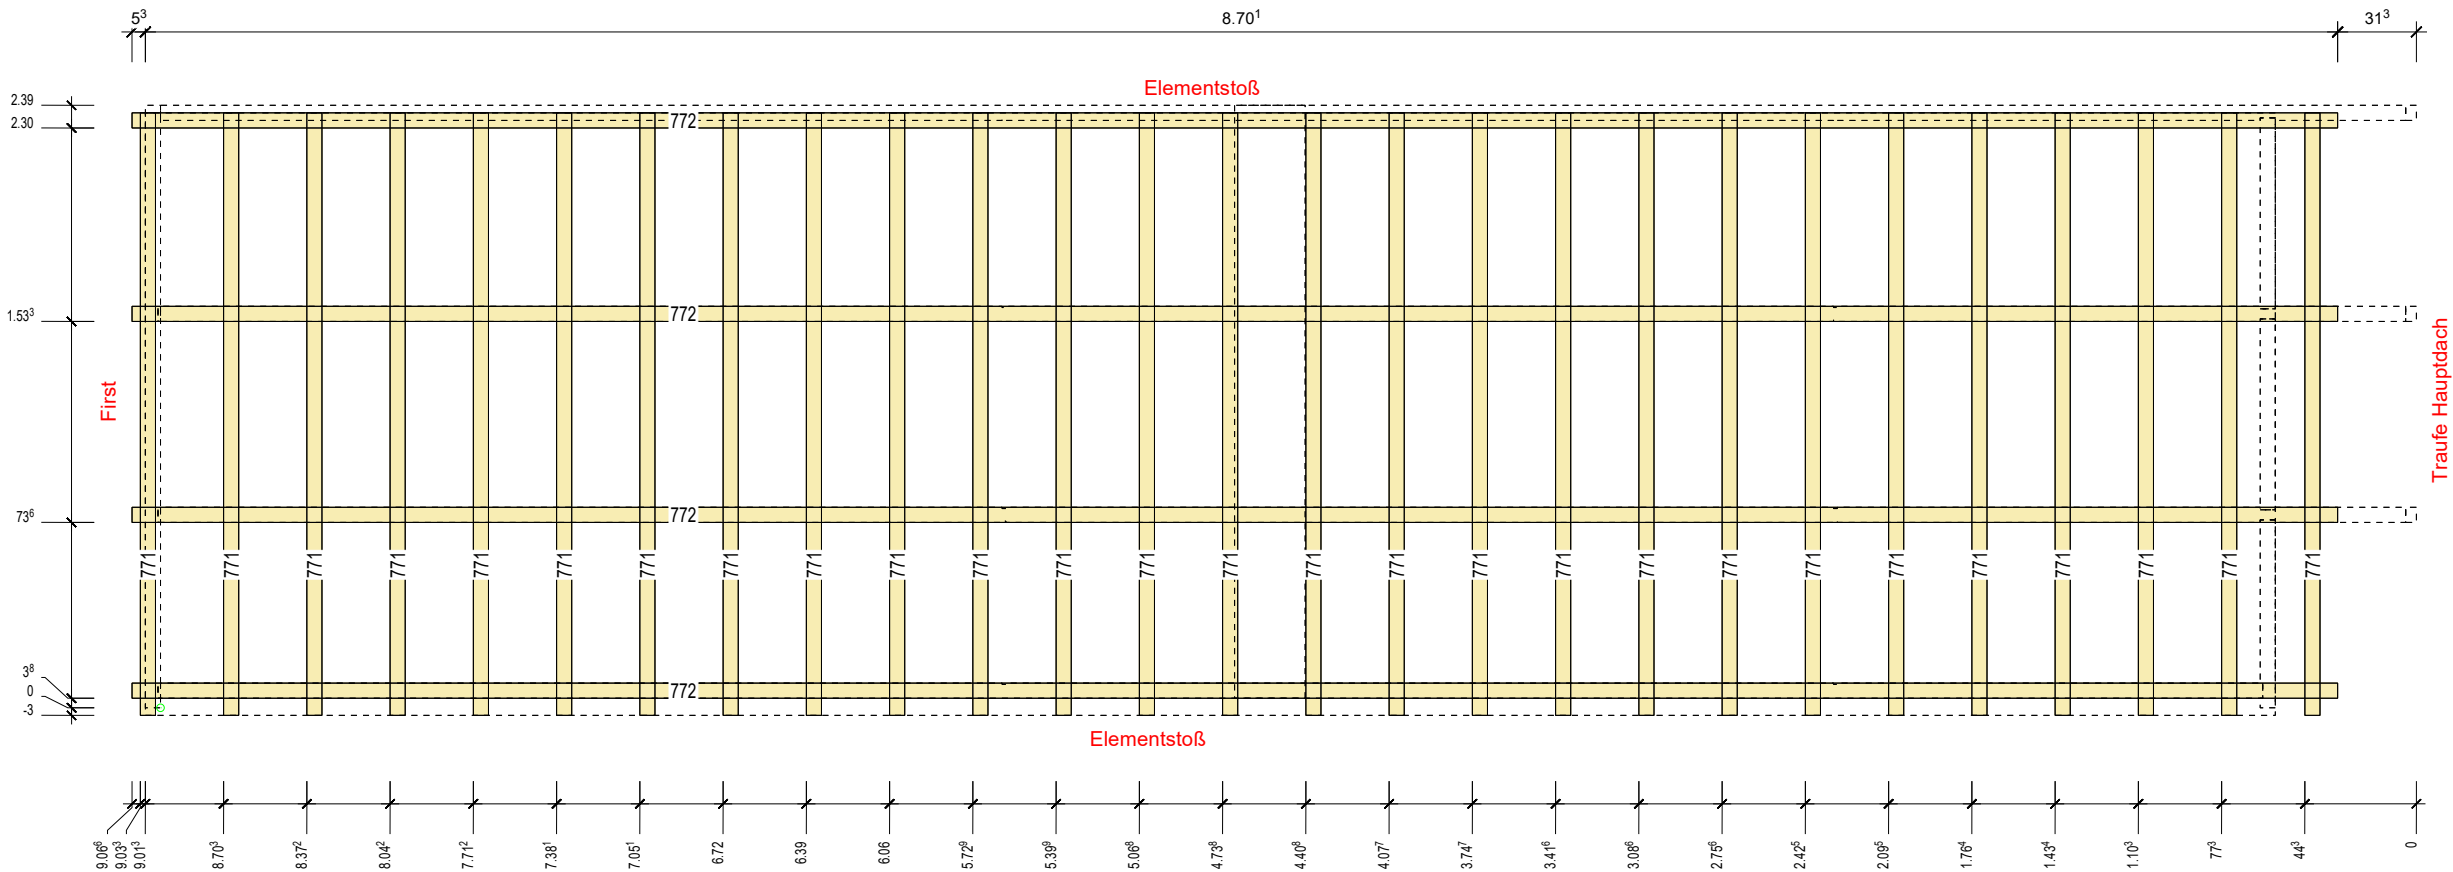

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
450	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.353
451	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.391
452	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.353
454	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953
453	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.963
455	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.746
456	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.758
771	NH C24	Dachlatte	27	4.0	6.0	2.391
772	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	8.754
			40			

Grundriss Dach

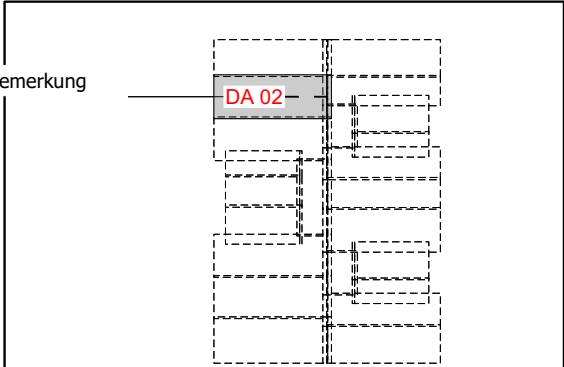

DA 02	
13.03.2023	Kunde:
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	STAMER


Dachlattung

Dach


DA 03

Wandtyp: Dach
Gewicht: 1092,626 kg

Reihenfolge: 49
Wandtyp: Dach

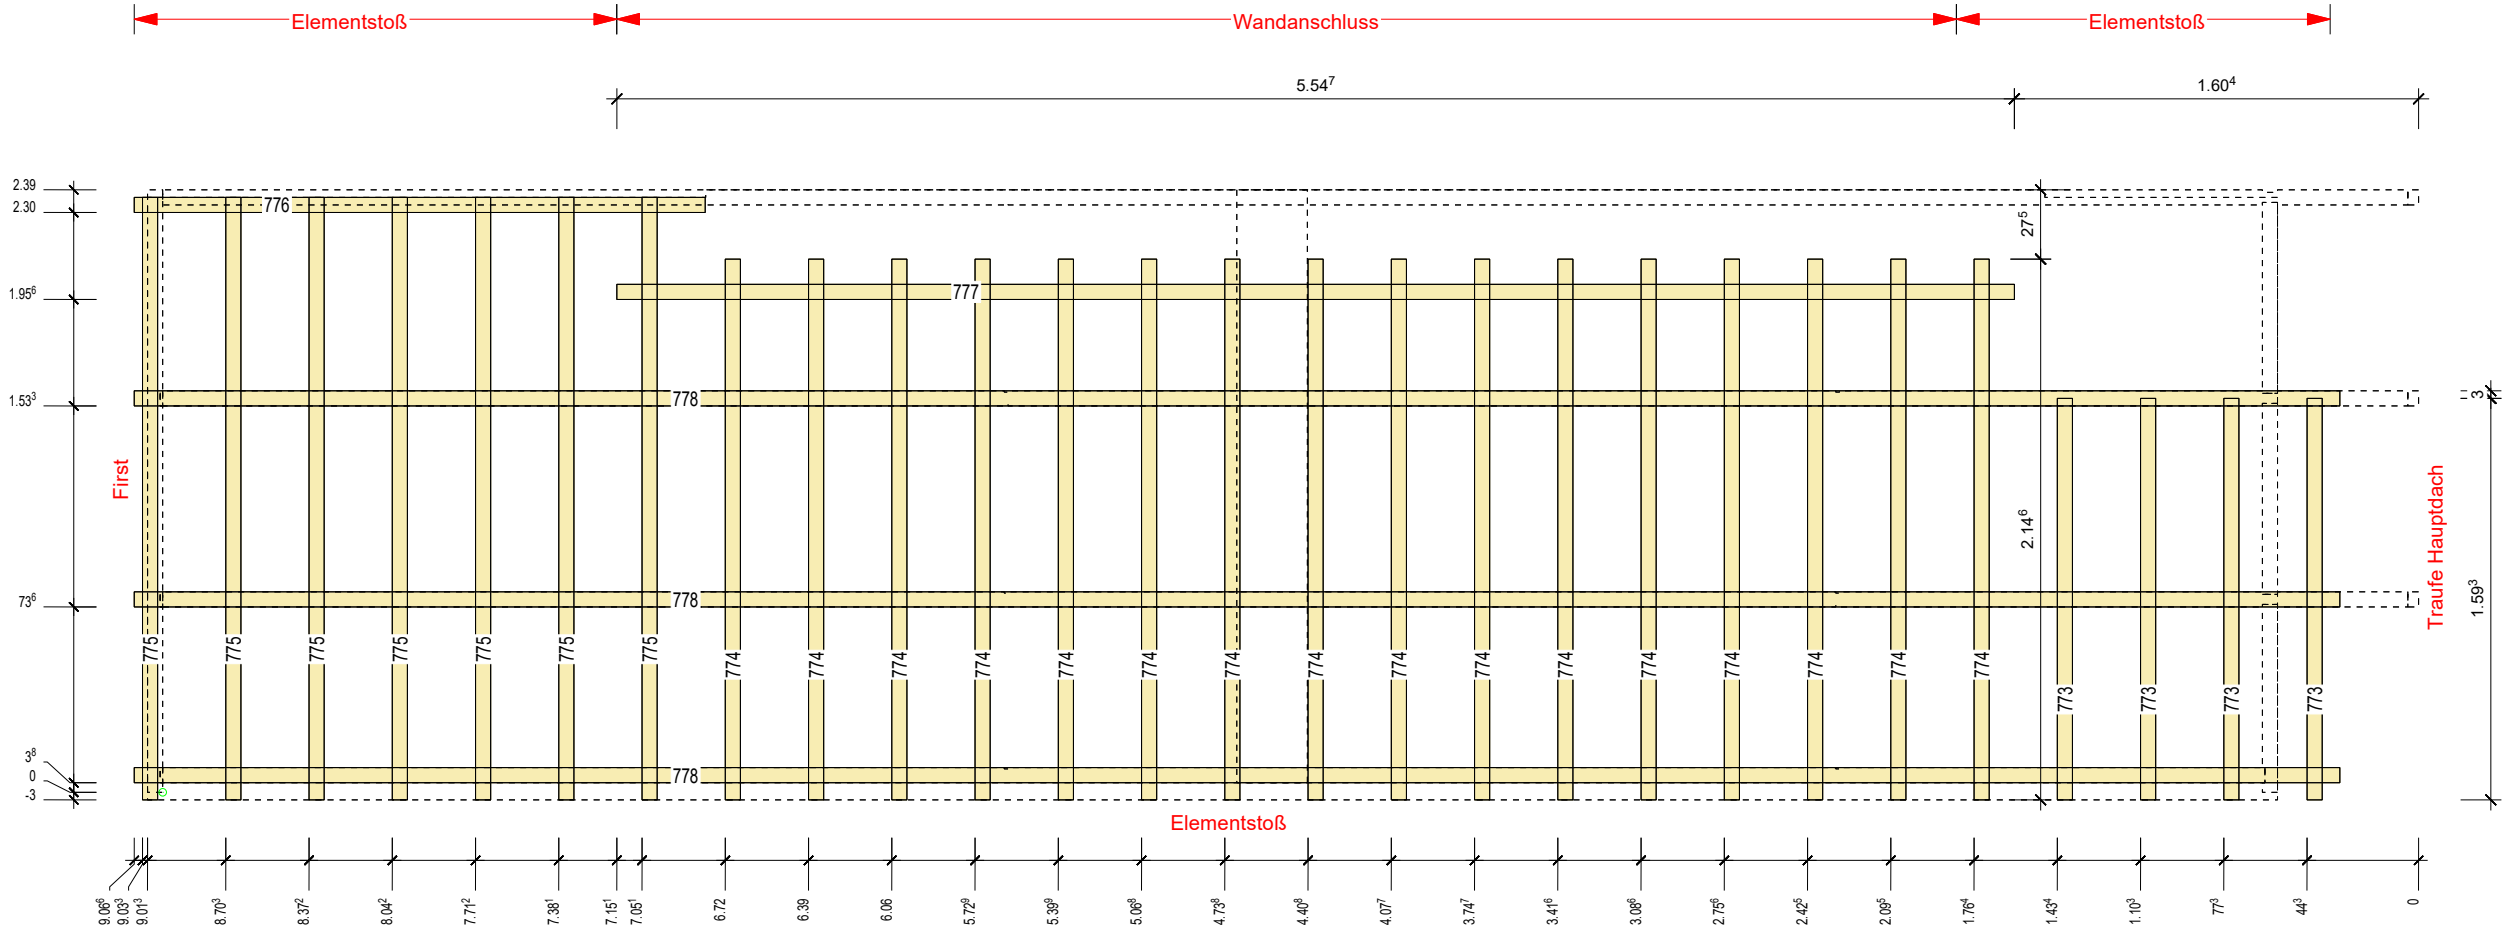

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
457	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.353
458	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.391
459	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.353
460	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953
461	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.963
462	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.746
463	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.758
773	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	1.593
774	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	2.146
775	NH C24	Dachlatte	7	4.0	6.0	2.391
776	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	2.266
777	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547
778	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.754
			41			

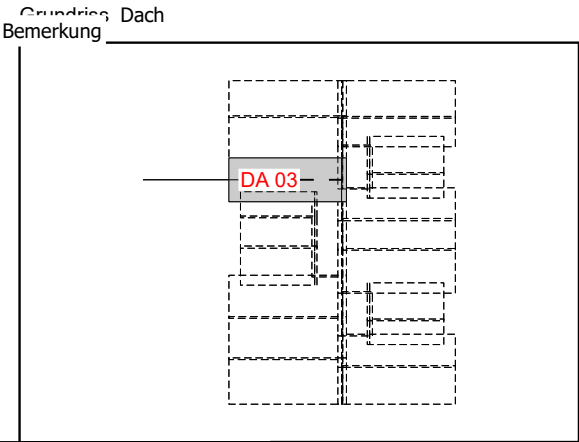

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 03	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 04

Wandtyp: Dach
Gewicht: 538,781 kg

Reihenfolge: 55
Wandtyp: Dach

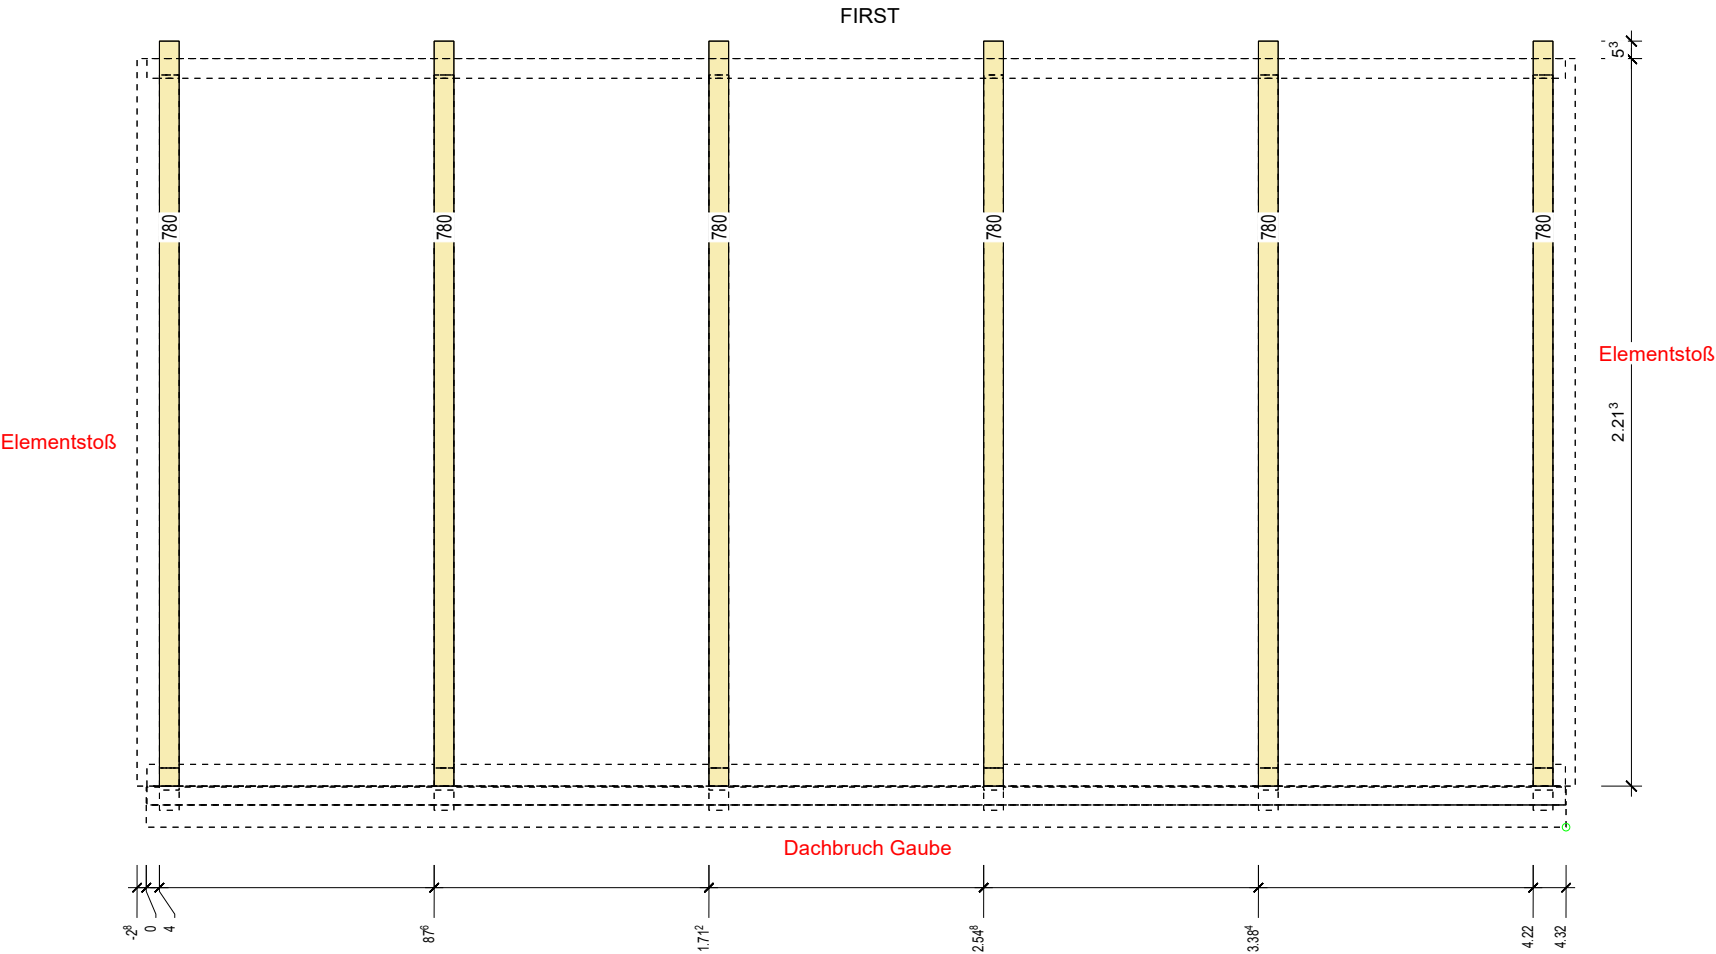

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
464	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.0	4.320	
465	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.4	4.316	
466	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	4.316	
467	KVH Fichte	Sparren	6	6.0	28.0	2.237	
779	NH C24	Dachlatte	7	4.0	6.0	4.376	
780	NH C24	Konterlatte	6	4.0	6.0	2.266	
			22				

Grundriss Dach

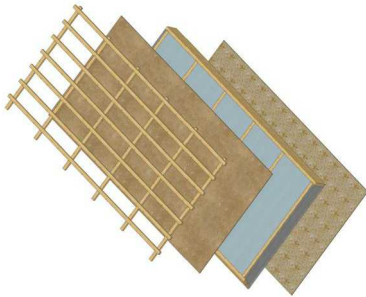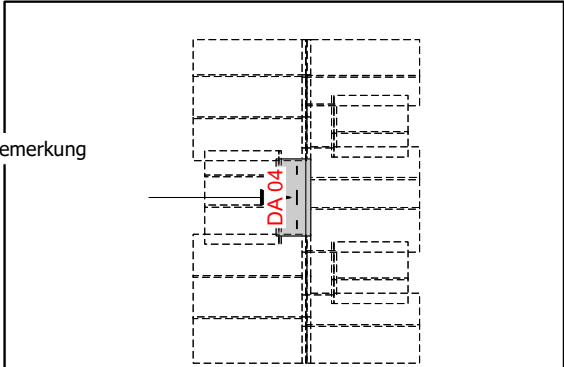

DA 04	
13.03.2023	Kunde:
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	STAMER


Dachlattung

Dach



DA 05

Wandtyp: Dach
Gewicht: 1082,817 kg

Reihenfolge: 52
Wandtyp: Dach

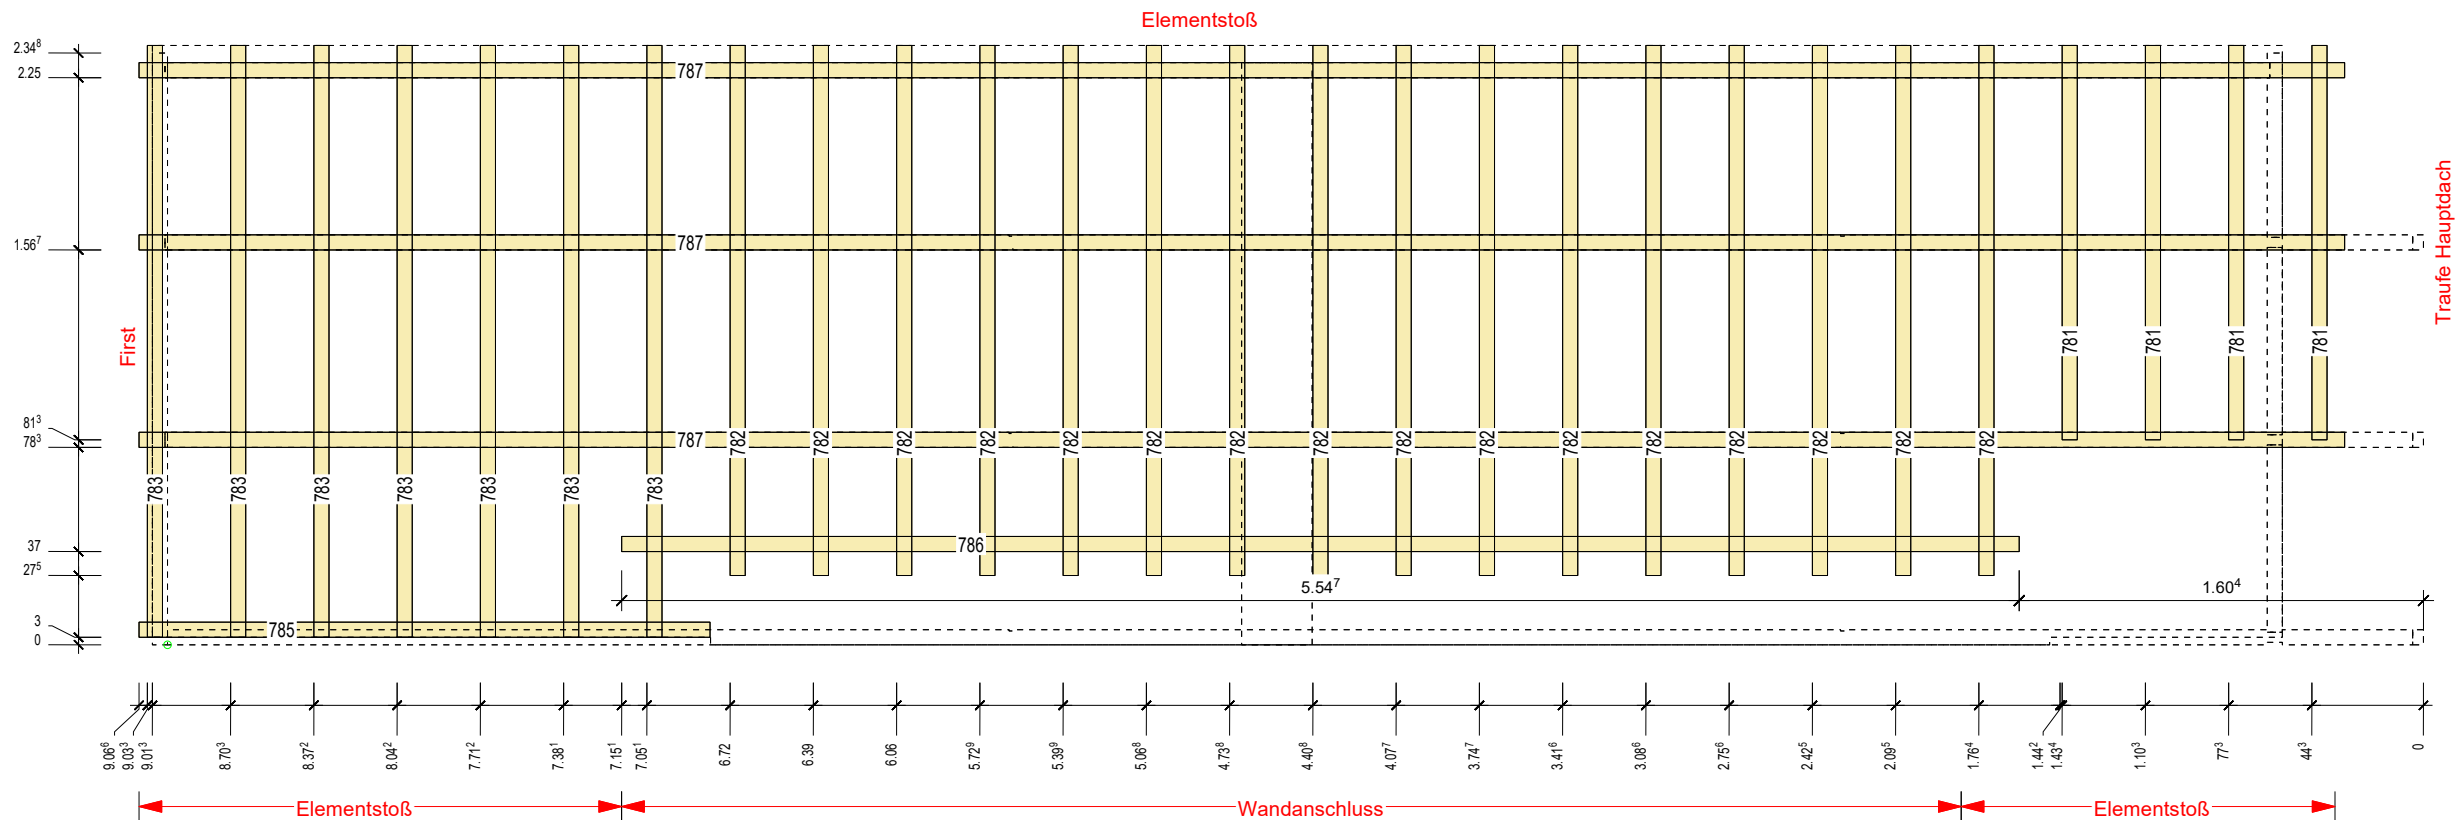

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung; Dach
468	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.310	
469	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.348	
470	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.353	
472	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
471	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.963	
473	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.731	
474	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.743	
781	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	1.565	
782	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	2.103	
783	NH C24	Dachlatte	7	4.0	6.0	2.348	
784	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	1.130	
785	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	2.266	
786	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547	
787	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.754	
			42				

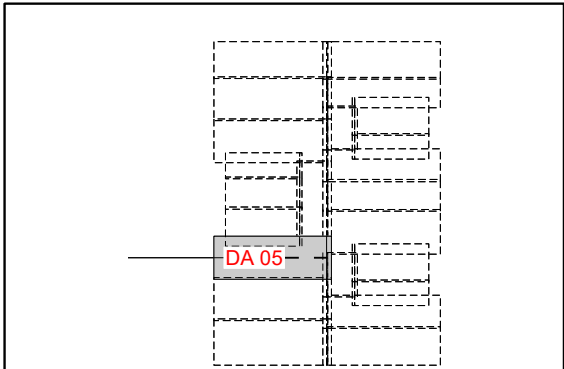

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 05	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 06

Wandtyp: Dach
Gewicht: 1094,504 kg

Reihenfolge: 51
Wandtyp: Dach

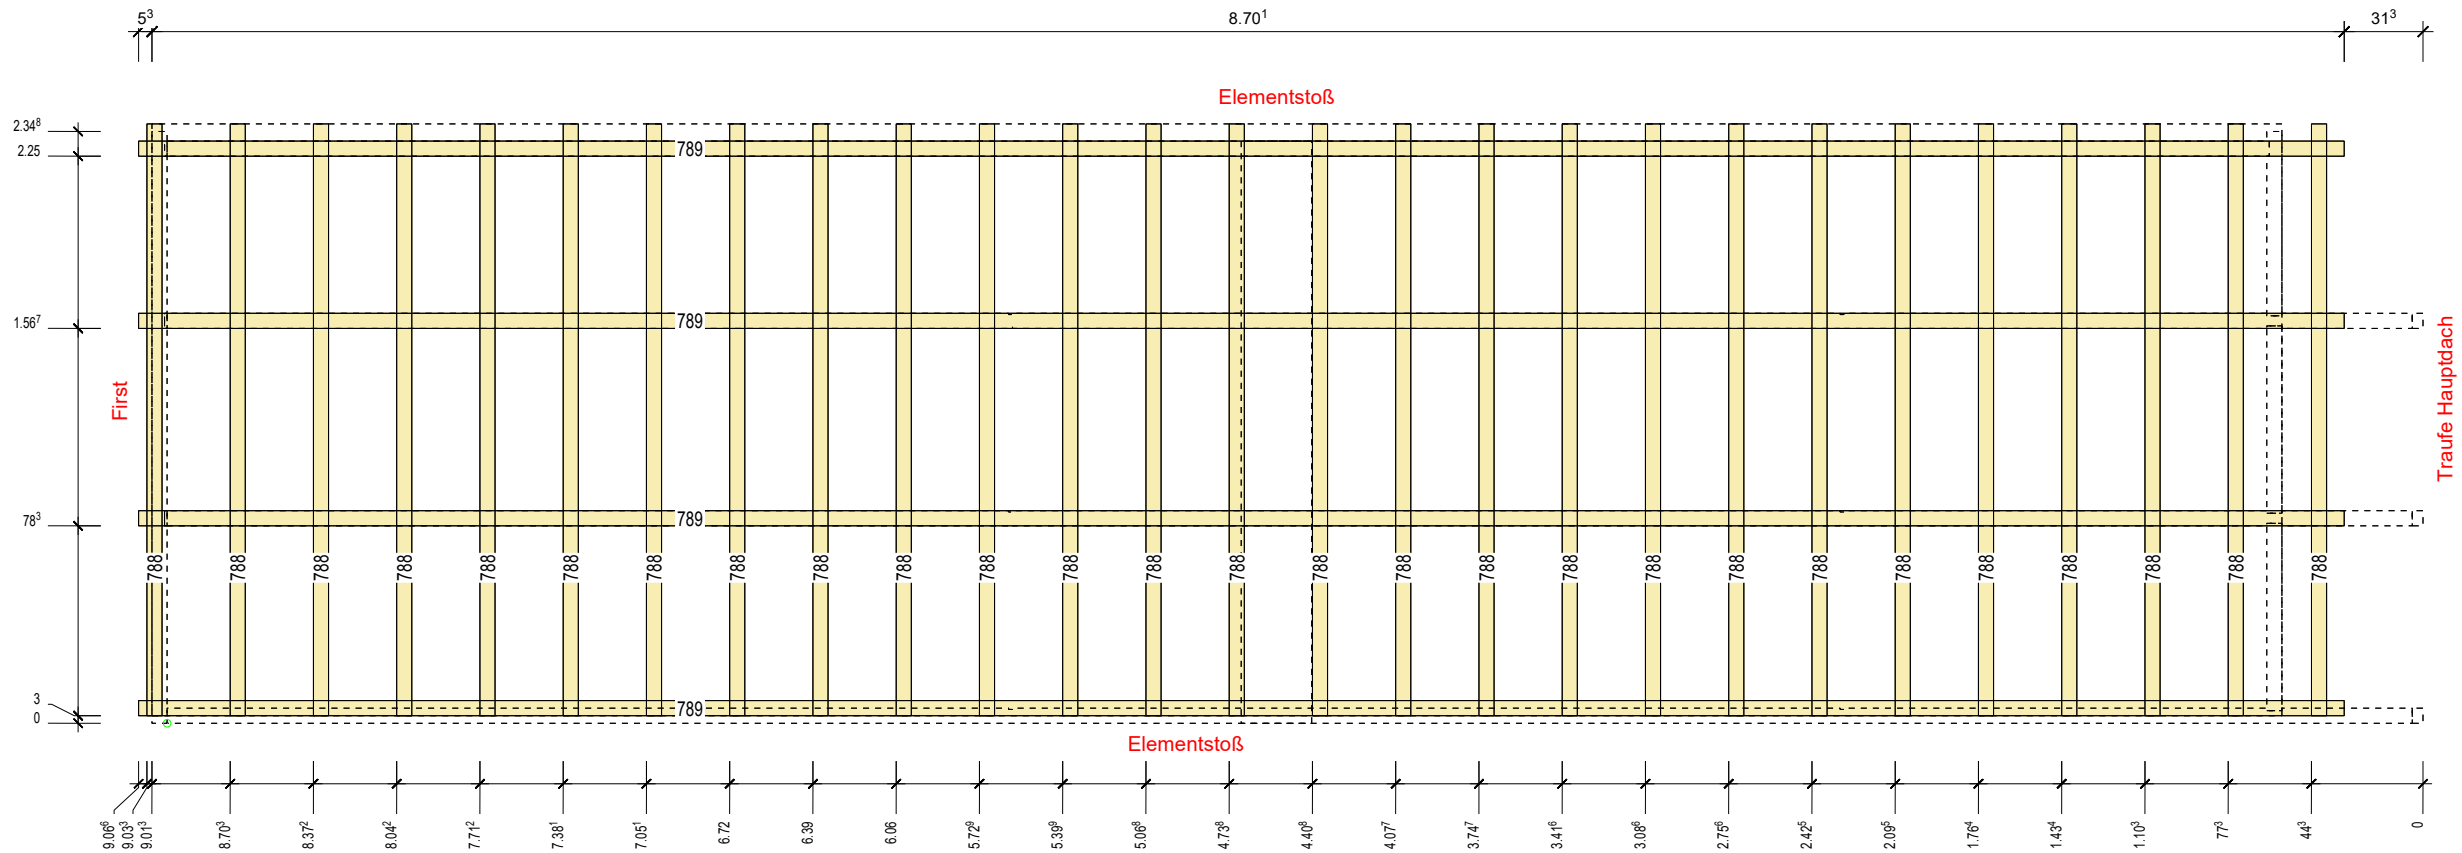

Produktionskontrolle:


Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
475	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.310	
476	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.348	
477	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.353	
478	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
479	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.963	
480	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.731	
481	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.743	
788	NH C24	Dachlatte	27	4.0	6.0	2.348	
789	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	8.754	
			40				

Grundriss Dach

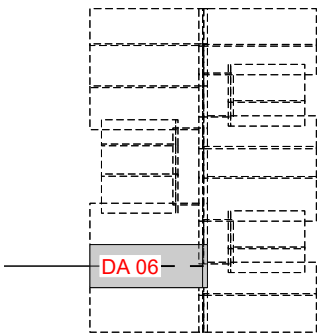

DA 06	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 07



Wandtyp: Dach
Gewicht: 1058,088 kg

Reihenfolge: 50
Wandtyp: Dach

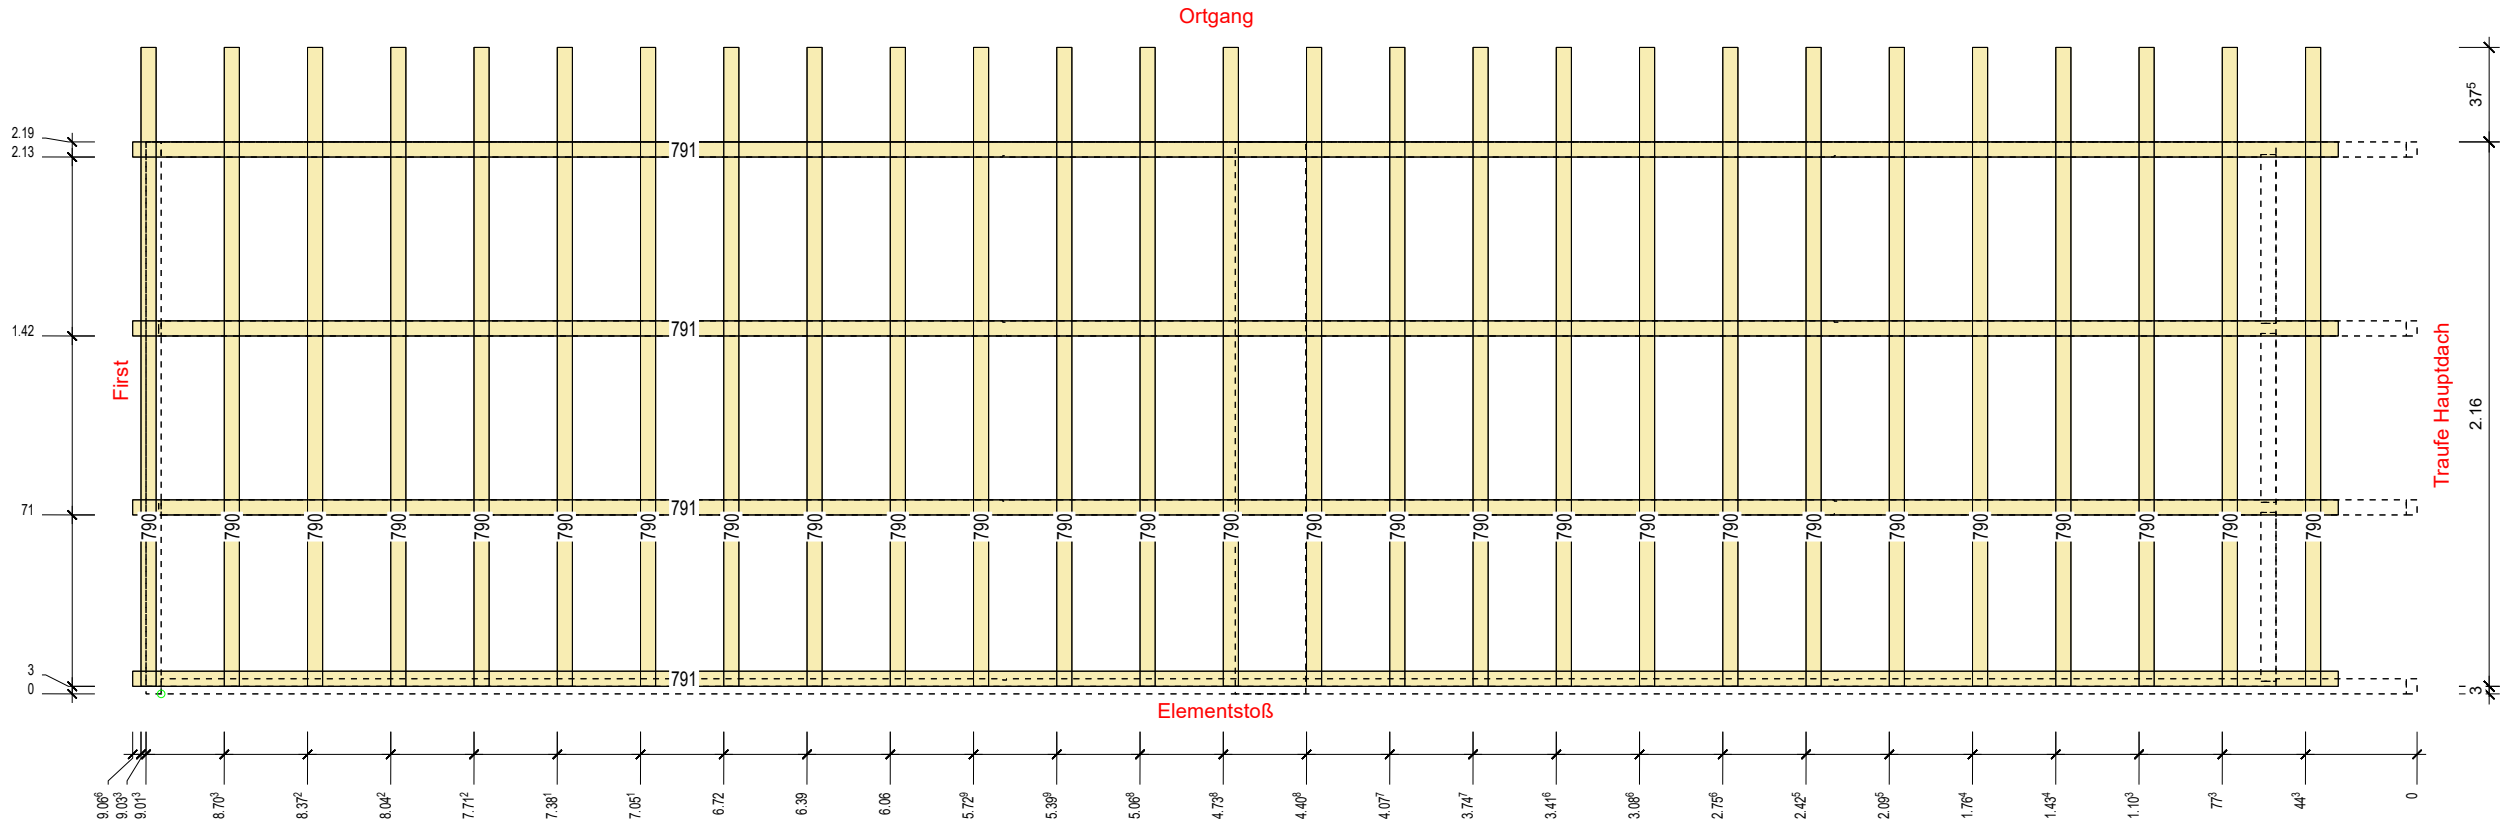

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
482	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.190	
483	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.190	
484	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
486	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.953	
485	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.963	
487	KVH Fichte	Verblockung	3	6.0	28.0	0.670	
790	NH C24	Dachlatte	27	4.0	6.0	2.535	
791	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	8.754	
			40				

Grundriss Dach

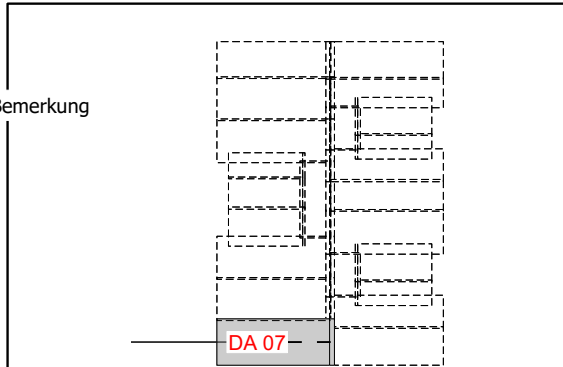

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 07

13.03.2023

Bauvorhaben:
BV Geniner Dorfstr.

Kunde:
Fam. Paustian
Geniner Dorfstraße 48
Lübeck

Proj.-Nr.: 2021039
Bearbeiter: L.Greiser




Dachlattung

Dach

DA 08


Wandtyp: Dach
Gewicht: 811,042 kg

Reihenfolge: 40
Wandtyp: Dach

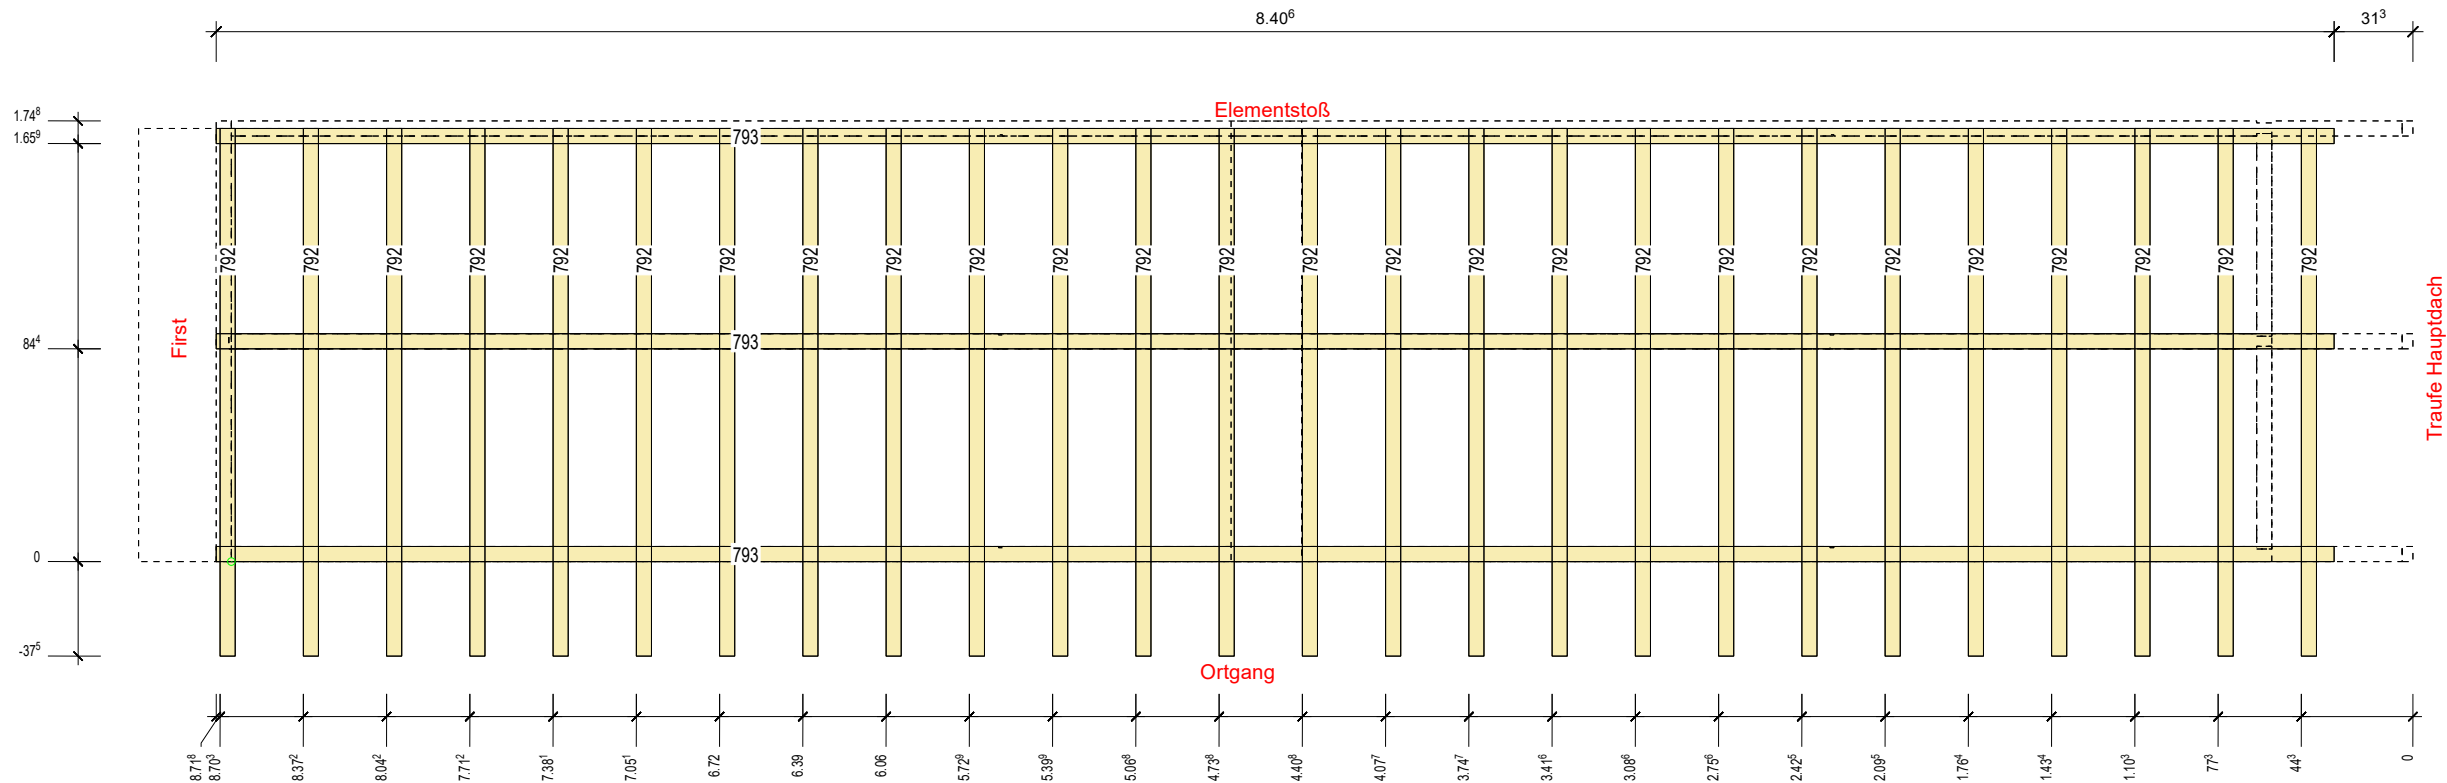

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
488	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.749
489	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.749
490	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
491	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
492	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
493	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.804
792	NH C24	Dachlatte	26	4.0	6.0	2.094
793	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.406
			36			

Grundriss Dach

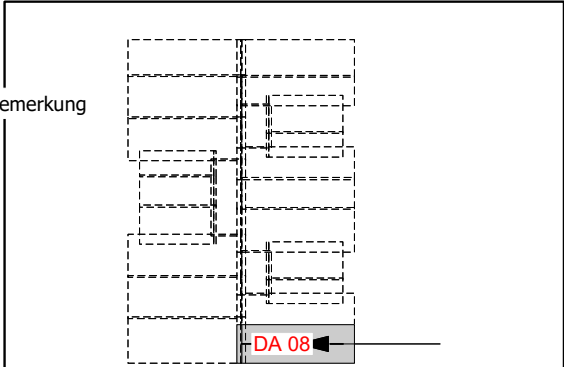

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 08	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach


DA 09

Wandtyp: Dach
Gewicht: 793,487 kg

Reihenfolge: 41
Wandtyp: Dach

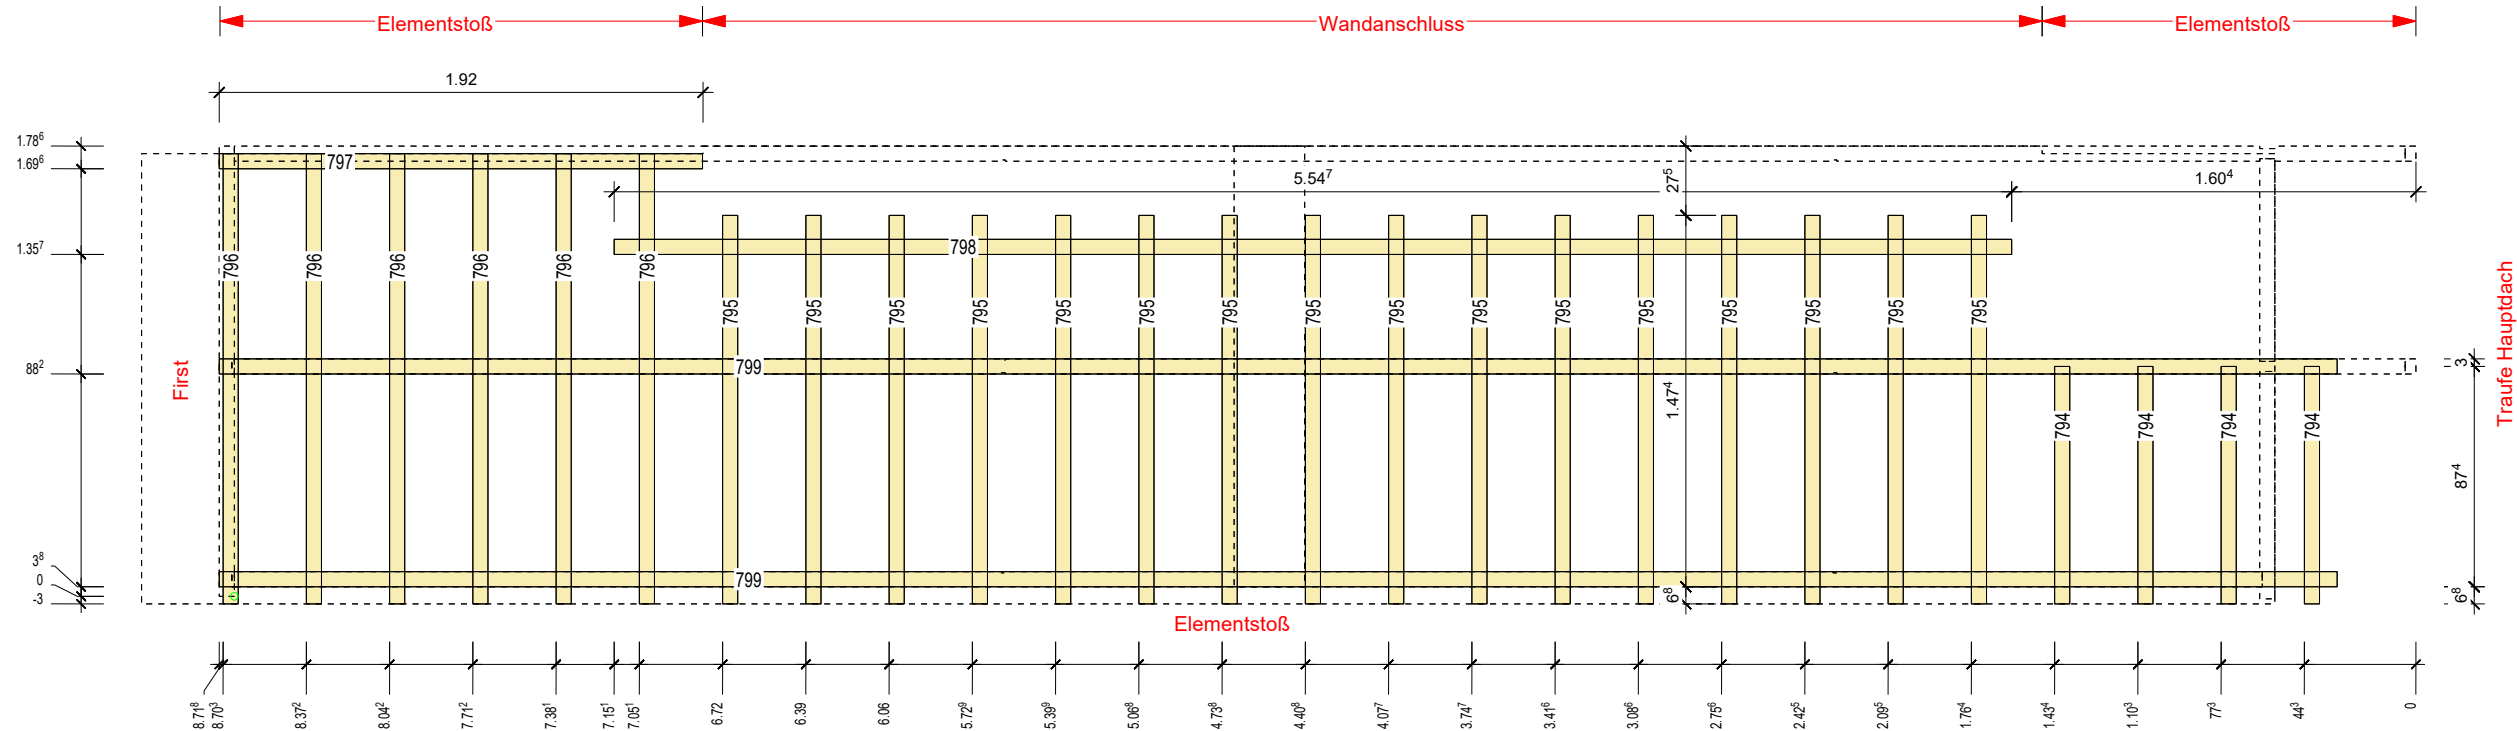

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
494	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.749
495	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.787
496	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.058
498	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
497	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
499	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.804
500	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.902
794	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	0.942
795	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	1.542
796	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	1.787
797	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	1.918
798	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547
799	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	8.406
			37			

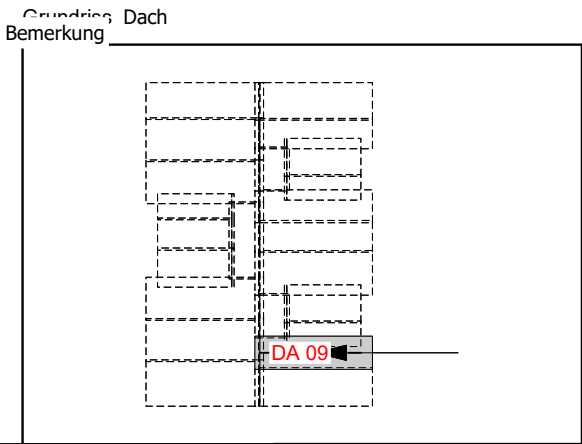

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren
Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:				
Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____				

DA 09	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 10

Wandtyp: Dach
Gewicht: 284,915 kg

Reihenfolge: 39
Wandtyp: Dach

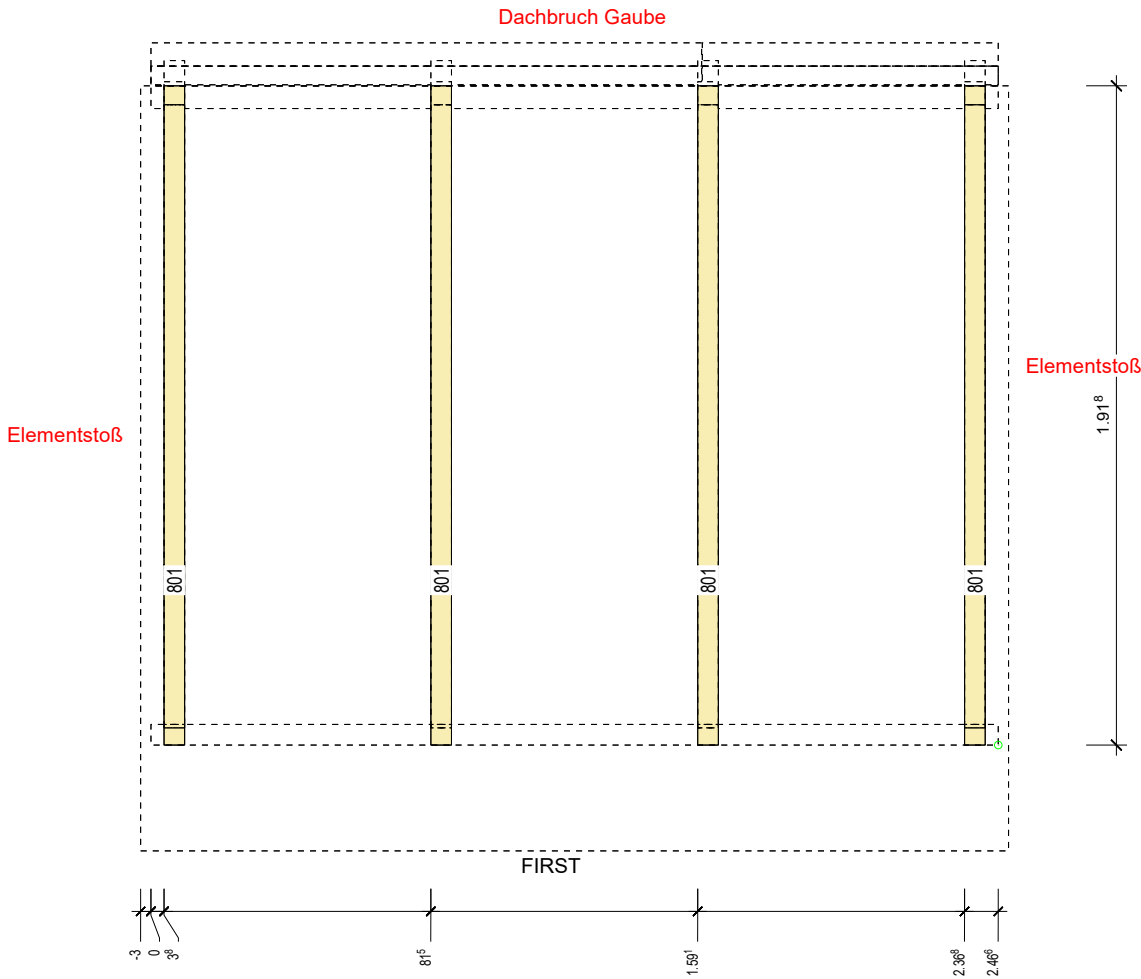

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
501	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.0	0.861	
502	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.0	1.603	
503	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.4	2.466	
504	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.466	
505	KVH Fichte	Sparren	4	6.0	28.0	1.942	
800	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	2.526	
801	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	1.918	

Grundriss Dach

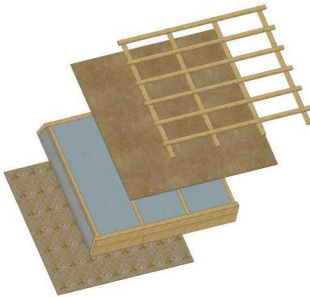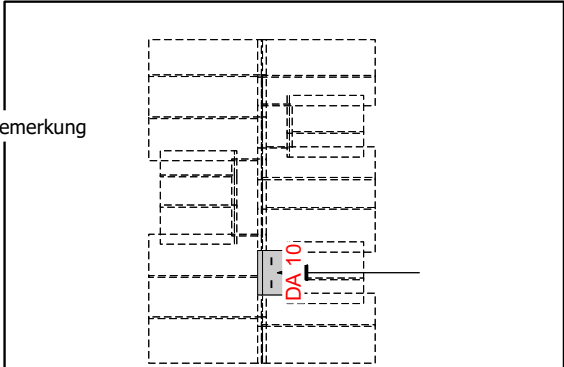

DA 10	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach


DA 11

Wandtyp: Dach
Gewicht: 1083,677 kg

Reihenfolge: 39
Wandtyp: Dach

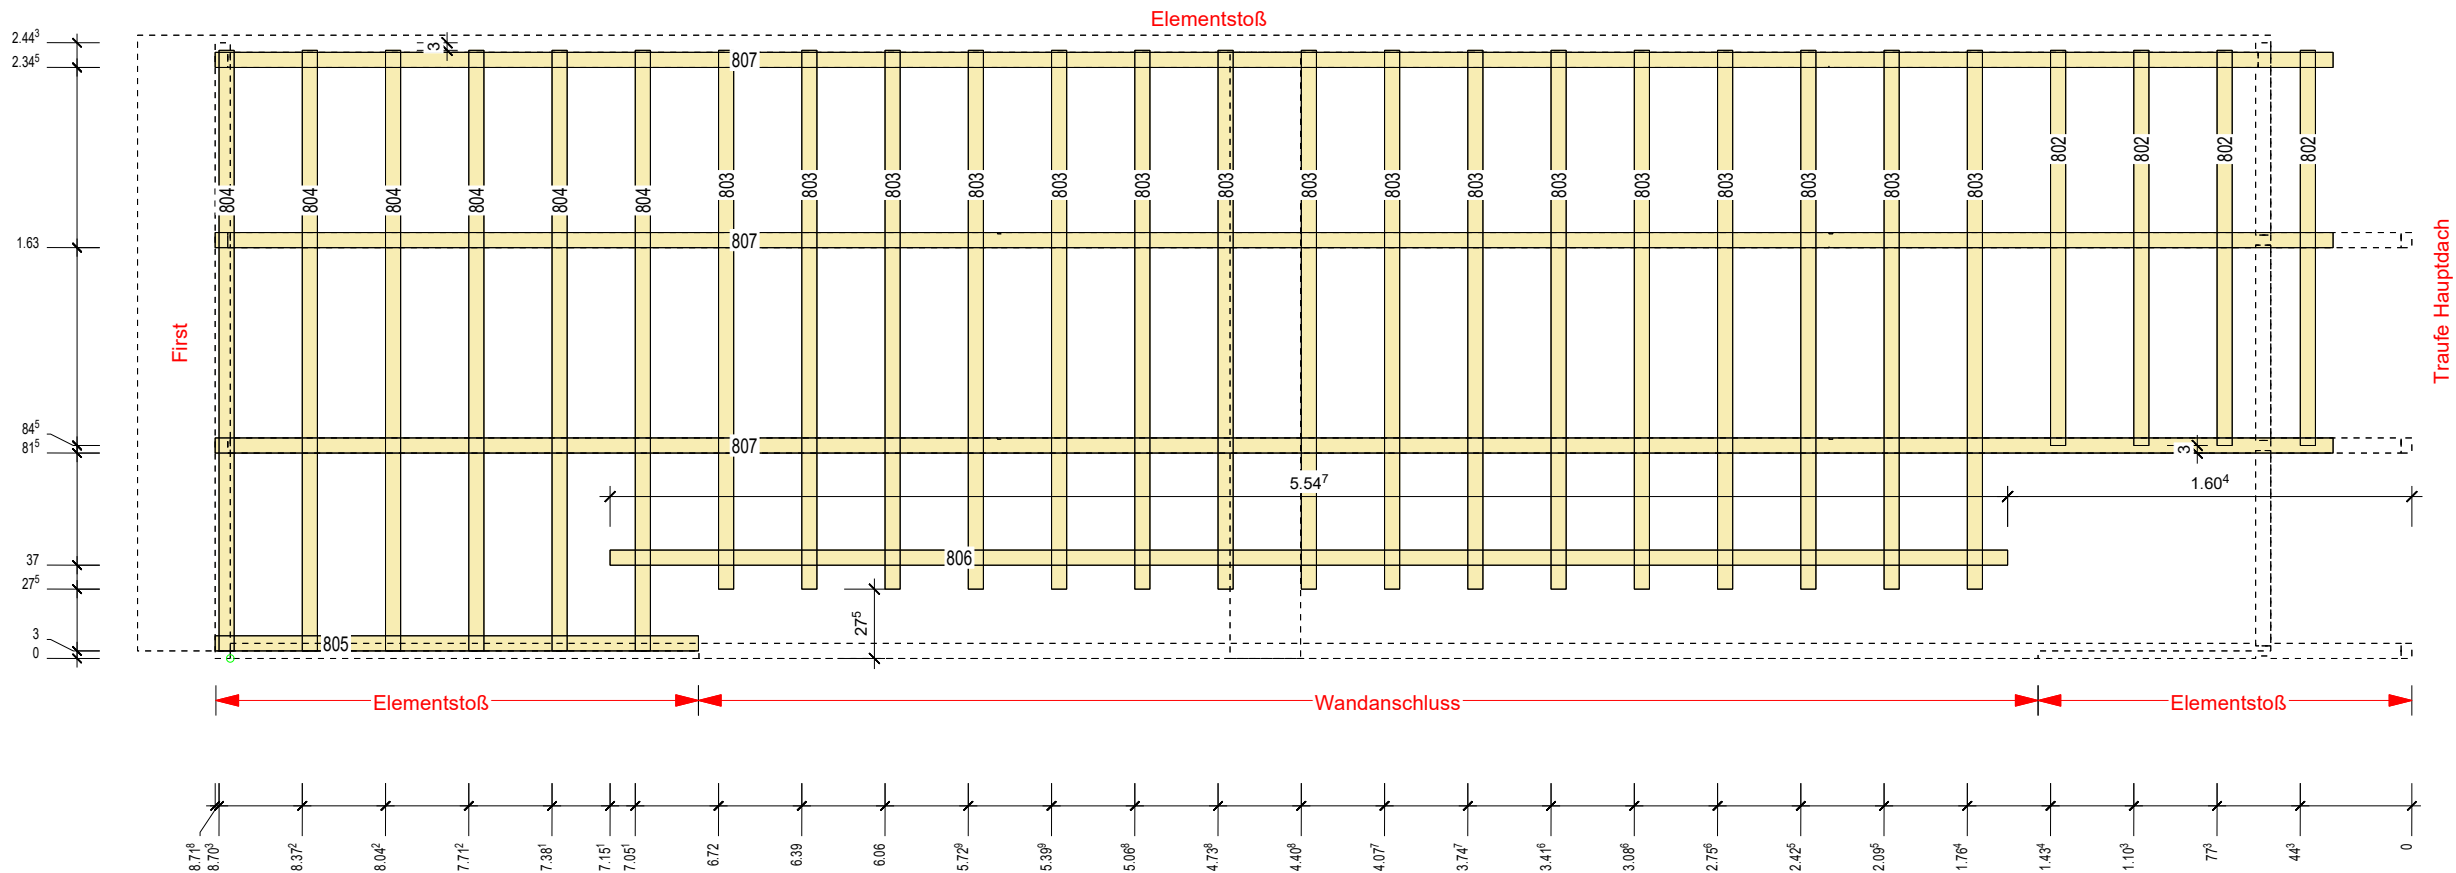

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
506	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	2.405
507	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.443
508	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.058
509	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
510	KVH Fichte	Sparren	2	6.0	28.0	8.668
511	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.763
512	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.775
802	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	1.568
803	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	2.138
804	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	2.383
805	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	1.918
806	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547
807	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.406
			40			

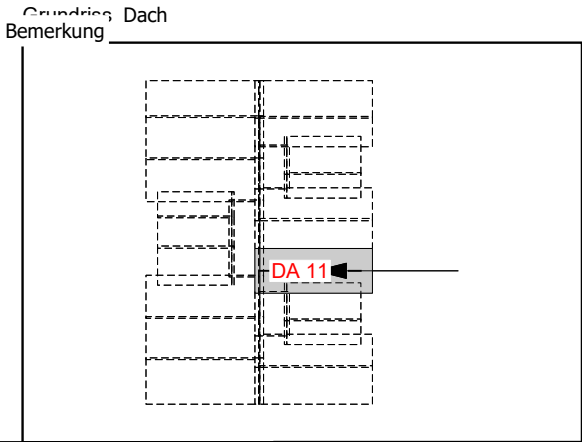

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 11	
13.03.2023	Kunde:
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 12


Wandtyp: Dach
Gewicht: 764,941 kg

Reihenfolge: 38
Wandtyp: Dach

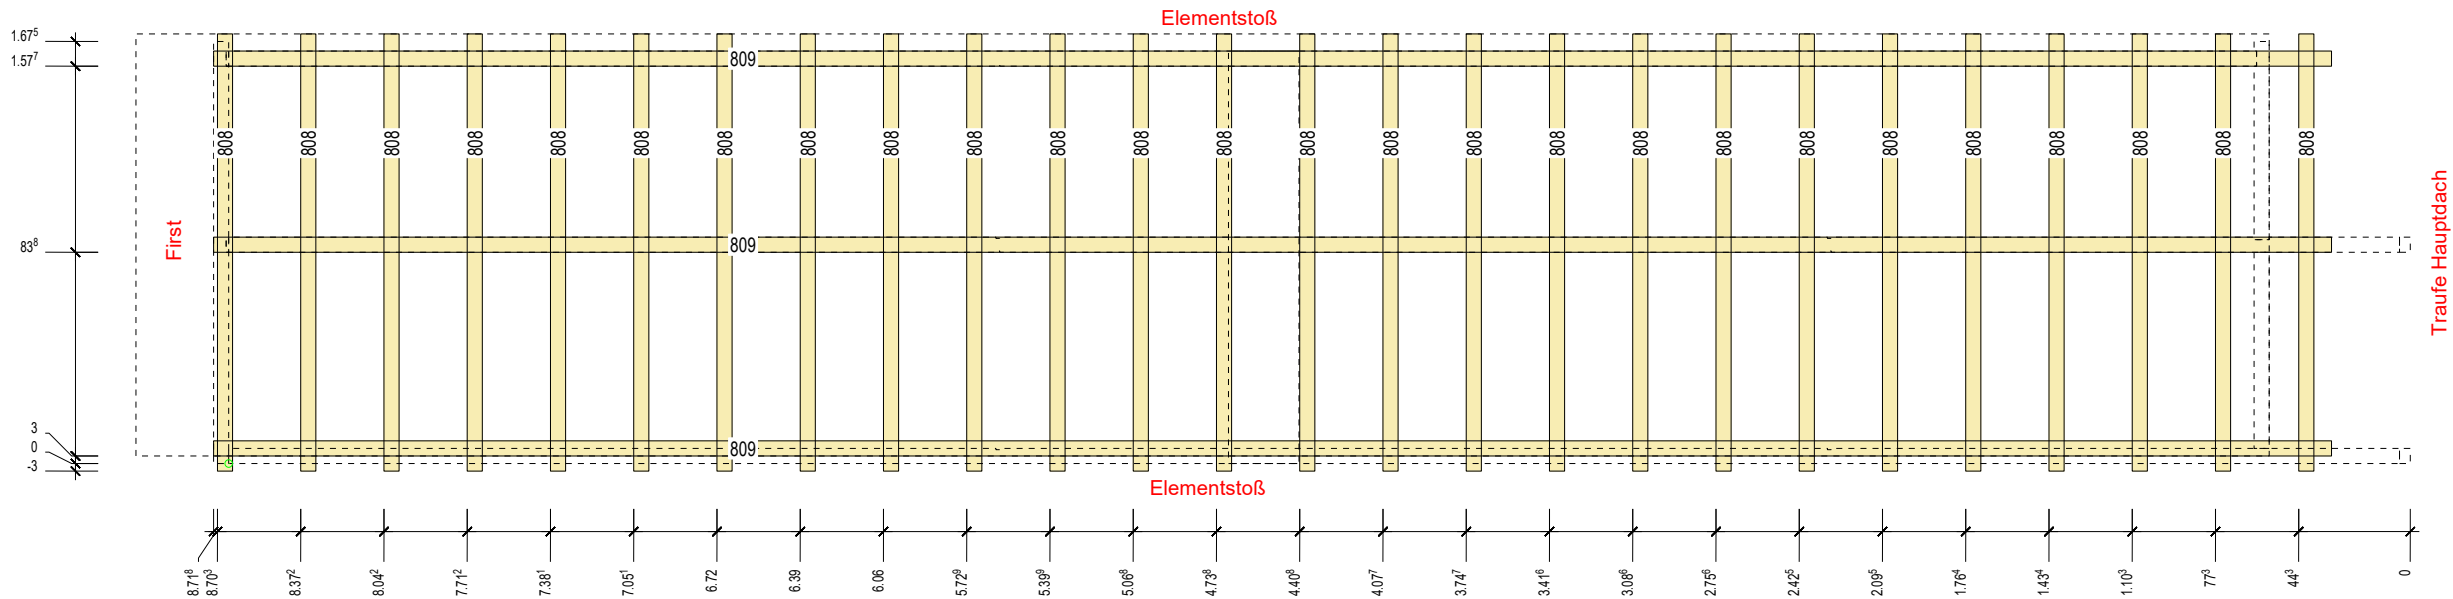

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
513	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.637
514	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.675
515	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.058
516	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
517	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
519	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.778
518	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.786
808	NH C24	Dachlatte	26	4.0	6.0	1.735
809	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.406
			36			

Grundriss Dach

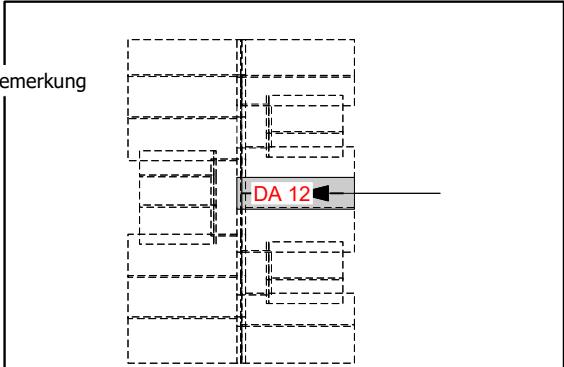

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 12	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 13


Wandtyp: Dach
Gewicht: 790,942 kg

Reihenfolge: 37
Wandtyp: Dach

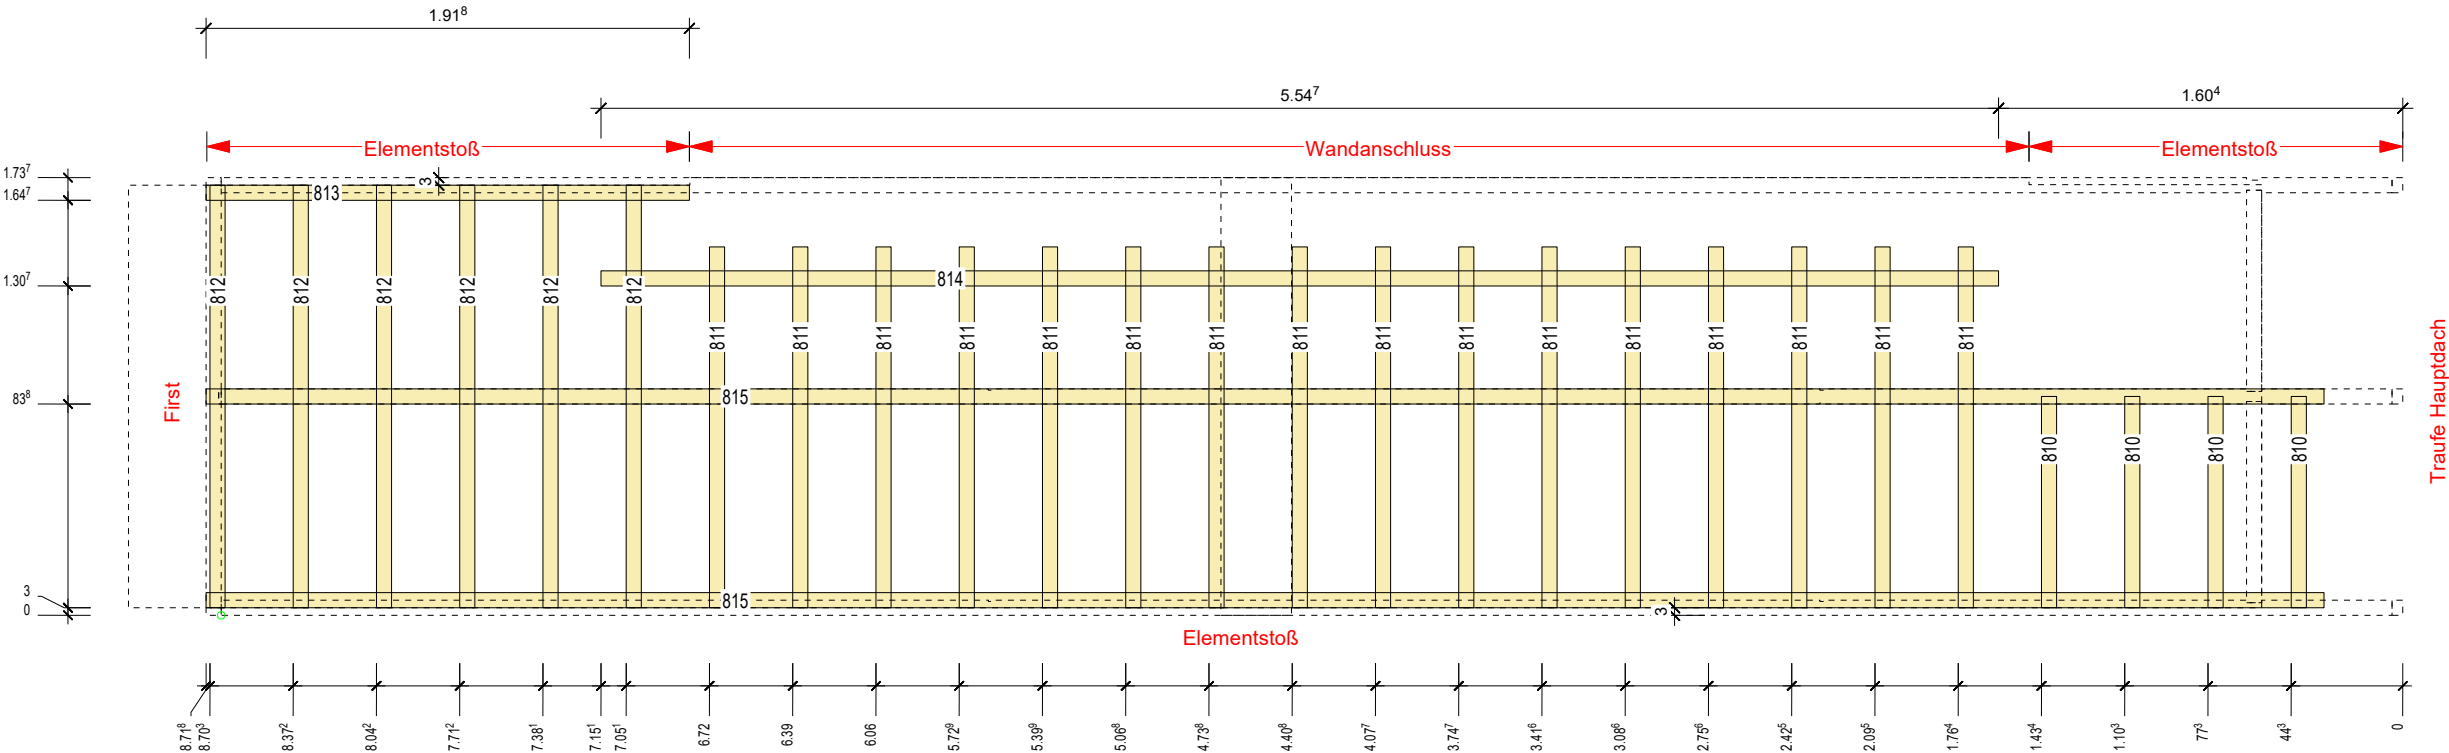

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
520	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.737
521	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.737
523	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
524	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
522	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
525	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.798
810	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	0.838
811	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	1.432
812	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	1.677
813	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	1.918
814	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547
815	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	8.406
			37			

Grundriss Dach

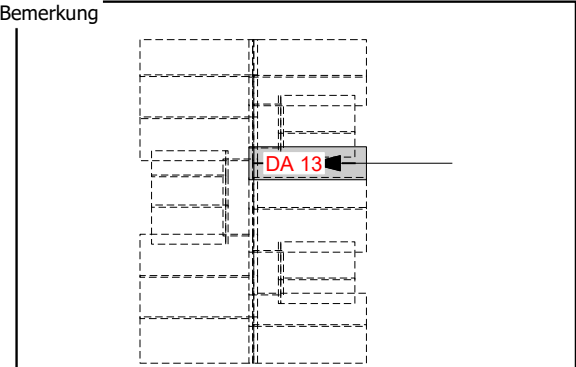

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 13

13.03.2023

Bauvorhaben:
BV Geniner Dorfstr.

Kunde:
Fam. Paustian
Geniner Dorfstraße 48
Lübeck

Proj.-Nr.: 2021039
Bearbeiter: L.Greiser




Dachlattung

Dach

DA 14

Wandtyp: Dach
Gewicht: 285,974 kg

Reihenfolge: 39
Wandtyp: Dach


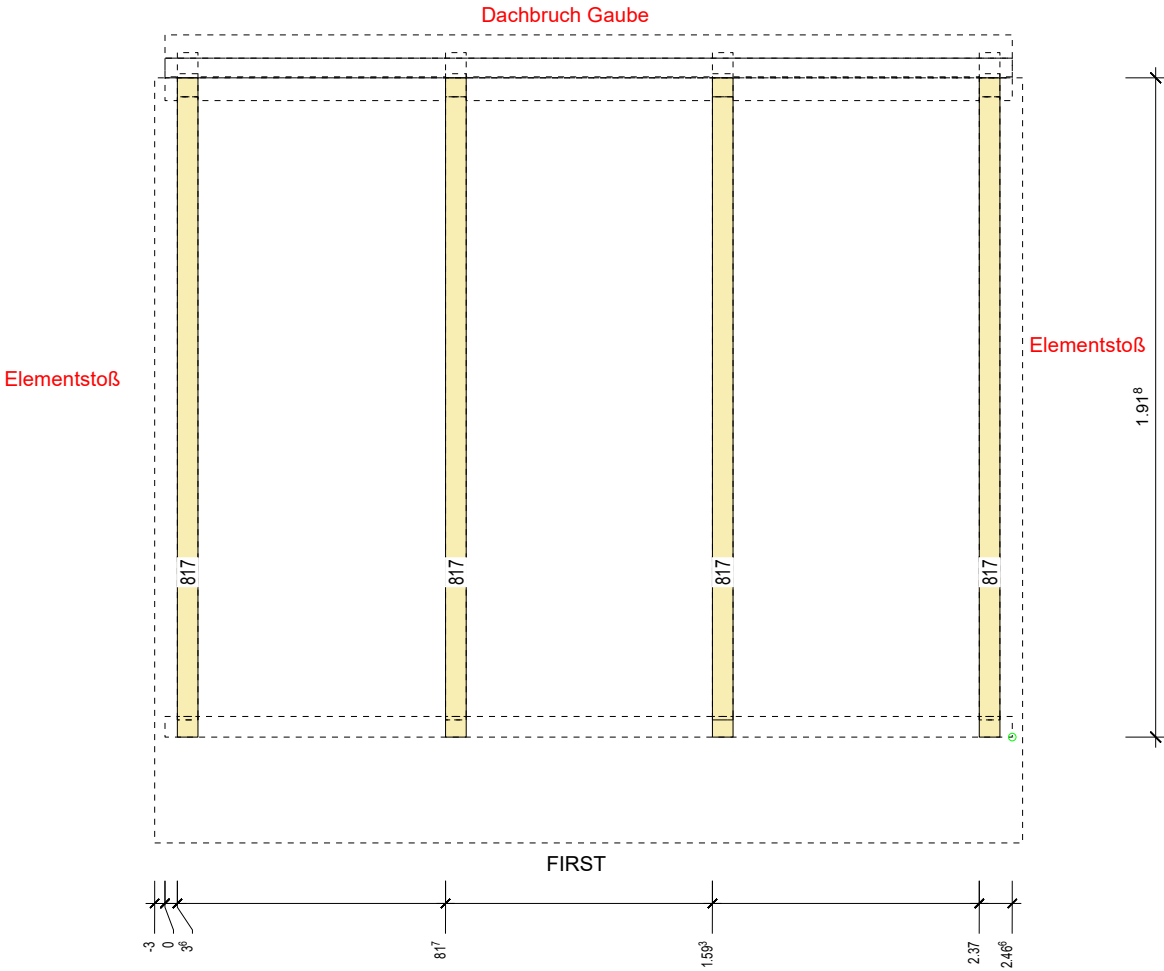


Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:				
Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____				

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
526	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.0	2.466	
527	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	16.4	2.466	
528	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	2.466	
529	KVH Fichte	Soarren	4	6.0	28.0	1.942	
816	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	2.526	
817	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	1.918	
			17				

Grundriss Dach

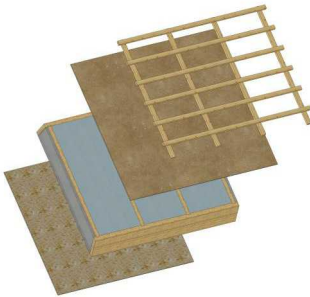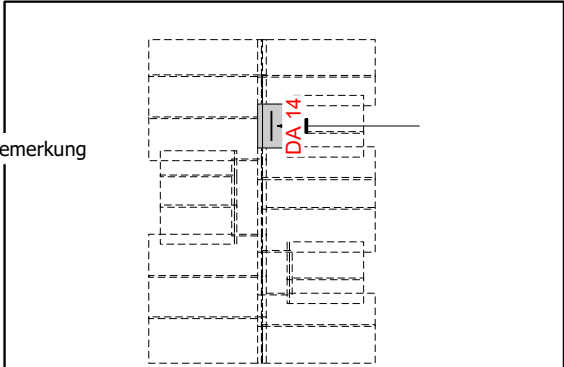

DA 14	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach


DA 15

Wandtyp: Dach
Gewicht: 734,442 kg

Reihenfolge: 36
Wandtyp: Dach

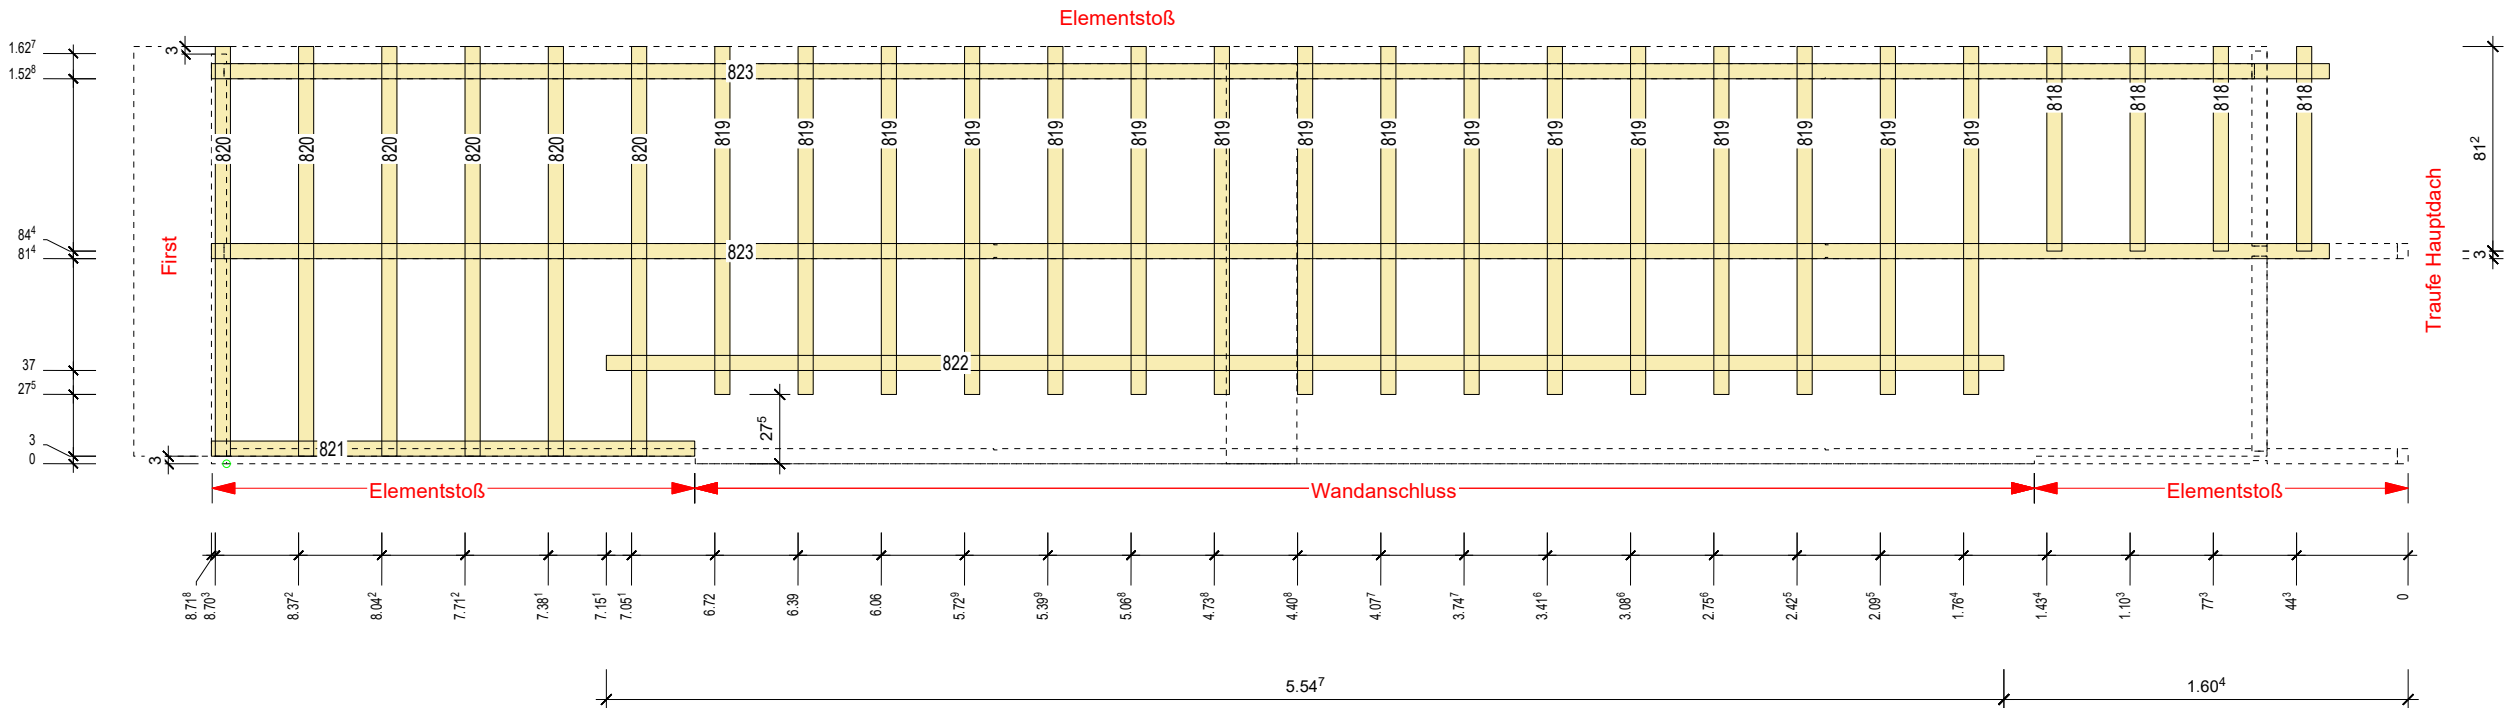

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
530	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.588
531	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.626
532	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.058
533	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
534	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
535	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.774
536	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	28.0	0.774
818	NH C24	Dachlatte	4	4.0	6.0	0.812
819	NH C24	Dachlatte	16	4.0	6.0	1.381
820	NH C24	Dachlatte	6	4.0	6.0	1.626
821	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	1.918
822	NH C24	Konterlatte	1	4.0	6.0	5.547
823	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	8.406
			37			

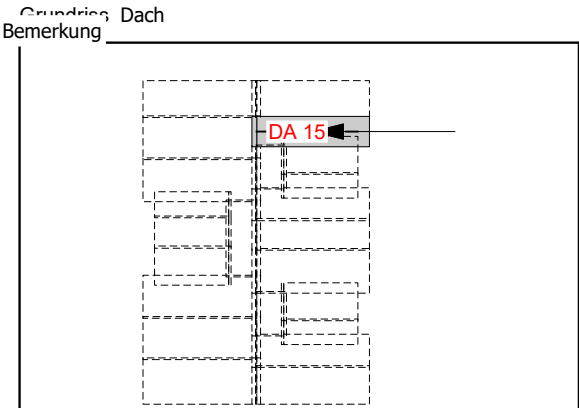

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 15	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 16


Wandtyp: Dach
Gewicht: 794,362 kg

Reihenfolge: 35
Wandtyp: Dach

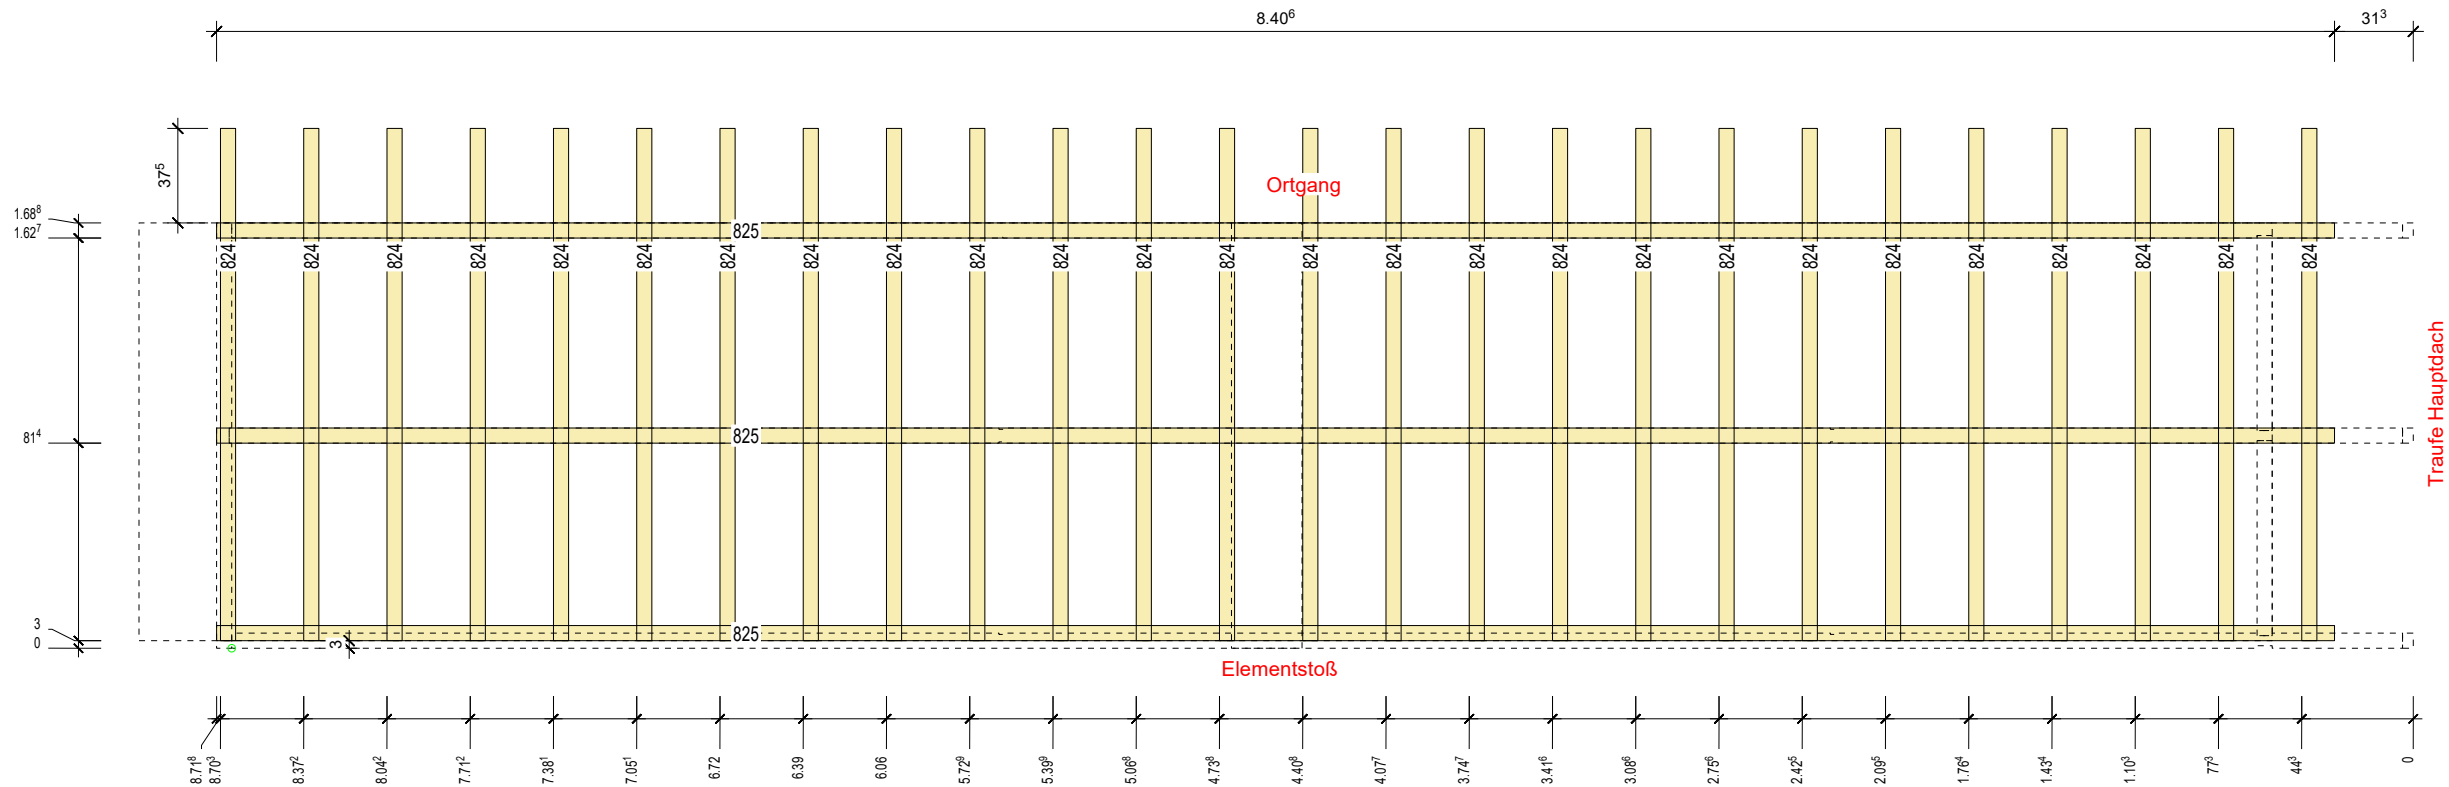

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
537	KVH Fichte	Füllholz	1	6.0	28.0	1.688
538	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.688
540	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
541	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.658
539	KVH Fichte	Sparren	1	6.0	28.0	8.668
542	KVH Fichte	Verblockung	2	6.0	28.0	0.774
824	NH C24	Dachlatte	26	4.0	6.0	2.033
825	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	8.406
			36			

Grundriss Dach

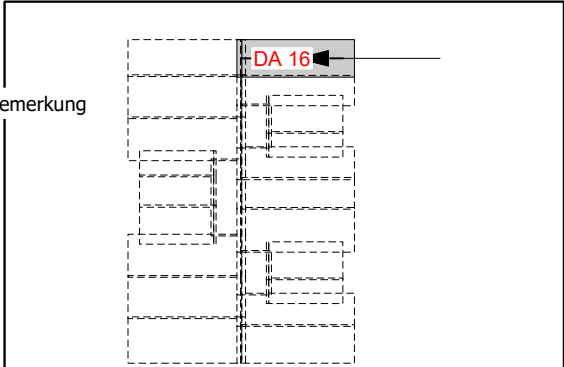

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 16	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 17

Wandtyp: Dach
Gewicht: 229,805 kg

Reihenfolge: 44
Wandtyp: Dach

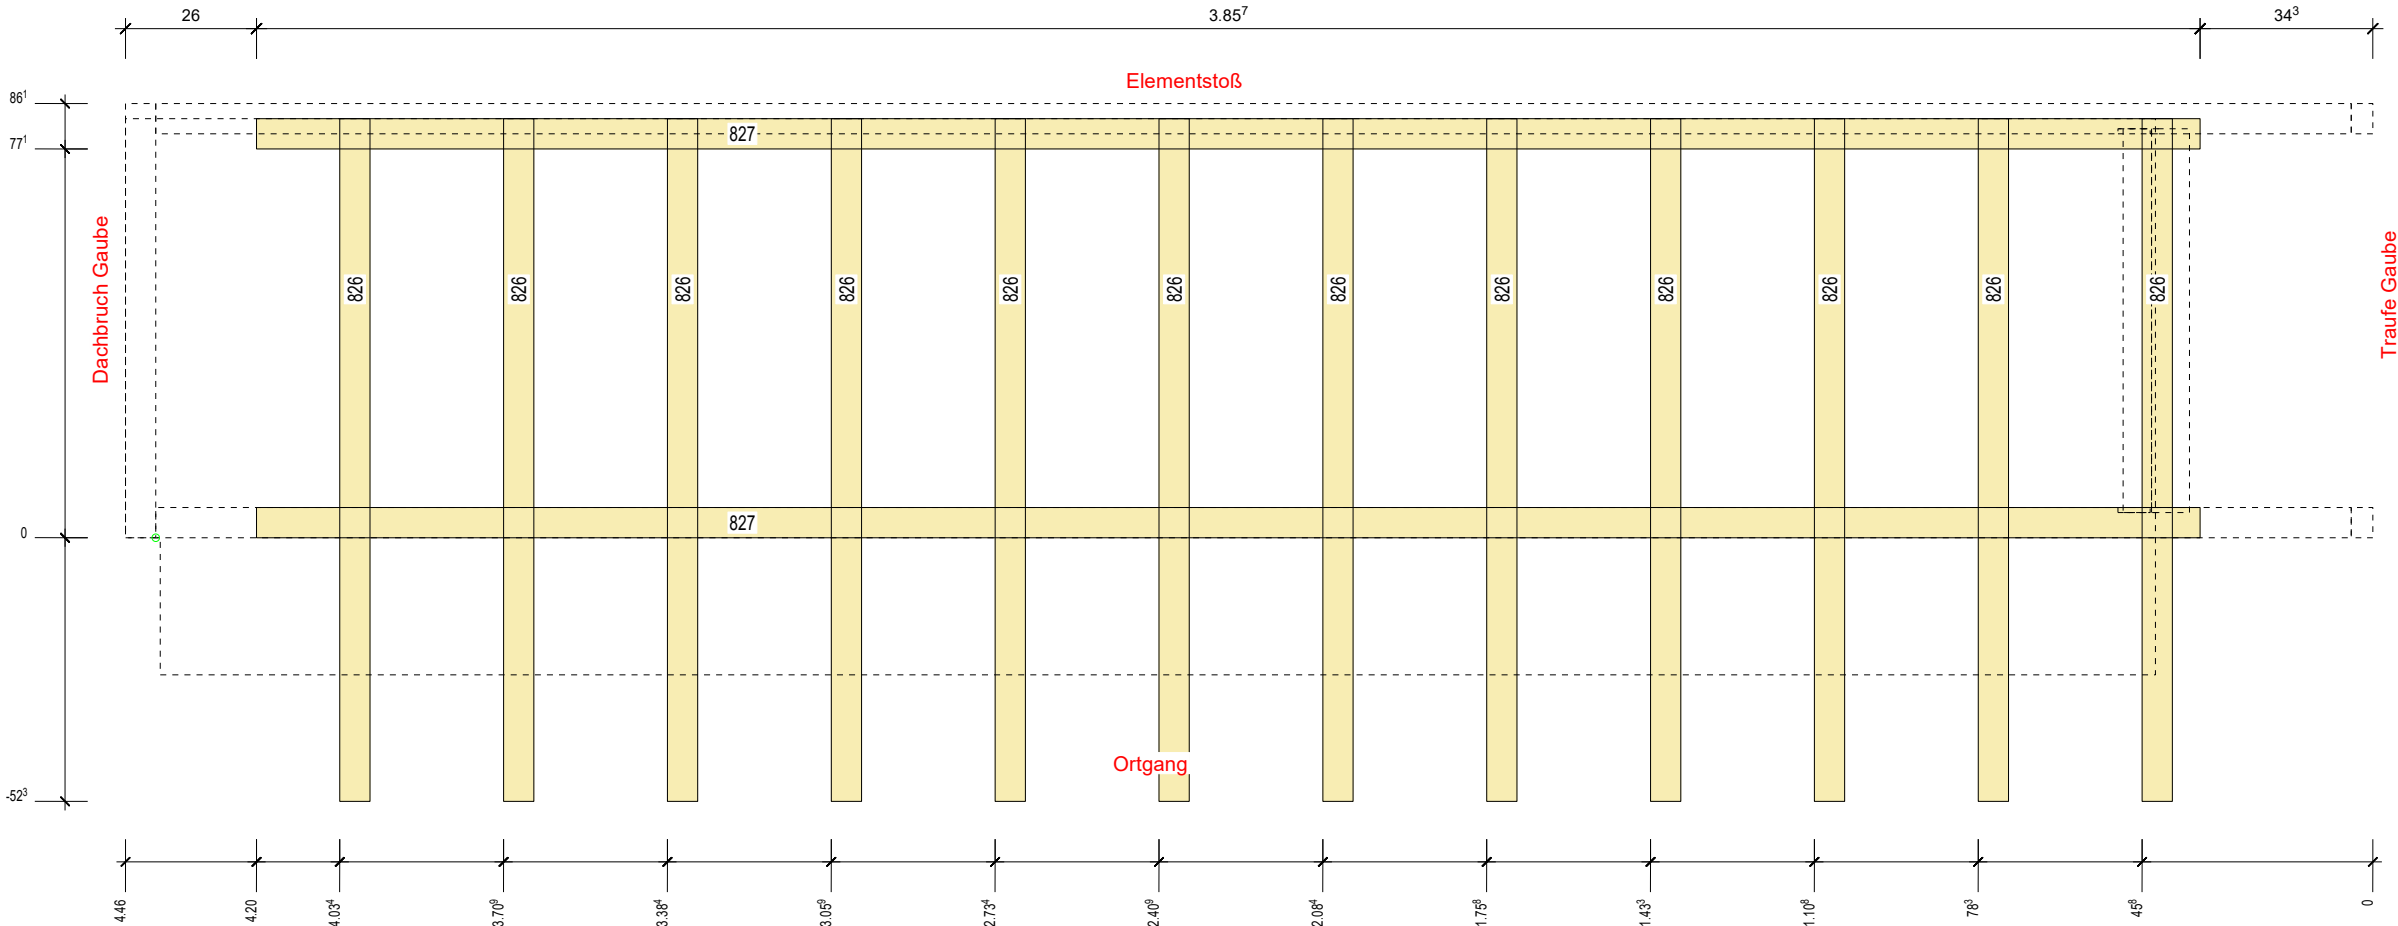

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
543	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
544	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
545	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	0.861	
546	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.761	
826	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	1.354	
827	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	3.857	
			18				

Grundriss Dach

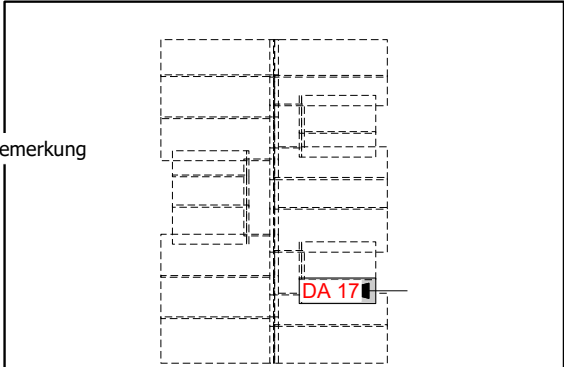

DA 17	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 18


Wandtyp: Dach
Gewicht: 376,914 kg

Reihenfolge: 45
Wandtyp: Dach

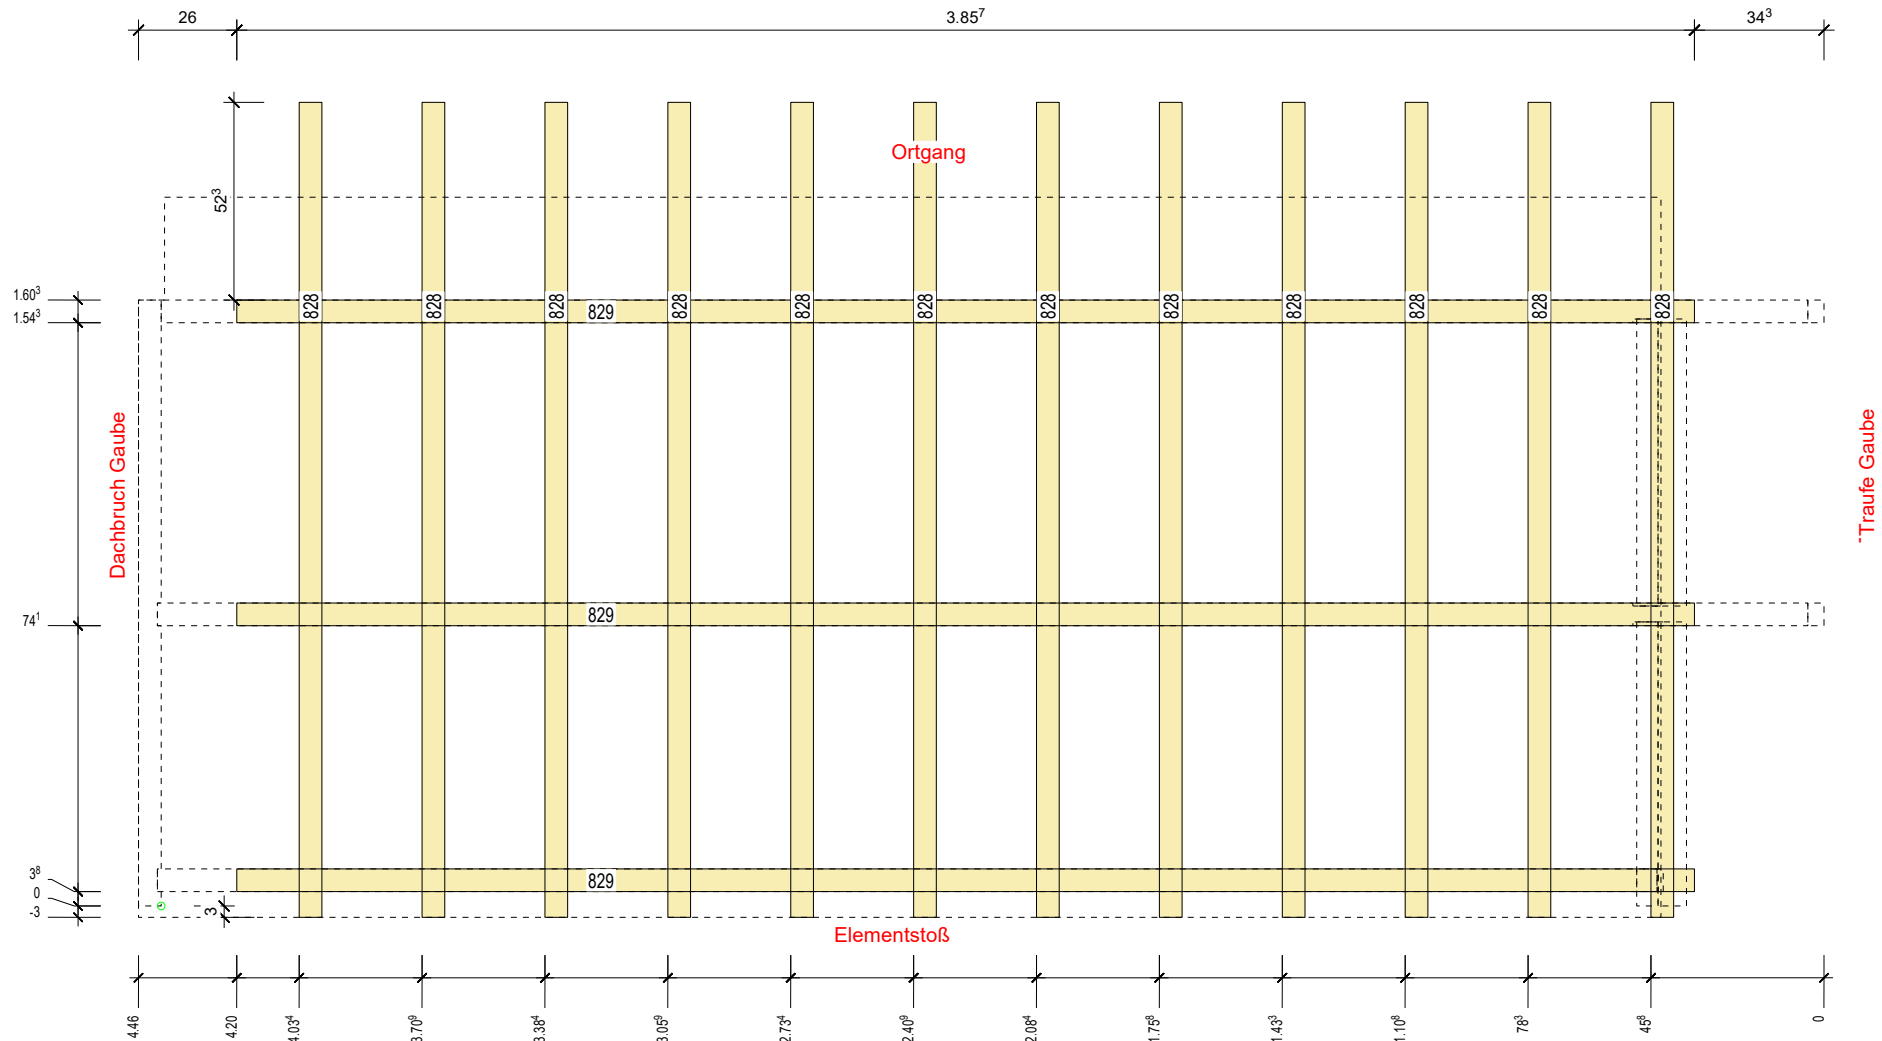

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
547	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	3.984
549	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400
548	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.410
550	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.603
551	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.751
552	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.759
828	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	2.156
829	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	3.857
			21			

Grundriss Dach

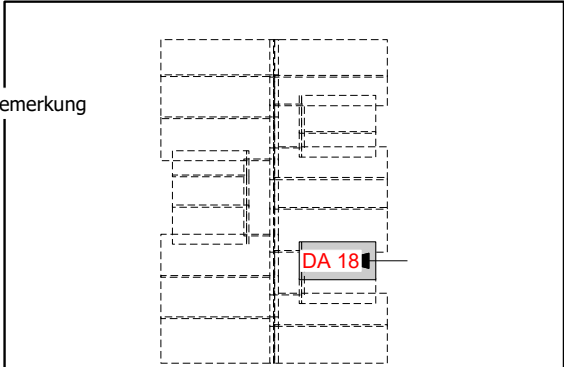

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 18	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 19

Wandtyp: Dach
Gewicht: 388,508 kg

Reihenfolge: 56
Wandtyp: Dach

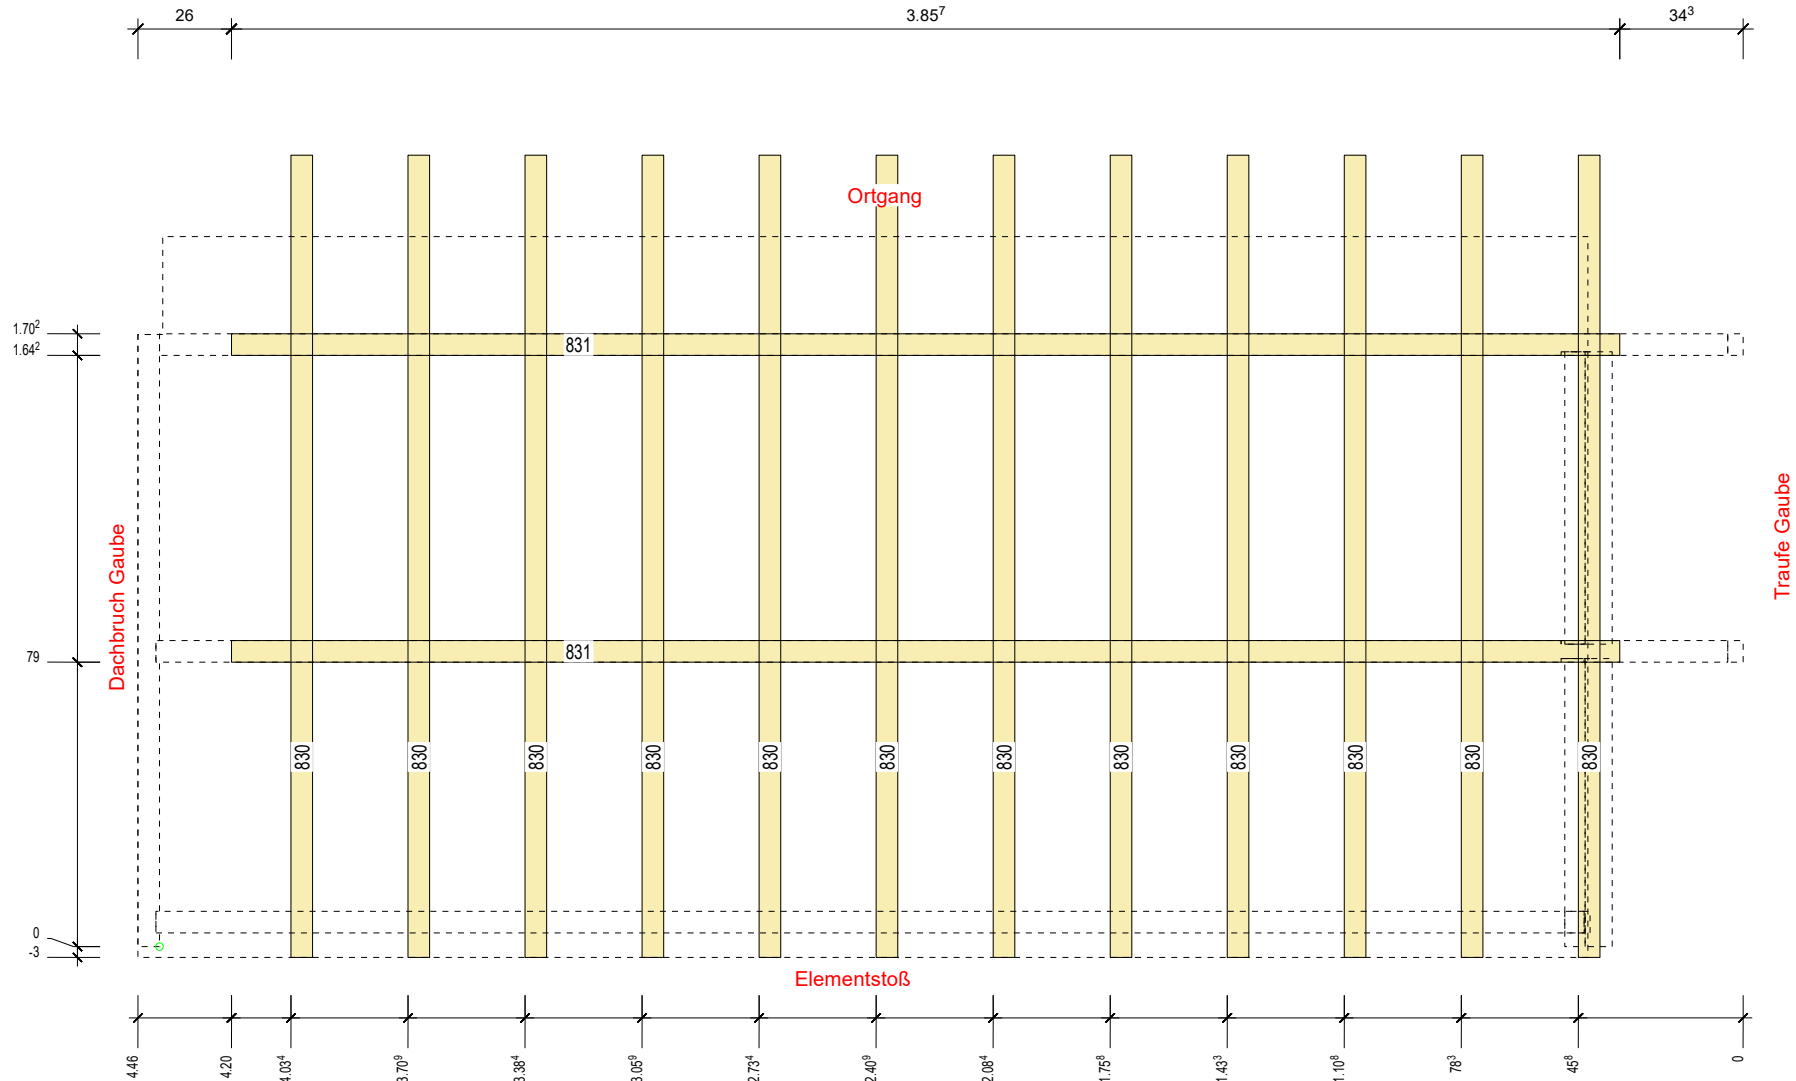

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
553	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	3.984	
555	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
554	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.410	
556	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.700	
557	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.800	
558	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.812	
830	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	2.228	
831	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	3.857	
			20				

Grundriss Dach

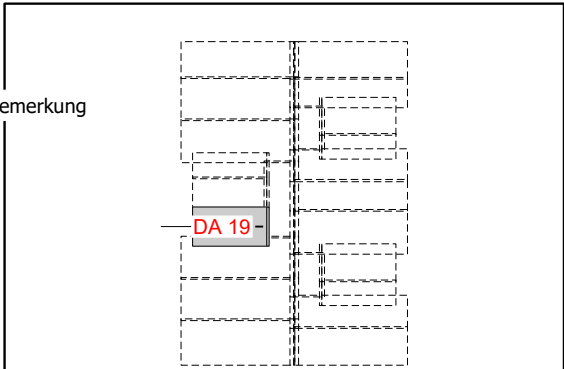


DA 19	
13.03.2023	Kunde:
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	STAMER

Dachlattung

Dach
DA 20

Wandtyp: Dach
Gewicht: 385,110 kg

Reihenfolge: 57
Wandtyp: Dach

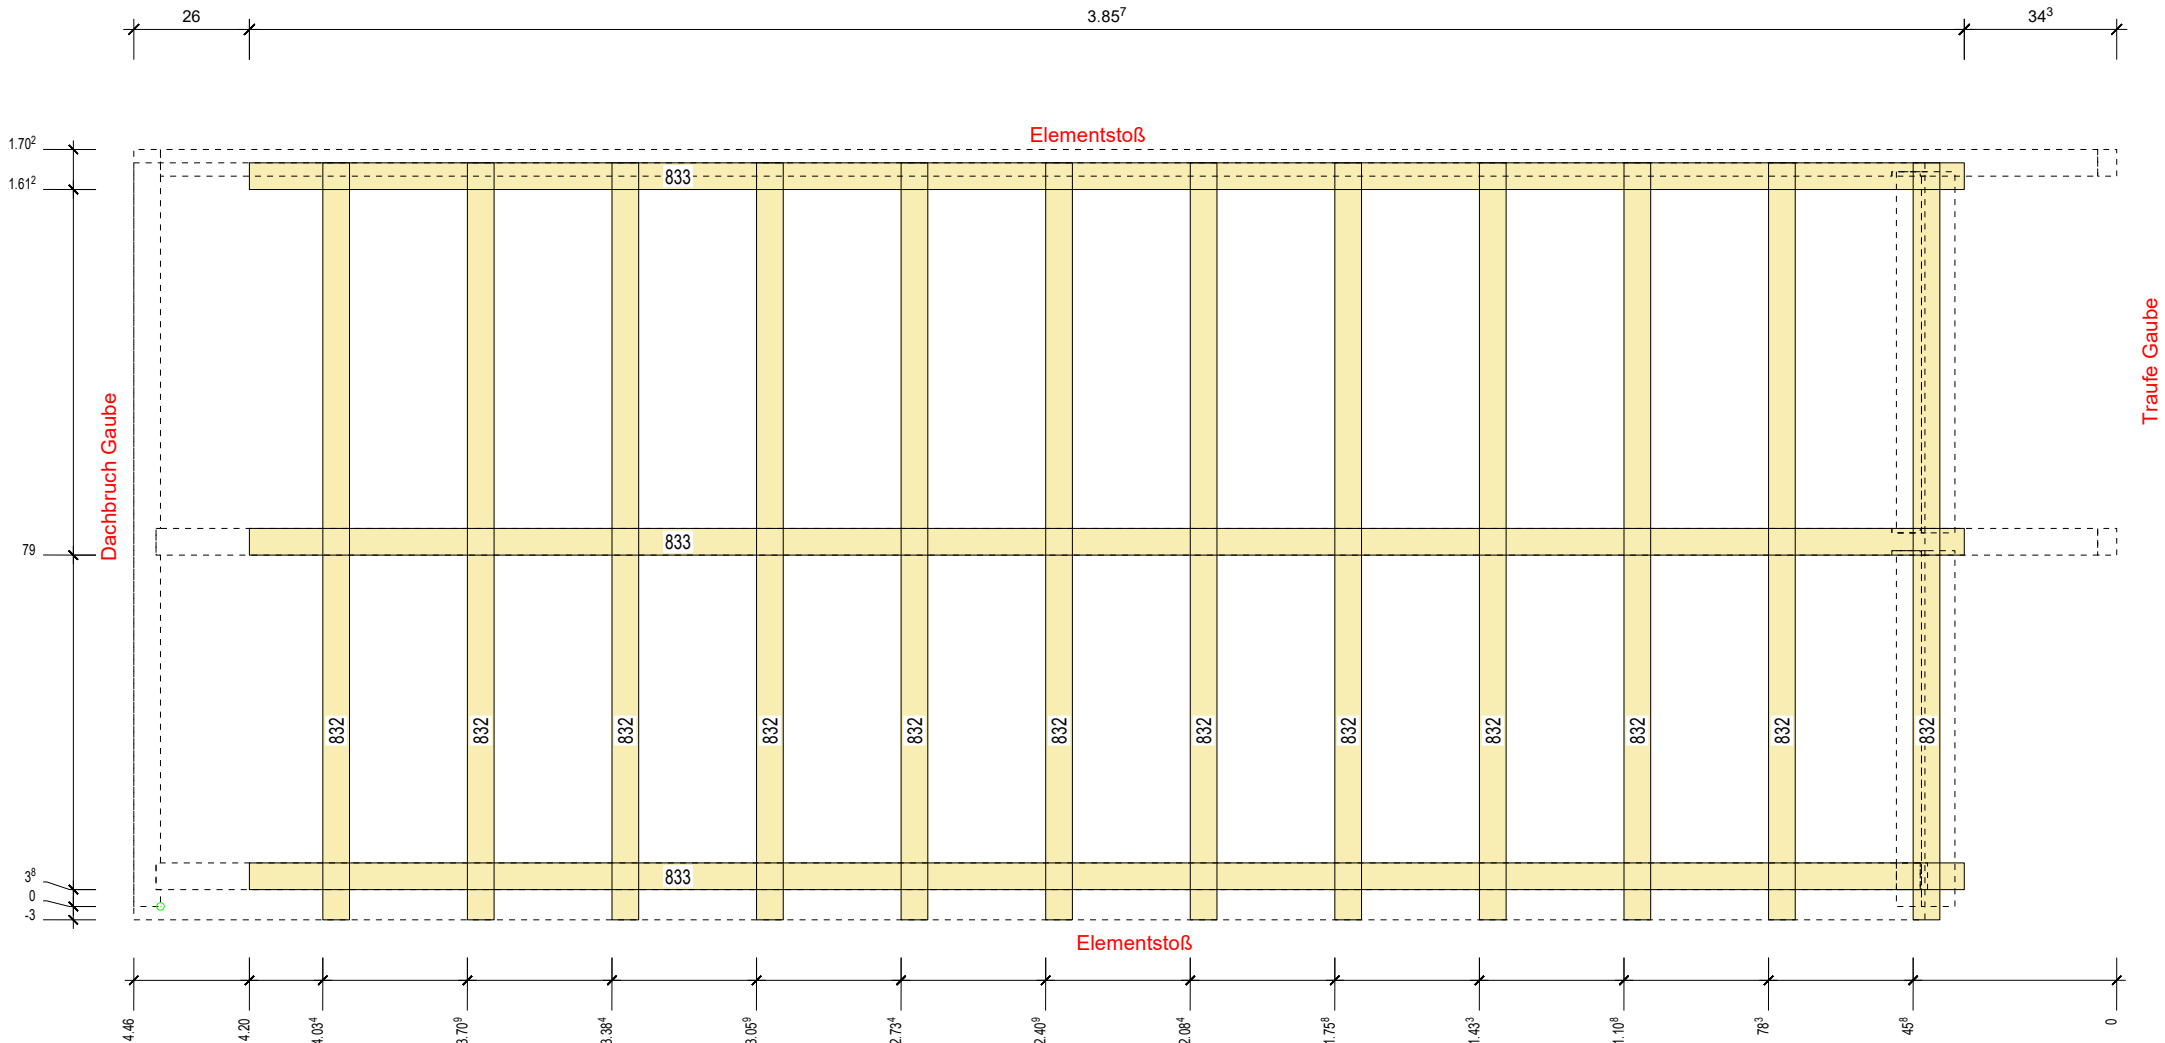

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
559	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	3.984	
560	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
561	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.410	
562	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.702	
563	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.800	
564	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.812	
832	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	1.702	
833	NH C24	Konterlatte	4	4.0	6.0	3.857	
			22				

Grundriss Dach

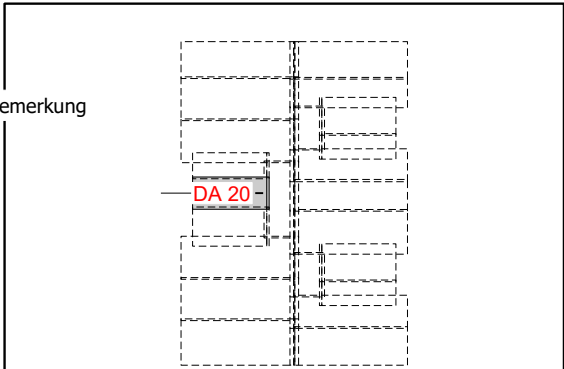

DA 20	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach

DA 21

Wandtyp: Dach
Gewicht: 237,783 kg

Reihenfolge: 42
Wandtyp: Dach

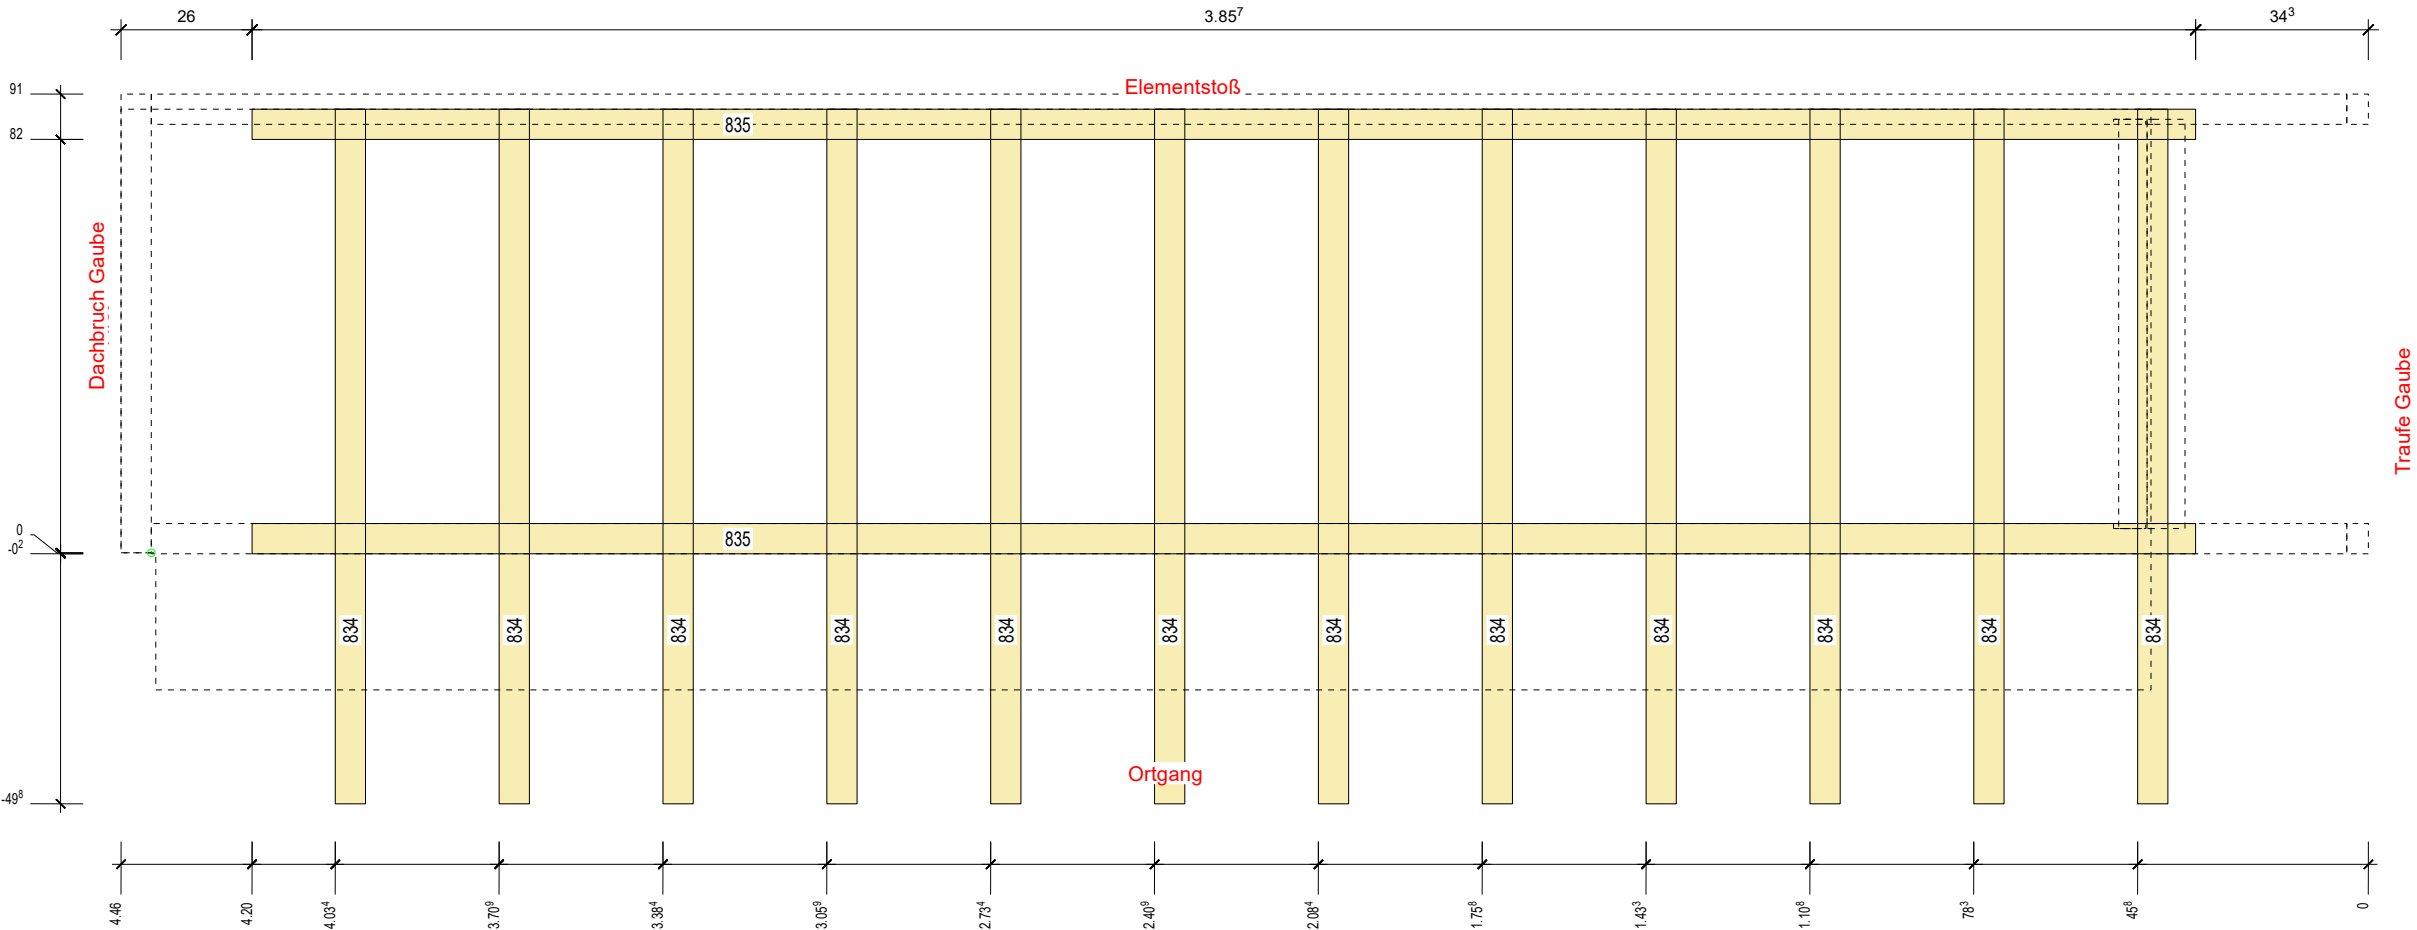

Produktionskontrolle:



Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
565	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
566	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
567	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	0.910	
568	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.812	
834	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	1.378	
835	NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	3.857	
			18				

Grundriss Dach

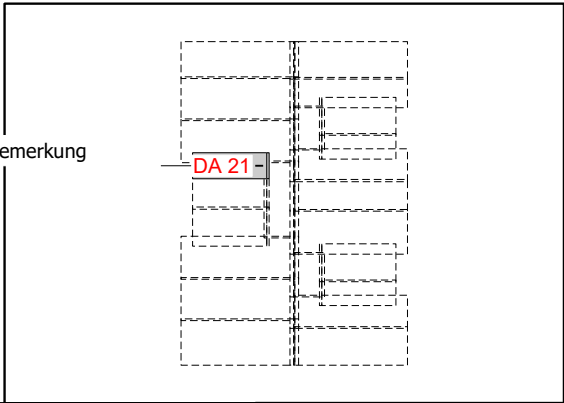

DA 21	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Dachlattung

Dach


DA 22

Wandtyp: Dach
Gewicht: 227,679 kg

Reihenfolge: 43
Wandtyp: Dach

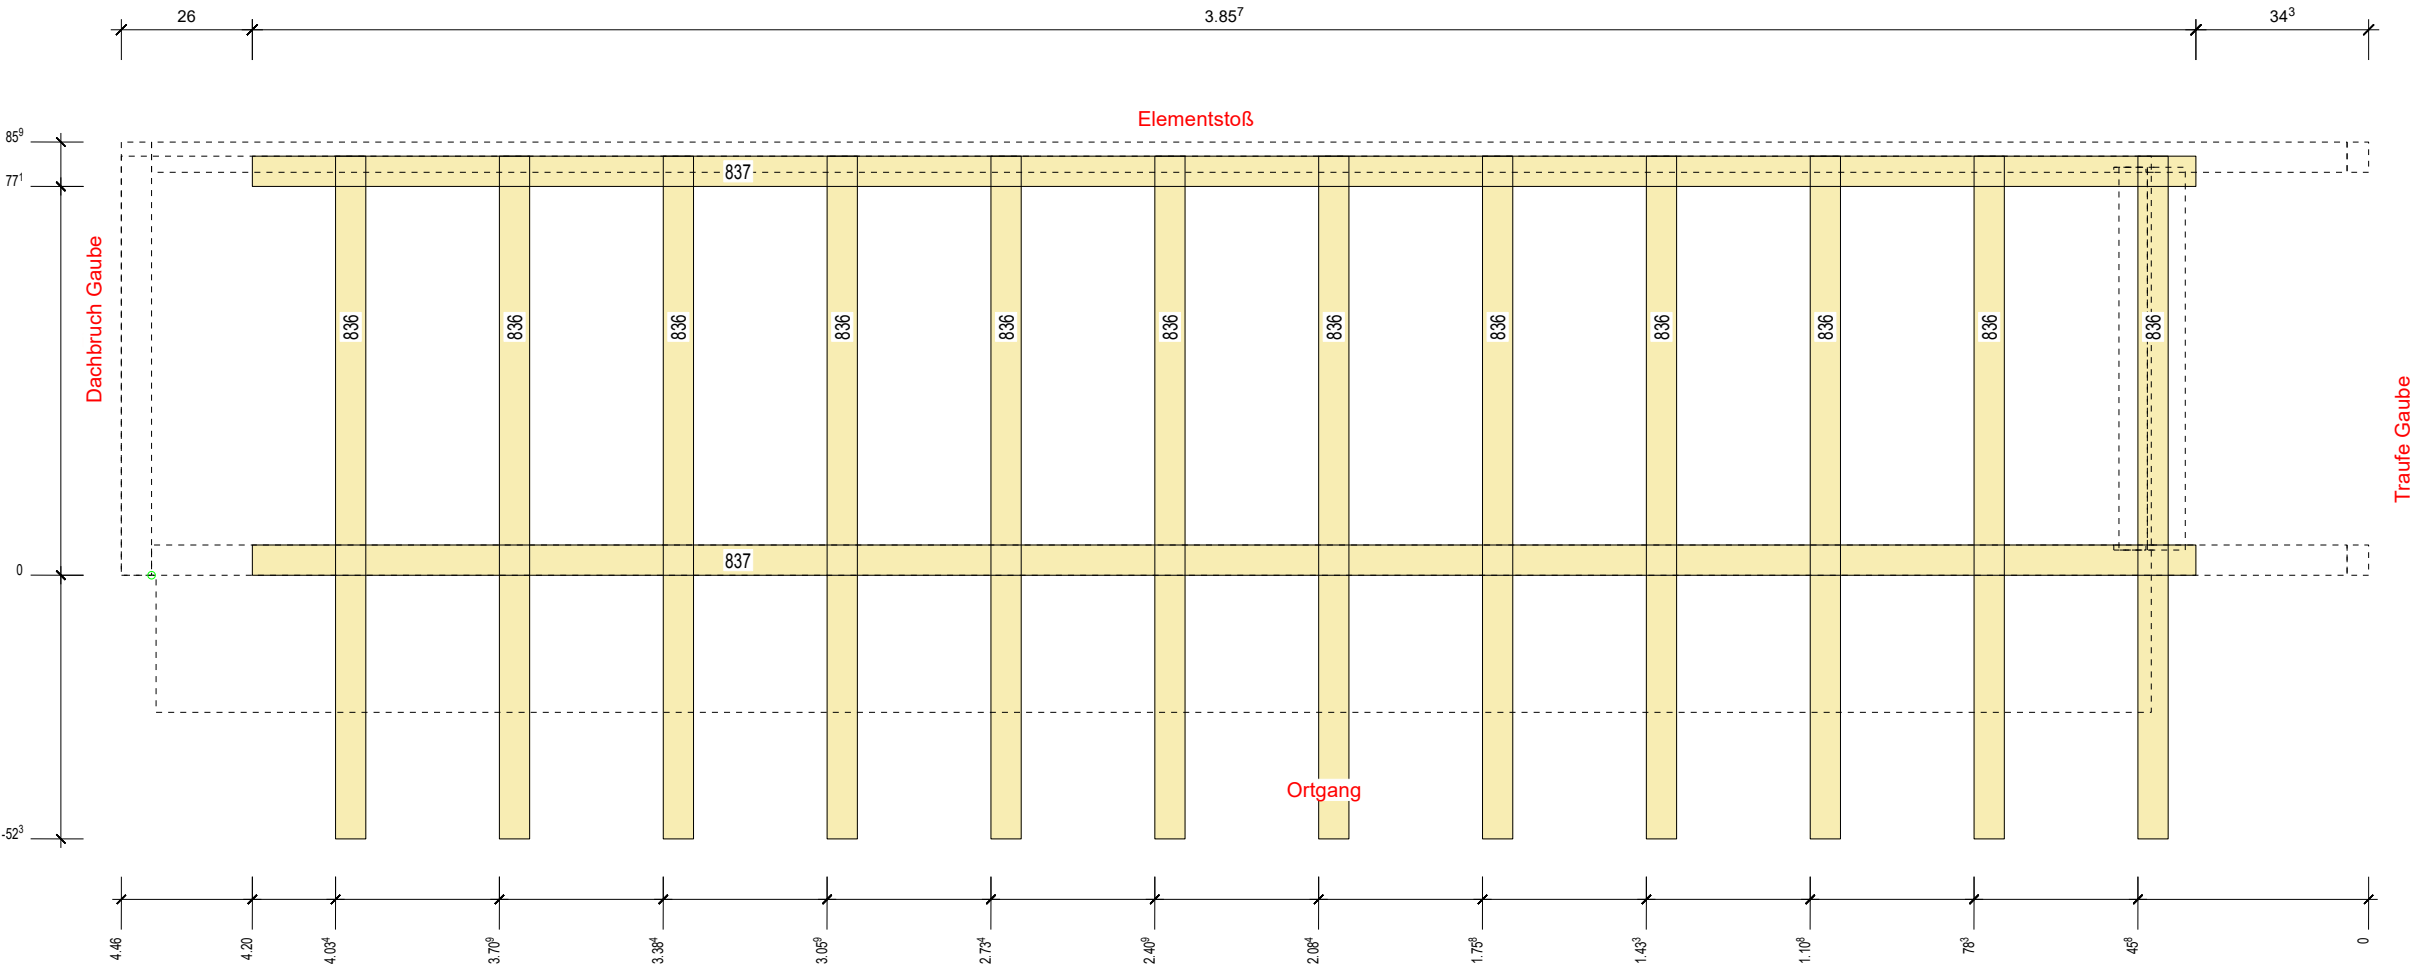

Grundriss Dach

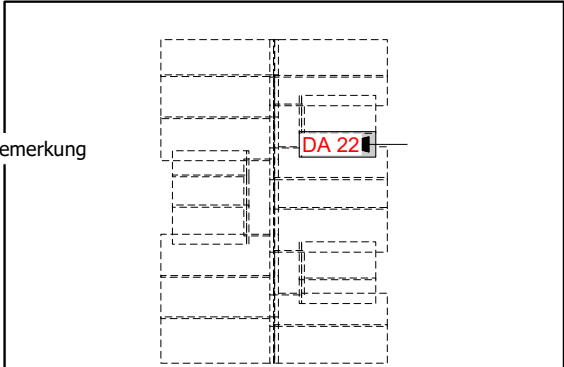

Nr.	PL	Material	Name	STK	B	H	L	Bemerkung
569		KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
570		KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400	
571		KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	0.859	
572		KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.759	
836		NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	1.354	
837		NH C24	Konterlatte	2	4.0	6.0	3.857	
				18				

Produktionskontrolle:

Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennagel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 22

13.03.2023

Bauvorhaben:
BV Geniner Dorfstr.

Kunde:
Fam. Paustian
Geniner Dorfstraße 48
Lübeck

Proj.-Nr.: 2021039
Bearbeiter: L.Greiser




Dachlattung

Dach
DA 23



Wandtyp: Dach
Gewicht: 379,140 kg

Reihenfolge: 46
Wandtyp: Dach

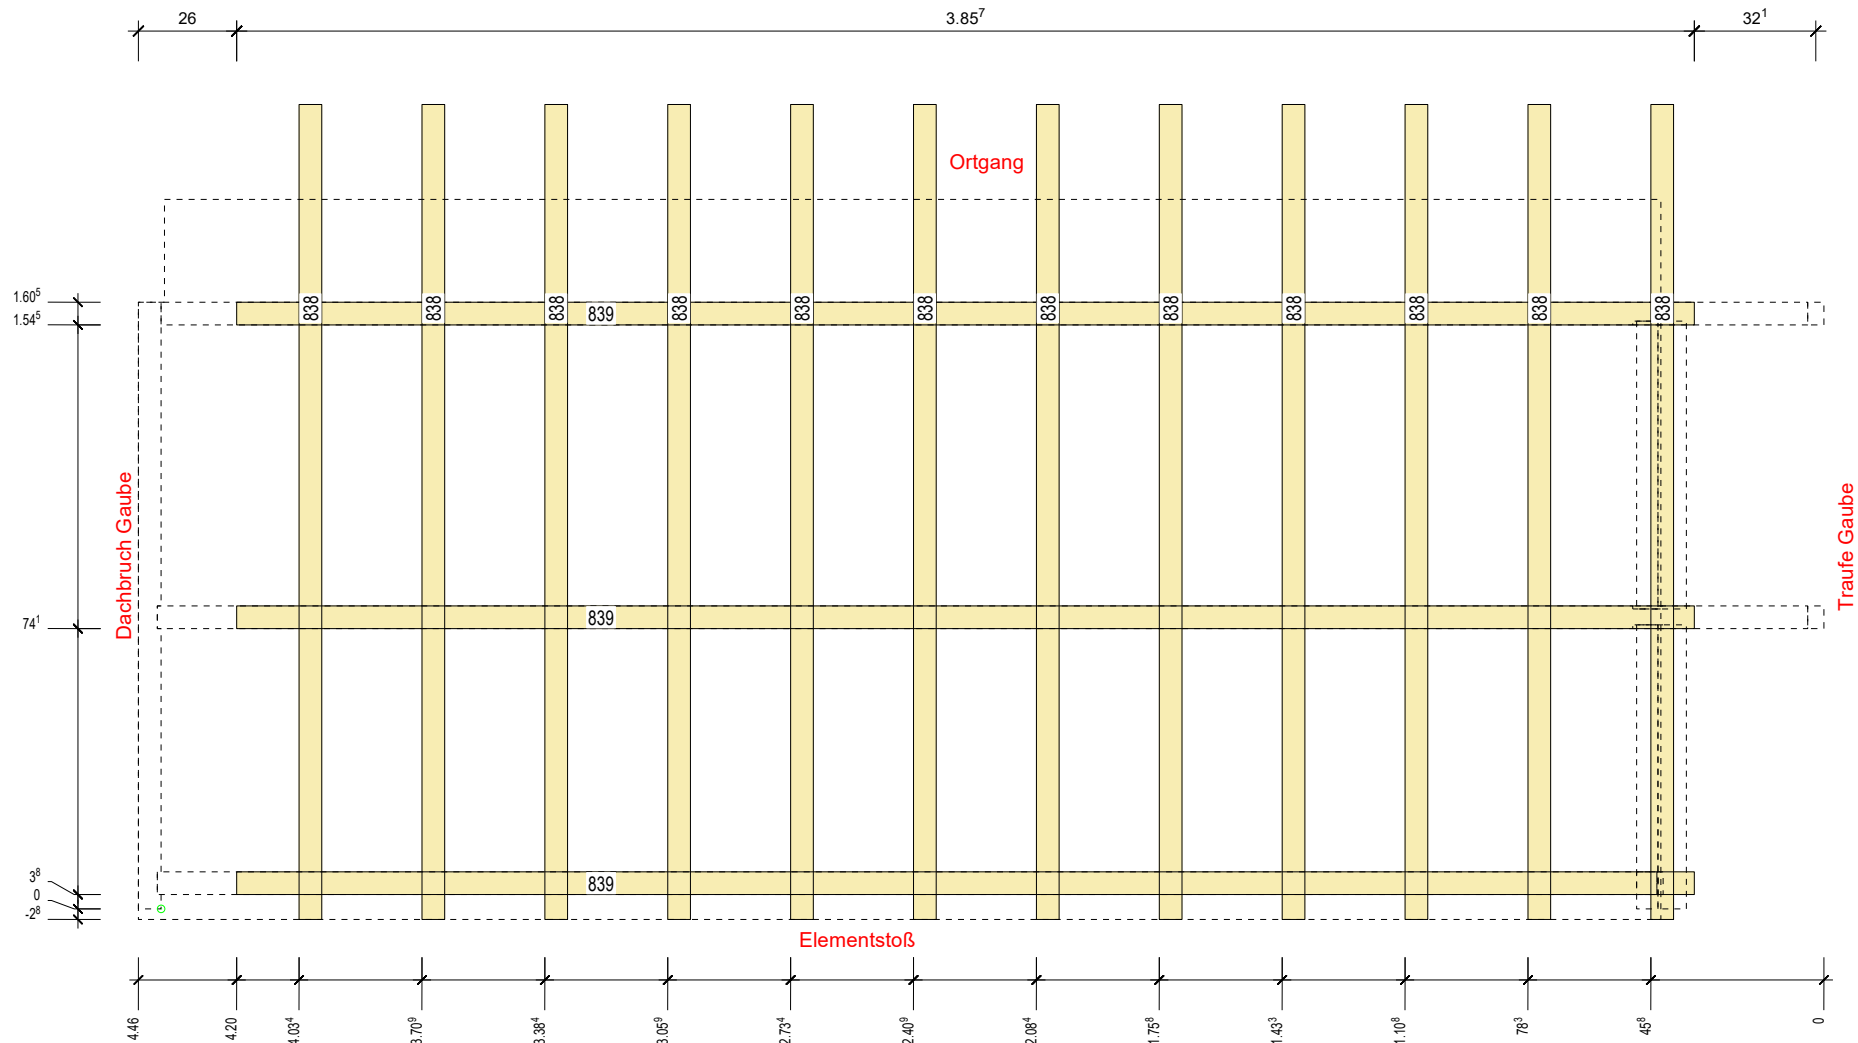

Nr. PL	Material	Name	STK	B	H	L
573	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	3.984
575	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.400
574	KVH Fichte	Gaubensparren	1	6.0	28.0	4.410
576	KVH Fichte	Randholz	1	6.0	28.0	1.605
577	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.751
578	KVH Fichte	Verblockung	1	6.0	22.0	0.761
838	NH C24	Dachlatte	12	4.0	6.0	2.156
839	NH C24	Konterlatte	3	4.0	6.0	3.857
			21			

Grundriss Dach

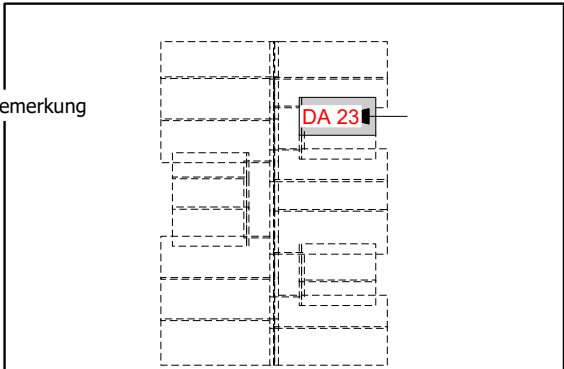

Produktionskontrolle:


Lage	Material	Produkt	Name Herstellung	Hinweise/Prüfung
-2	Unterdeckbahn	AMPACK TYVEK		- Überstände beachten - Verkleben - 3m Rolle längs verwenden
-3	Konterlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (3 Stk/m) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren - Nageldichtband verwenden
-4	Dachlattung S10 4/6			- Rillennägel 3,1x90 (1 Stk/Sparren) - Vollständig vernagelt - Überstände/Rückschnitte kontrollieren

Endkontrolle - Das Element stimmt mit dem Wandplan überein:


Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

DA 23	
13.03.2023	Kunde: Fam. Paustian Geniner Dorfstraße 48 Lübeck
Bauvorhaben: BV Geniner Dorfstr.	
Proj.-Nr.: 2021039 Bearbeiter: L.Greiser	


Traufe Gaube

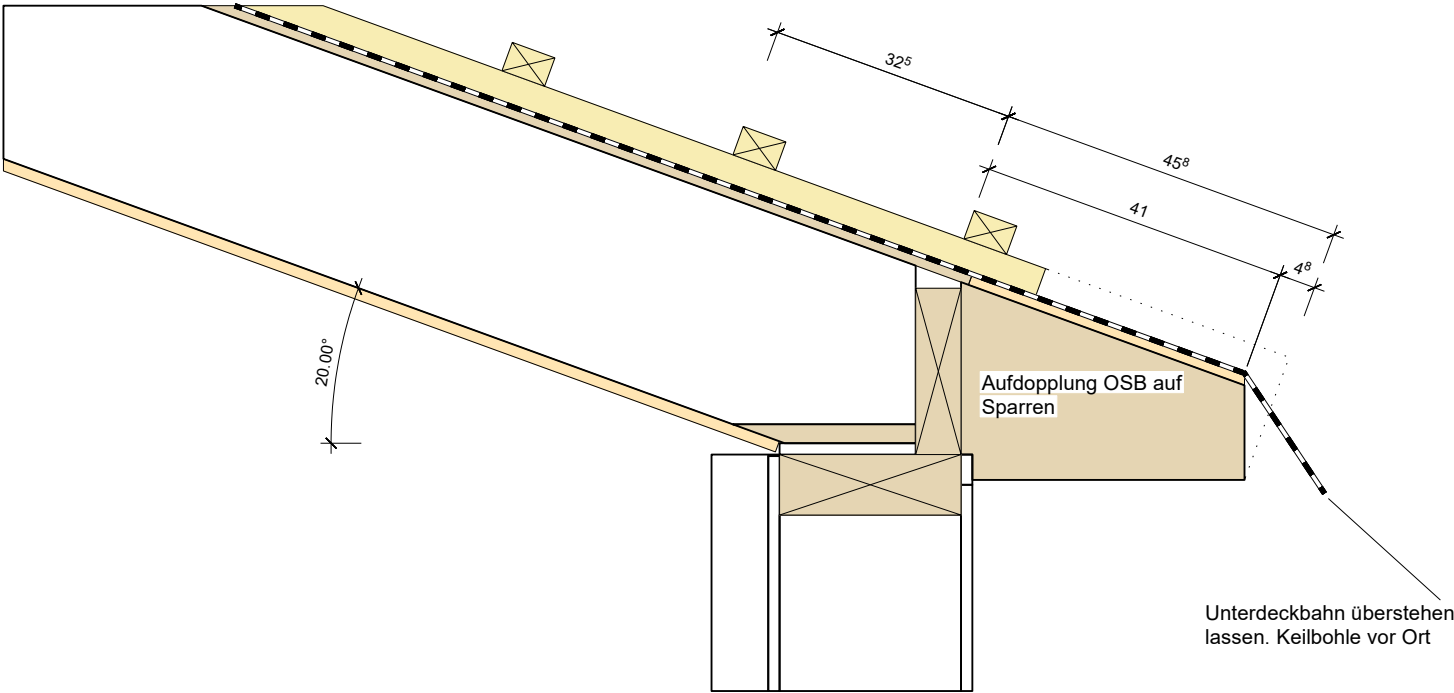


Traufe Hauptdach

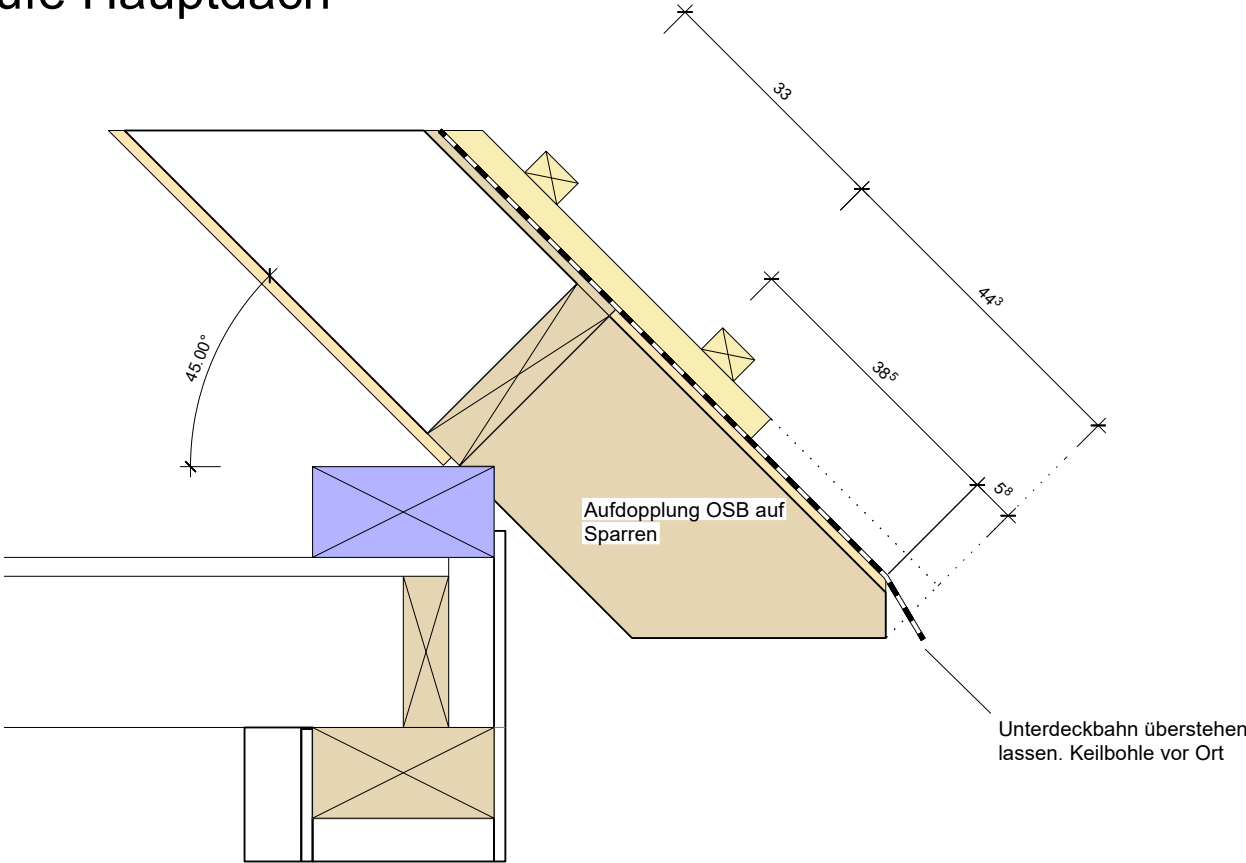


Dachbruch Gaube

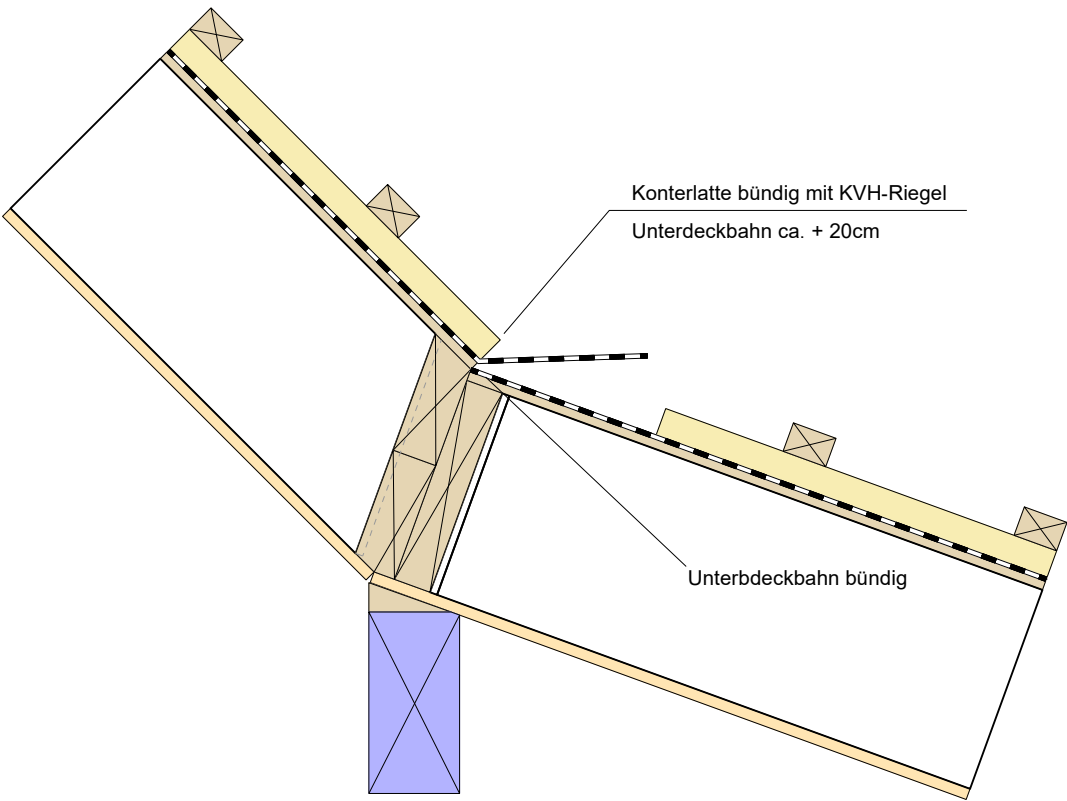


First Hauptdach

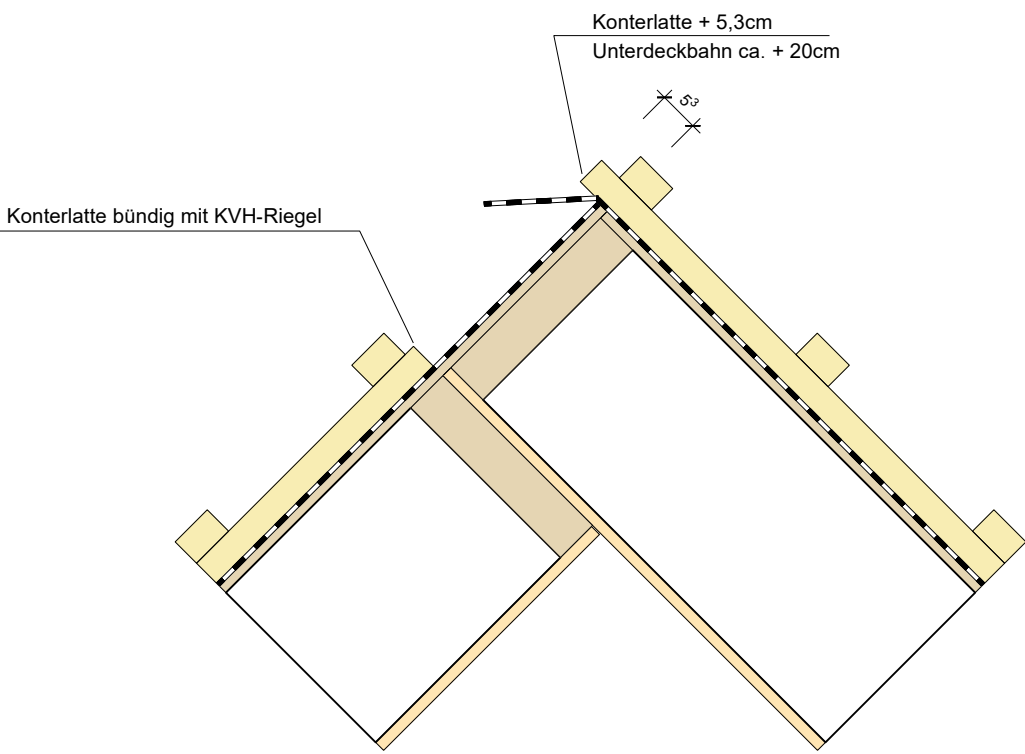

Ortgang Gaube + Hauptdach

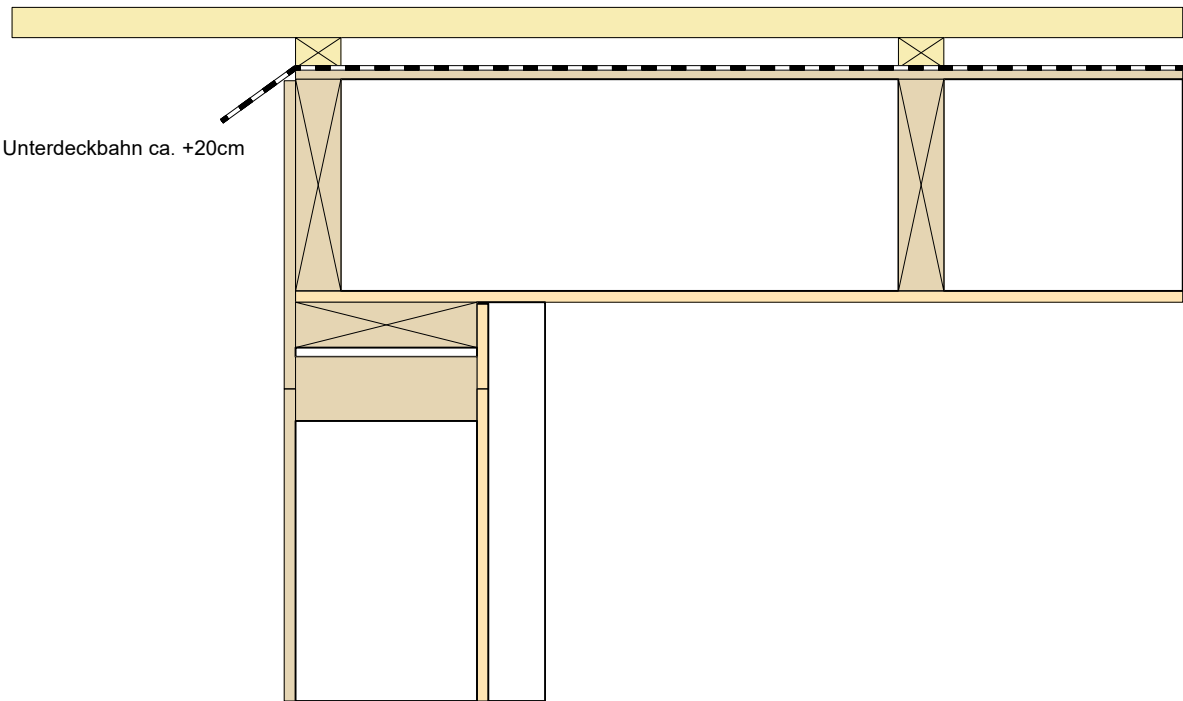

Wandanschluss

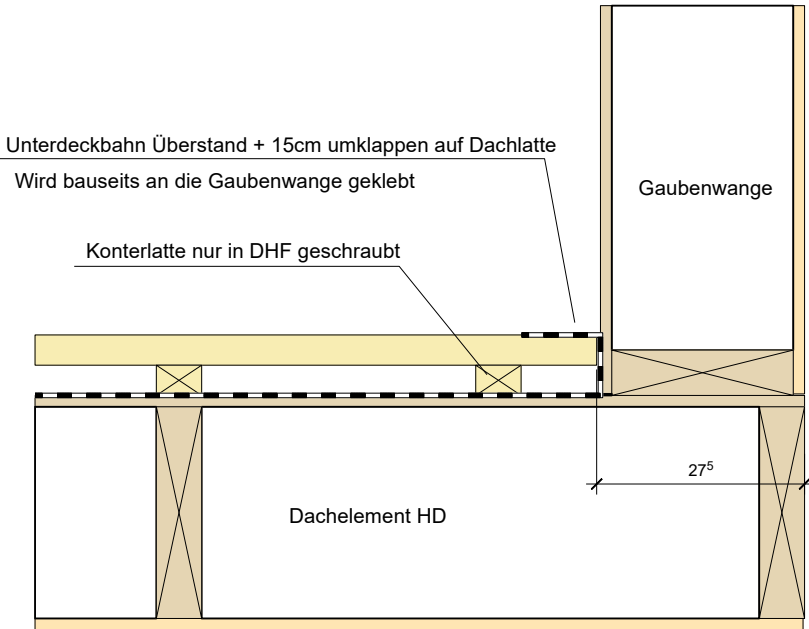

Elementstoß Gaube + Hauptdach

