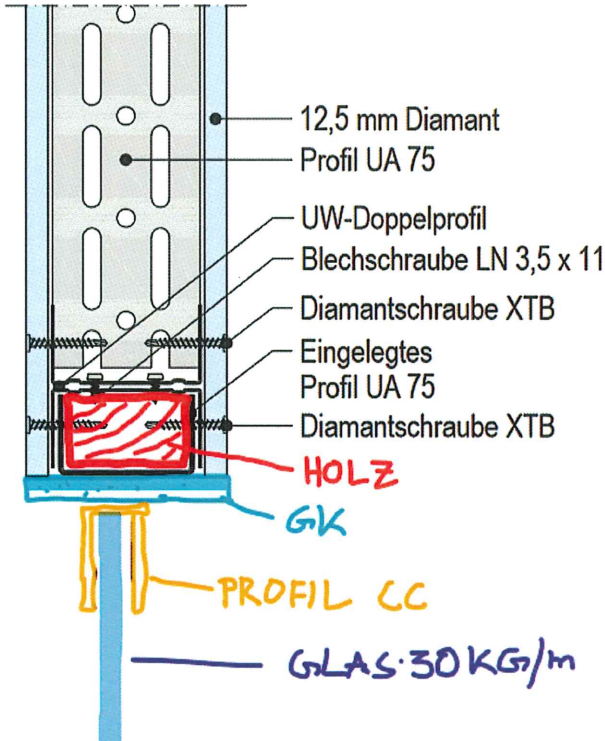


Bauvorhaben: Neubau Mensa und Zentralküche
Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, Husum

Obj.-Nr. 19.17 / 49-2018

B.60.2	Abstimmung über die weiteren Montageabläufe • Deckenschürze über Ausgabetresen ab KW 26 • Montage Deckenplatten Mensa ab KW 28 • Montage Akustikwandabsorber Mensa ab KW 28/29 • Montage Deckenplatten Wirtschaftsbereich ab KW 29/30	KSS	KW 26 KW 28 KW 29 KW 29
B.59.2	Trockenbauschürze oberhalb von Glasschürze / Ausgabetresen. Technische Abstimmung und Ausführung wird erforderlich Abstimmung ist erfolgt: System Knauf SL 03- Wichtig: unteres Profil ungelocht verwenden, oder Holz einlegen W176.de-VU2 Auskragendes Ende Maßstab 1:5 	KSS JL	
